

# LAPORAN PENGADAAN BARANG/JASA BULAN JUNI 2021 - TRIWULAN II

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

2021



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja Telepon (0362) 21985  
[www.setda.bulelengkab.go.id](http://www.setda.bulelengkab.go.id) email:[setda@bulelengkab.go.id](mailto:setda@bulelengkab.go.id)

Singaraja, 10 Juli 2021

K e p a d a

Nomor : 027/74/VII/BPBJ/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) gabung  
Hal : **Laporan Pengadaan Barang/Jasa  
Sampai Dengan Bulan Juni 2021  
(Triwulan II)**

Yth. Bupati Buleleng  
melalui Sekretaris  
Daerah Kabupaten Buleleng  
di -  
Singaraja

Dengan hormat kami sampaikan laporan realisasi pengadaan barang/jasa sampai dengan bulan **Juni (triwulan II)** Tahun Anggaran 2021, yang diproses melalui Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, dengan perincian sebagai berikut :

**I. Data Paket Pengadaan yang diproses (PERENCANAAN) melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Buleleng berdasarkan RUP :**

Terdapat perubahan rencana paket tender/seleksi melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa akibat refocusing anggaran sebagai berikut :

**a. AWAL**

| No.    | Jenis Pengadaan | Rencana Umum Pengadaan<br>TA 2021 |                 | Keterangan |
|--------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------|
|        |                 | Paket                             | Pagu            |            |
| 1      | Barang          | 45                                | 24.108.919.942  |            |
| 2      | Konstruksi      | 77                                | 246.618.710.629 |            |
| 3      | Konsultansi     | 20                                | 7.793.452.775   |            |
| 4      | Jasa Lainnya    | 10                                | 4.157.712.882   |            |
| Jumlah |                 | 152                               | 282.678.796.228 |            |

**b. PERUBAHAN (Update data SiRUP per 30 JUNI 2021)**

| No.    | Jenis Pengadaan | Rencana Umum Pengadaan<br>TA 2021 |                 | Keterangan |
|--------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------|
|        |                 | Paket                             | Pagu            |            |
| 1      | Barang          | 24                                | 17.053.298.567  |            |
| 2      | Konstruksi      | 62                                | 235.248.478.885 |            |
| 3      | Konsultansi     | 17                                | 6.983.849.768   |            |
| 4      | Jasa Lainnya    | 5                                 | 2.924.613.707   |            |
| Jumlah |                 | 108                               | 262.210.240.927 |            |

**II. Data Paket Masuk Berdasarkan Jenis Pengadaan :**

| No     | Jenis Pengadaan  | Paket Masuk |                     | Sedang Proses |                     | Selesai |                     | Gagal Tender/Tender Ulang |                     | Di Batalkan |                     | Sisa Paket |                     |
|--------|------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|
|        |                  | Jml.        | Pagu Anggaran (Rp.) | Jml.          | Pagu Anggaran (Rp.) | Jml.    | Pagu Anggaran (Rp.) | Jml.                      | Pagu Anggaran (Rp.) | Jml.        | Pagu Anggaran (Rp.) | Jml.       | Pagu Anggaran (Rp.) |
| 1      | 2                | 3           | 4                   | 5             | 6                   | 7       | 8                   | 9                         | 10                  | 11          | 12                  | 13         | 14                  |
| 1      | Barang           | 15          | 13.265.305.477      | 5             | 7.207.617.025       | 10      | 6.057.688.452       | 0                         | -                   | 3           | 1.150.450.000       | 6          | 2.637.543.090       |
| 2      | Konstruksi       | 53          | 127.876.815.885     | 24            | 33.648.175.811      | 28      | 90.942.344.339      | 1                         | 3.286.295.735       | 0           | -                   | 9          | 107.371.663.000     |
| 3      | Jasa Konsultansi | 15          | 4.417.945.503       | 4             | 1.293.083.980       | 10      | 2.823.661.523       | 1                         | 301.200.000         | 0           | -                   | 2          | 2.565.904.265       |
| 4      | Jasa Lainnya     | 4           | 2.683.596.707       | 1             | 204.243.700         | 3       | 2.479.353.007       | 0                         | -                   | 0           | -                   | 1          | 241.017.000         |
| Jumlah |                  | 87          | 148.243.663.572     | 34            | 42.353.120.516      | 51      | 102.303.047.321     | 2                         | 3.587.495.735       | 3           | 1.150.450.000       | 18         | 112.816.127.355     |

**III. Efisiensi Terhadap Pagu Anggaran dan HPS :**

**Total Efisiensi Terhadap Pagu Anggaran**

| Paket Selesai |                     | Nilai Kontrak (Rp.) | Nilai Kontrak (Rp.) |       |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|
| Jumlah        | Pagu Anggaran (Rp.) |                     | Efisiensi           | (%)   |
| 51            | 102.303.047.321,00  | 80.571.329.797,23   | 21.731.717.523,77   | 21,24 |


**Total Efisiensi Terhadap HPS**

| Paket Selesai |                    | Nilai Kontrak (Rp.) | Efisiensi         |       |
|---------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------|
| Jumlah        | HPS (Rp.)          |                     | Efisiensi         | (%)   |
| 51            | 101.540.245.305,44 | 80.571.329.797,23   | 20.968.915.508,21 | 20,65 |

**IV. DATA SEBARAN PEMENANG TENDER/SELEKSI/PEMILIHAN PENYEDIA**



**V. MONITORING PELAKSANAAN KONTRAK**

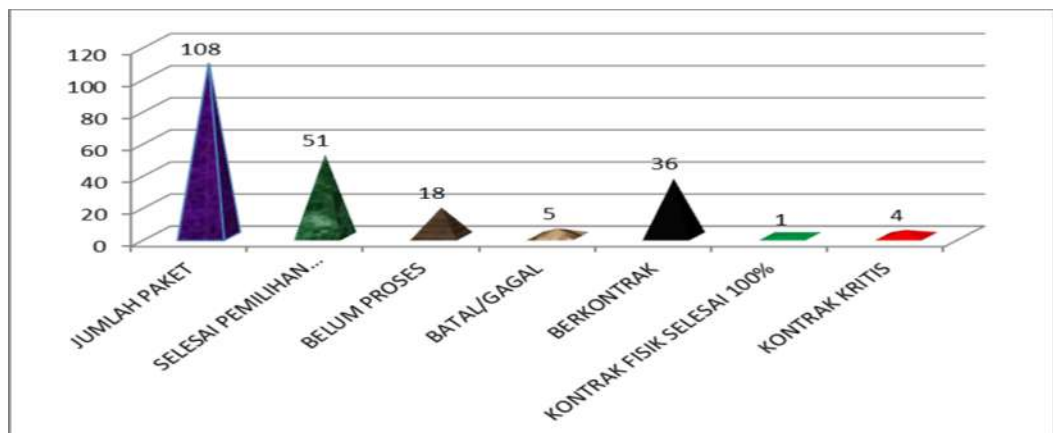

**Catatan :** Kontrak kritis yaitu kontrak yang pelaksanaannya mengalami deviasi minus di atas 10%.

## VI. DATA PERMASALAHAN

### a. Sanggahan

| No. | Nama Paket/OPD  | Sumber Dana              | Sanggahan | Pengaduan | Proses Peradilan | Ket.               |
|-----|---|--------------------------|-----------|-----------|------------------|--------------------|
| 1.  | Belanja Modal Taman (Pembangunan RTH Taman Bung Karno Tahap IV)                 | APBD (BKK Provinsi Bali) | 1         | -         | -                | Tender Dilanjutkan |
| 2.  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lanyahan Petandakan                          | APBD                     | 1         | -         | -                | Tender Dilanjutkan |
| 3.  | Pemuktahiran Sistem Informasi/ Data Base Jaringan Irigasi di Kabupaten Buleleng | APBD                     | 1         | -         | -                | Tender Dilanjutkan |
| 4.  | Pengawasan/Supervisi Rehabilitasi Jaringan Irigasi                              | APBD                     | 1         | -         | -                | Tender Dilanjutkan |
| 5.  | Belanja natura dan Pakan - Natura   | APBD                     | 1         | -         | -                | Tender Dilanjutkan |
| 6.  | Pembangunan Jembatan Pangkung Dalem Ruas Jalan SP3. Gitgit - Wanagiri           | APBD                     | 2         | -         | -                | Tender Dilanjutkan |
| 7.  | Pembangunan SPAM Air Sanih  | APBD (BKK Provinsi Bali) | 1         | -         | -                | Evaluasi Ulang     |

### b. Penetapan Daftar Hitam

| No. | Nama Penyedia | Alamat | Pekerjaan | No. Keputusan | Waktu Sanksi |
|-----|---------------|--------|-----------|---------------|--------------|
| 1.  | NIHIL         | -      | -         | -             | -            |

Dapat kami laporkan kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa saat ini pada lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng dan SDM Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa untuk Pokja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

#### A. *Existing* Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng

| No.      | Formasi         | Kebutuhan | Terisi    | Kurang    | Ket.                      |
|----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| <b>1</b> | <b>2</b>        | <b>3</b>  | <b>4</b>  | <b>5</b>  | <b>6</b>                  |
| 1        | JF PPBJ Madya   | 2         | 1         | 1         |                           |
| 2        | JF PPBJ Muda    | 11        | 1         | 10        |                           |
| 3        | JF PPBJ Pertama | 19        | 13        | 6         | 5 (lima) Orang masih CPNS |
|          | <b>TOTAL</b>    | <b>32</b> | <b>15</b> | <b>17</b> |                           |

**Keterangan : Baru Terpenuhi 46,87% dari Kebutuhan**

#### B. *Existing* Pokja Pemilihan Permanen pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng

| No.      | Formasi                  | Kebutuhan | Terisi   | Kurang   |
|----------|--------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>2</b>                 | <b>3</b>  | <b>4</b> | <b>5</b> |
| 1        | Pokja Pemilihan Permanen | 20        | 10       | 10       |

**Keterangan : Baru Terpenuhi 50% dari Kebutuhan**

Dari data dimaksud diatas dapat kami simpulkan sebagai berikut :

## 1. Kesimpulan :

- a. Proses pengadaan barang/jasa sampai dengan bulan **Juni (Triwulan II) 2021** disimpulkan sebagai berikut :
  - 1) Rekap data per tanggal 30 Juni 2021 setelah adanya *refocusing*/perubahan APBD terdapat RUP yang di proses oleh Pokja Pemilihan **sebanyak 108 paket dengan Pagu Anggaran Rp.262.210.240.927,-**.
  - 2) Pengadaan barang/jasa yang diproses Pokja Pemilihan sampai dengan bulan Juni 2021 sebanyak 87 paket (83%), dan ***sudah selesai tender sebanyak 51 paket (47%)*** dengan total nilai kontrak sebesar Rp.80.571.329.797,23 (30,73%) dari total pagu anggaran sebesar Rp.262.210240.926,68, yang sedang proses tender sebanyak 18 paket (31%), yang belum di proses sebesar 18 paket (17%) dan yang batal tender sebanyak 3 paket (3%) kerana *refocusing* dan perubahan metode pemilihan menjadi *e-purchasing*.
  - 3) Terdapat juga 2 paket pengadaan gagal proses yang sumber anggaran dari DAK pada Dinas Kesehatan yaitu Paket Belanja Jasa Konsultan Perencana Arsitektur-Jasa Desain Arsitektur senilai Rp.301.200.000,- dan Paket Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium senilai Rp.3.286.295.735, karena tidak cukup waktu akibat perencanaan dan pembangunan fisik dalam satu tahun anggaran dan adanya beberapa perubahan regulasi.
  - 4) ***Efisiensi anggaran sampai dengan Bulan Juni 2021 dari 51 paket APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 yang sudah selesai proses tender) sebesar Rp.20.968.915.508,21 (20,65%)*** dari total HPS Rp.101.540.245.305,44 dan sisa anggaran sebesar Rp. 21.731.717.523,77 (21,24%) dari total pagu anggaran Rp.102.303.047.321,-.
  - 5) Rincian pelaksanaan pengadaan barang/jasa dijelaskan lebih rinci pada dokumen terlampir.
- b. SDM Jabfung PBJ
  - 1) Prosentase capaian pemenuhan Jabfung PBJ lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng yaitu **46,87%**, dimana kebutuhan Jabfung PBJ sebanyak 32 orang dan sudah terisi sebanyak 15 orang.
  - 2) Prosentase capaian pemenuhan Jabfung PBJ untuk Pokja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yaitu **50%**, dimana kebutuhan Jabfung PBJ sebanyak 20 orang dan sudah terisi sebanyak 10 orang.

## 2. Langkah-langkah yang telah dilakukan :

- a. Melakukan penguatan perencanaan dan pengumuman RUP lebih awal melalui kegiatan reviu penyusunan RUP dan monitoring terhadap RUP yang telah diumumkan melalui SiRUP.
- b. Percepatan pemilihan terutama pekerjaan fisik (konstruksi) agar tidak menumpuk di Triwulan III dan IV untuk menghindari keterlambatan penyelesaian fisik.
- c. Melakukan monitoring evaluasi kemajuan pelaksanaan fisik pekerjaan konstruksi ke OPD khusus paket – paket strategis, mengetahui permasalahan lebih awal untuk solusi penyelesaian.
- d. Pendampingan penyusunan rencana pengadaan dan pengendalian kontrak. Terutama kontrak kritis dimana Sesuai dengan Permen PU No. 07/PRT/M/2011 Buku PK 06A-BAB VII B6 Angka 39.2, kontrak dinyatakan kritis apabila:
  - ✓ Periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana.

- ✓ Periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana.
- ✓ Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

Pada saat kontrak dinyatakan kritis, disarankan menerbitkan surat peringatan kepada Kontraktor/Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan *Show Cause Meeting* (SCM).

- e. Pembinaan dan penguatan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang Jasa dengan melaksanakan Bimtek kepada PPK dan Pokja Pemilihan terkait serta Pejabat Pengadaan.
- f. Pembentukan dan penetapan organisasi PBJ, khususnya PPK oleh PA tidak dibatasi/terikat Tahun Anggaran sehingga tidak menghambat proses pelaksanaan PBJ.
- g. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan OPD yang belum melaksanakan/mengalami keterlambatan pengadaan.
- h. Menyediakan layanan (Klinik) konsultasi pengadaan barang/jasa dan dibentuk Tim Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa.
- i. Melakukan koordinasi/konsultasi kepada LKPP melalui surat.

Demikian kami sampaikan untuk maklum dan mohon arahan lebih lanjut.  
Terima kasih.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa,



**Tembusan** disampaikan kepada :

1. Yth. Wakil Bupati Buleleng sebagai laporan;
2. Yth. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng;
3. Yth. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng;
5. Yth. Kepala BPKPD Kabupaten Buleleng;
6. Yth. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng;
7. Arsip.

# Laporan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng Melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Sampai dengan Bulan : Juni 2021

## A. PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

### 1. Data Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa TA 2021

AWAL data 31 Mei 2021



PERUBAHAN data 30 Juni 2021



Tangkapan Layar Monev Tepra

(<https://monev.lkpp.go.id/tepra/summary?instansi=D30&tahun=2021>)

**AWAL data 31 Mei 2021**



**STRUKTUR ANGGARAN KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2021**  
 Pagu Anggaran untuk belanja melalui pengadaan **Rp1.123.527.574.692,-**

**PERUBAHAN data 30 Juni 2021**



Pagu Anggaran untuk belanja melalui pengadaan berubah menjadi **Rp 1.094.855.295.669,-**

**2. Data Paket Pengadaan Yang Diproses Melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Berdasarkan RUP**

**AWAL**

| No            | Jenis Pengadaan | Rencana Umum Pengadaan TA 2021 |                        | Keterangan |
|---------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------|
|               |                 | Paket                          | Pagu                   |            |
| 1             | Barang          | 45                             | 24.106.128.842         |            |
| 2             | Konstruksi      | 77                             | 246.618.710.629        |            |
| 3             | Konsultansi     | 20                             | 7.793.452.775          |            |
| 4             | Jasa Lainnya    | 10                             | 4.157.712.882          |            |
| <b>Jumlah</b> |                 | <b>152</b>                     | <b>282.676.005.128</b> |            |

Sumber : <https://sirup.lkpp.go.id> per Mei 2021

**PERUBAHAN**

| No.           | Jenis Pengadaan | Rencana Umum Pengadaan TA 2021 |                        | Keterangan |
|---------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------|
|               |                 | Paket                          | Pagu                   |            |
| 1             | Barang          | 24                             | 17.053.298.567         |            |
| 2             | Konstruksi      | 62                             | 235.248.478.885        |            |
| 3             | Konsultansi     | 17                             | 6.983.849.768          |            |
| 4             | Jasa Lainnya    | 5                              | 2.924.613.707          |            |
| <b>Jumlah</b> |                 | <b>108</b>                     | <b>262.210.240.927</b> |            |

Sumber : <https://sirup.lkpp.go.id> per Juni 2021




## B. PROSES PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

### 1. Data Penyelesaian Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa

| Jenis Pengadaan Barang/Jasa | Satuan              | Total RUP TA 2021 | Total Paket Dengan Nilai > 200 Juta (Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya) Dan Di Atas 50 Juta Untuk Jasa Konsultansi |                 |                 |                            |                |                    | Sisa Pekerjaan PB] (3-(5+7+8+9)) |                 |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|---|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|
|                             |                     |                   | Paket Yang Masuk  | Selesai         |                 |                            | Dalam Proses   | Gagal/Tender Ulang |                                  | Ditunda/batal   |
|                             |                     |                   |   | Bulan Ini       | S/d Bulan Ini   | (%) Jumlah Paket (7:4x100) |                |                    |                                  |                 |
| 1                           | 2                   | 3                 | 4   | 5               | 6               | 7                          | 8              | 9                  | 10                               |                 |
| Barang                      | Paket               | 24                | 15  | 10              | 10              | 66,67                      | 5              | -                  | 3                                | 6               |
|                             | Fagu (Rp.)          | 17.053.298.567    | 13.265.305.477  | 5.057.688.452   | 6.057.688.452   | 45,67                      | 7.207.617.025  | -                  | 1.150.450.000                    | 2.637.543.090   |
|                             | HPS (Rp.)           |                   | 12.617.432.926  | 5.656.340.098   | 5.656.340.098   | 44,83                      | 6.961.092.829  | -                  | -                                | -               |
|                             | Nilai Kontrak (Rp.) |                   | 4.882.906.954   | 4.882.906.954   | 4.882.906.954   | 100,00                     | -              | -                  | -                                | -               |
| Konstruksi                  | Paket               | 62                | 53  | 28              | 28              | 52,83                      | 24             | 1                  | -                                | 9               |
|                             | Fagu (Rp.)          | 235.248.478.885   | 127.876.815.885   | 90.942.344.339  | 90.942.344.339  | 71,12                      | 36.934.471.546 | 3.286.295.735      | -                                | 104.085.367.265 |
|                             | HPS (Rp.)           |                   | 120.017.452.047   | 90.958.031.280  | 90.958.031.280  | 75,79                      | 29.059.420.767 | -                  | -                                | -               |
|                             | Nilai Kontrak (Rp.) |                   | 71.593.022.093  | 71.593.022.093  | 71.593.022.093  | 100,00                     | -              | -                  | -                                | -               |
| Konsultansi                 | Paket               | 17                | 15  | 10              | 10              | 66,67                      | 4              | 1                  | -                                | 2               |
|                             | Fagu (Rp.)          | 6.983.849.763     | 4.417.945.503   | 2.823.661.523   | 2.823.661.523   | 63,91                      | 1.594.283.980  | 301.200.000        | -                                | 2.264.704.265   |
|                             | HPS (Rp.)           |                   | 3.575.114.839   | 2.677.870.139   | 2.677.870.139   | 74,90                      | 897.244.700    | -                  | -                                | -               |
|                             | Nilai Kontrak (Rp.) |                   | 2.210.380.210   | 2.210.380.210   | 2.210.380.210   | 100,00                     | -              | -                  | -                                | -               |
| Jasa Lainnya                | Paket               | 5                 | 4   | 3               | 3               | 75,00                      | 1              | -                  | -                                | 1               |
|                             | Fagu (Rp.)          | 2.924.613.707     | 2.683.596.707   | 2.479.353.007   | 2.479.353.007   | 92,39                      | 204.243.700    | -                  | -                                | 241.017.000     |
|                             | HPS (Rp.)           |                   | 2.447.682.489   | 2.248.003.789   | 2.248.003.789   | 91,84                      | 199.678.700    | -                  | -                                | -               |
|                             | Nilai Kontrak (Rp.) |                   | 1.885.020.540   | 1.885.020.540   | 1.885.020.540   | 100,00                     | -              | -                  | -                                | -               |
| Jumlah Total                | Paket               | 108               | 87  | 51              | 51              | 58,62                      | 34             | 2                  | 3                                | 18              |
|                             | Fagu (Rp.)          | 262.210.240.927   | 148.243.663.572   | 102.303.047.321 | 102.303.047.321 | 69,01                      | 45.940.616.251 | 3.587.495.735      | 1.150.450.000                    | 109.228.631.620 |
|                             | HPS (Rp.)           |                   | 138.657.682.301   | 101.540.245.305 | 101.540.245.305 | 73,23                      | 37.117.436.996 | -                  | -                                | -               |
|                             | Nilai Kontrak (Rp.) |                   | 80.571.329.797  | 80.571.329.797  | 80.571.329.797  | 100,00                     | -              | -                  | -                                | -               |

Dalam bentuk grafik

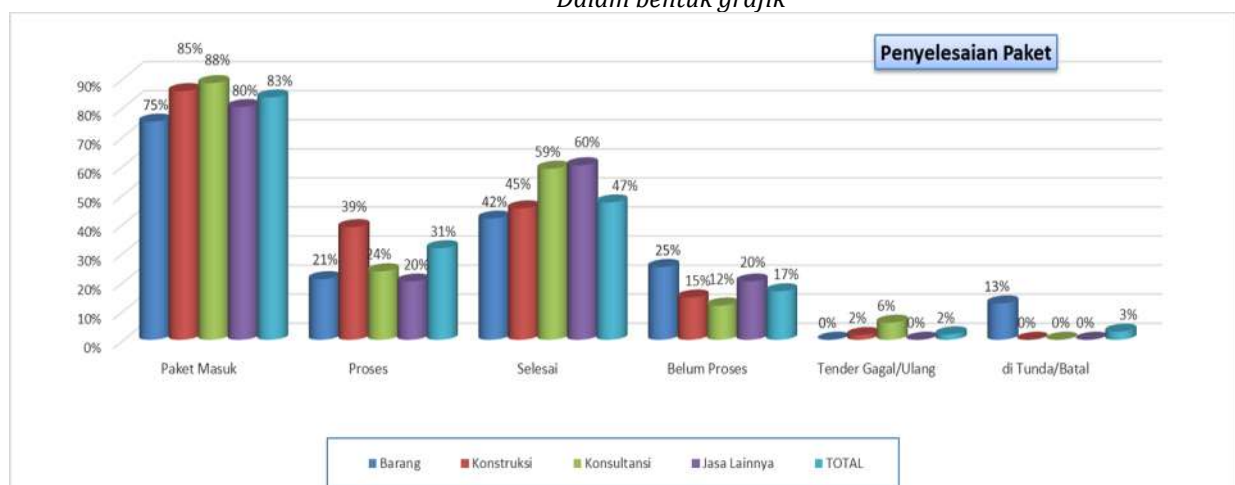


### 2. Ketepatan Waktu Penyelesaian Paket Sesuai dengan RUP

| Jenis Pengadaan Barang/Jasa | Target     | Selesai   |              | Deviasi (Target - Paket Selesai) |              |
|-----------------------------|------------|-----------|--------------|----------------------------------|--------------|
|                             |            | Paket     | (%)          | Paket (Target -Selesai)          | (%)          |
| 1. Barang                   | 24         | 10        | 41,67        | 14                               | 58,33        |
| 2. Konstruksi               | 62         | 28        | 45,16        | 34                               | 54,84        |
| 3. Konsultansi              | 17         | 10        | 58,82        | 7                                | 41,18        |
| 4. Jasa Lainnya             | 5          | 3         | 60,00        | 2                                | 40,00        |
| <b>Jumlah</b>               | <b>108</b> | <b>51</b> | <b>47,22</b> | <b>57</b>                        | <b>52,78</b> |

Keterangan : Deviasi = Sisa Paket dibagi Target x 100 (dalam persen)

Dalam bentuk grafik

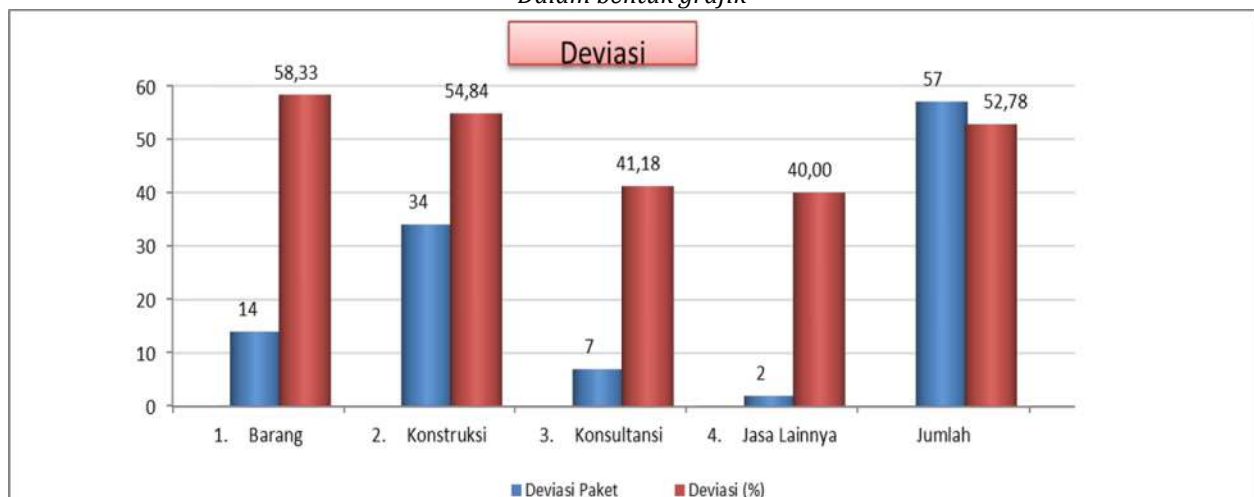


### 3. Daftar Proses Pengadaan Barang Jasa Berdasarkan Perangkat Daerah

| No. | Nama Perangkat Daerah   | Proses Pelaksanaan Tender |              |               |                |              |                          |
|-----|---|---------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------------------|
|     |   | Jumlah                    | Dalam Proses | Sudah Selesai | Ditunda /Batal | Belum Proses | Gagal/Tender Ulang/Batal |
| 1   | 2   | 3                         | 4            | 5             | 6              | 7            | 8                        |
| 1   | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                      | 1                         | 0            | 1             | 0              | 0            |                          |
| 2   | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                          |
| 3   | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                          |
| 4   | BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH  | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                          |
| 5   | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  | 4                         | 0            | 4             | 0              | 0            |                          |
| 6   | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                          |
| 7   | DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH   | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                          |
| 8   | DINAS KEBUDAYAAN  | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                          |
| 9   | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                          |
| 10  | DINAS KESEHATAN   | 18                        | 4            | 3             | 0              | 9            | 2                        |
| 11  | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  | 1                         | 0            | 1             | 0              | 0            |                          |
| 12  | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK                                       | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                          |
| 13  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP  | 2                         | 0            | 2             | 0              | 0            |                          |
| 14  | DINAS PARIWISATA  | 4                         | 0            | 4             | 0              | 0            |                          |
| 15  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG   | 38                        | 6            | 30            | 0              | 2            |                          |
| 16  | DINAS PEMADAM KEBAKARAN   | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                          |
| 17  | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                          |
| 18  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU                                      | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                          |
| 19  | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA   | 24                        | 20           | 0             | 3              | 1            |                          |
| 20  | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 1                         | 0            | 1             | 0              | 0            |                          |
| 21  | DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH                       | 1                         | 1            | 0             | 0              | 0            |                          |
| 22  | DINAS PERHUBUNGAN   | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                          |
| 23  | DINAS PERTANIAN   | 1                         | 1            | 0             | 0              | 0            |                          |
| 24  | DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN   | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                          |
| 25  | DINAS SOSIAL  | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                          |
| 26  | DINAS TENAGA KERJA  | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                          |
| 27  | INSPEKTORAT DAERAH  | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                          |
| 28  | KECAMATAN BANJAR  | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                          |
| 29  | KECAMATAN BULELENG  | 2                         | 0            | 0             | 0              | 2            |                          |
| 30  | KECAMATAN BUSUNGBIU   | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                          |
| 31  | KECAMATAN GEROKGAK  | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                          |
| 32  | KECAMATAN KUBUTAMBAHAN  | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                          |
| 33  | KECAMATAN SAWAN   | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                          |
| 34  | KECAMATAN SERIRIT   | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                          |
| 35  | KECAMATAN SUKASADA  | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                          |
| 36  | KECAMATAN TEJAKULA  | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                          |
| 37  | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH   | 9                         | 2            | 4             | 0              | 3            |                          |
| 38  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                          |
| 39  | SEKRETARIAT DAERAH  | 1                         | 0            | 1             | 0              | 0            |                          |
| 40  | SEKRETARIAT DPRD  | 1                         | 0            | 0             | 0              | 1            |                          |
|     | <b>TOTAL</b>  | <b>108</b>                | <b>34</b>    | <b>51</b>     | <b>3</b>       | <b>18</b>    | <b>2</b>                 |

#### 4. Data Efisiensi APBD Terhadap Pagu Anggaran dan HPS

| Jenis Pengadaan Barang/Jasa | Pemilihan Selesai |                           |                           |                          | Efisiensi  |              |   |              |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--|--------------|---|--------------|
|                             | Paket             | Pagu (Rp.)                | HPS (Rp.)                 | Nilai Kontrak (Rp.)      | Terhadap Pagu Anggaran (Rp.)<br>(Pagu - Nilai Kontrak) |              | Terhadap HPS (Rp.)<br>(HPS - Nilai Kontrak) |              |
|                             |                   |                           |                           |                          | (Rp.)  | %            | (Rp.)                                       | %            |
| 1. Barang                   | 10                | 6.057.688.452,00          | 5.656.340.097,53          | 4.882.906.954,07         | 1.174.781.497,93                                       | 19,39        | 773.433.143,46                              | 13,67        |
| 2. Konstruksi               | 28                | 90.942.344.339,00         | 90.958.031.280,34         | 71.593.022.092,96        | 19.349.322.246,04                                      | 21,28        | 19.365.009.187,38                           | 21,29        |
| 3. Jasa Konsultansi         | 10                | 2.823.661.523,00          | 2.677.870.138,90          | 2.210.380.210,00         | 613.281.313,00   | 21,72        | 467.489.928,90                              | 17,46        |
| 4. Jasa Lainnya             | 3                 | 2.479.353.007,00          | 2.248.003.788,67          | 1.885.020.540,20         | 594.332.466,80   | 23,97        | 362.983.248,47                              | 16,15        |
| <b>Jumlah</b>               | <b>51</b>         | <b>102.303.047.321,00</b> | <b>101.540.245.305,44</b> | <b>80.571.329.797,23</b> | <b>21.731.717.523,77</b>                               | <b>21,24</b> | <b>20.968.915.508,21</b>                    | <b>20,65</b> |


Dalam bentuk grafik

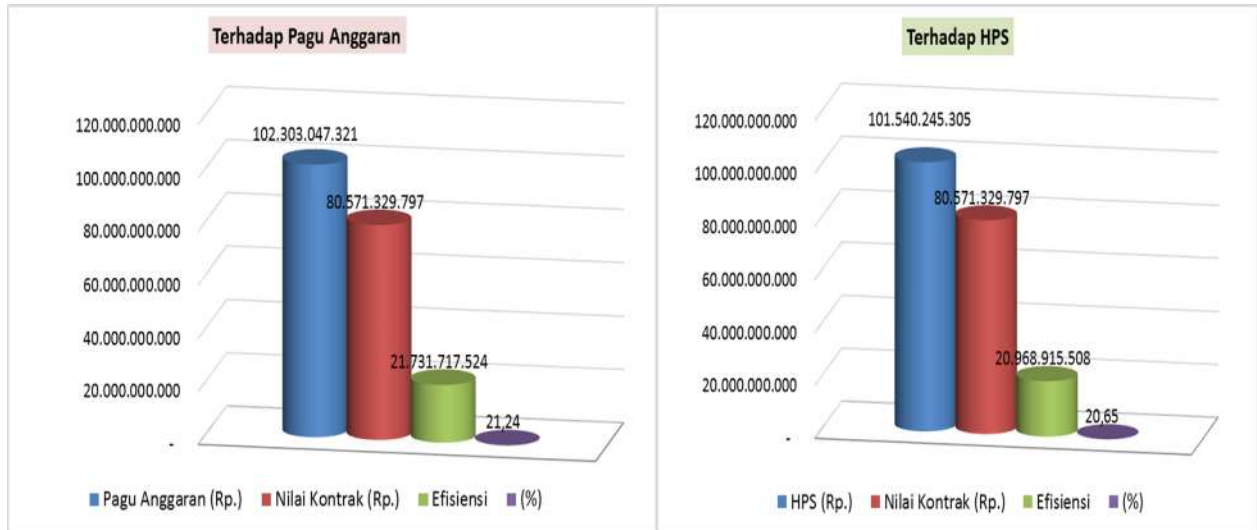

#### 5. Tingkat Partisipasi Penyedia dan Kualitas Penawaran

| No | Jenis Pengadaan Barang | Jumlah Paket | a. Partisipasi Penyedia     |  | b. Kualitas penawaran             |                                |               |
|----|------------------------|--------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|
|    |                        |              | Jumlah Penawaran Yang Masuk | Rata-rata Partisipasi Penyedia/Paket (4:3) | Jumlah Penawaran Yang Di evaluasi | Penawaran Yang Memenuhi Syarat | (%) (7:6x100) |
| 1  | 2                      | 3            | 4                           | 5  | 6                                 | 7                              | 8             |
| 1  | Barang                 | 24           | 55                          | 2,29                                       | 45                                | 43                             | 95,56         |
| 2  | Konstruksi             | 62           | 671                         | 10,82                                      | 121                               | 95                             | 78,51         |
| 3  | Konsultansi            | 17           | 79                          | 4,65                                       | 69                                | 36                             | 52,17         |
| 4  | Jasa Lainnya           | 5            | 19                          | 3,80                                       | 15                                | 5                              | 33,33         |
|    | <b>Jumlah</b>          | <b>108</b>   | <b>824</b>                  | <b>7,63</b>                                | <b>250</b>                        | <b>179</b>                     | <b>71,60</b>  |

Dalam bentuk grafik

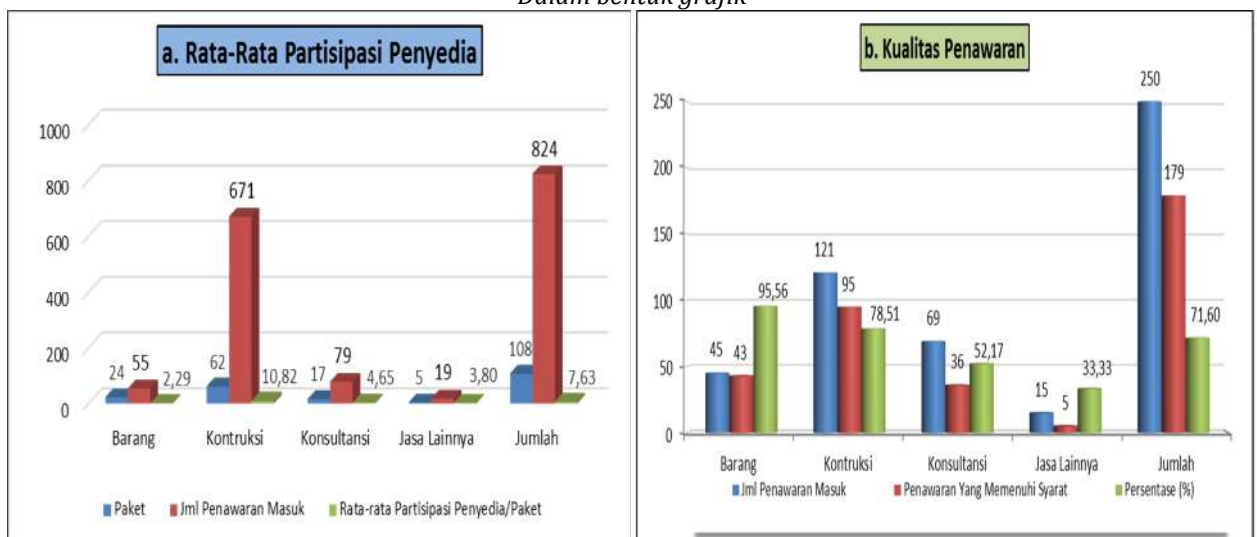

## 6. Sanggahan dari Penyedia

| No.           | Jenis Pengadaan Barang | Jumlah Paket Pemilihan Selesai Proses | Sanggahan |               | Tindak lanjut               |              |               |          | Ket      |
|---------------|------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|----------|
|               |                        |                                       | Jml       | (% )          | Sanggahan Penyedia Diterima |              | Jawaban Pokja |          |          |
|               |                        |                                       |           |               | Evaluasi Ulang              | Lelang Ulang | Diterima      | Banding  |          |
| 1             | Barang                 | 10                                    | 1         | 25,0%         | -                           | -            | 1             | -        | -        |
| 2             | Kontruksi              | 28                                    | 5         | 17,85%        | 1                           | -            | 4             | -        | -        |
| 3             | Konsultansi            | 10                                    | 2         | 20%           | -                           | -            | 2             | -        | -        |
| 4             | Jasa Lainnya           | 3                                     | 0         | 0,0%          | -                           | -            | 0             | -        | -        |
| <b>Jumlah</b> |                        | <b>51</b>                             | <b>8</b>  | <b>15,68%</b> | <b>1</b>                    | <b>-</b>     | <b>7</b>      | <b>-</b> | <b>-</b> |

## 7. Data Pengaduan

| No            | Asal Pengaduan/Hasil Pemeriksaan | Nama Kegiatan/ OPD | Jenis Pengadaan Barang/Jasa | Jml Pengaduan | Nilai Pekerjaan (Rp) | Jumlah Tindak Lanjut |               | Ket/ Penjelasan |
|---------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
|               |                                  |                    |                             |               |                      | Selesai              | Proses Lanjut |                 |
| 1             | APH                              |                    |                             |               |                      |                      |               |                 |
| 2             | Penyedia                         |                    |                             |               |                      |                      |               |                 |
| 3             | Masyarakat                       |                    |                             |               |                      |                      |               |                 |
| 4             | Media Masa                       |                    |                             |               |                      |                      |               |                 |
| <b>Jumlah</b> |                                  |                    |                             |               |                      |                      |               |                 |


Nihil

## 8. DATA SEBARAN PEMENANG TENDER/SELEKSI/PEMILIHAN PENYEDIA



## C. MONITORING PELAKSANAAN KONTRAK OPD

### 1. Data Paket Berkontrak OPD

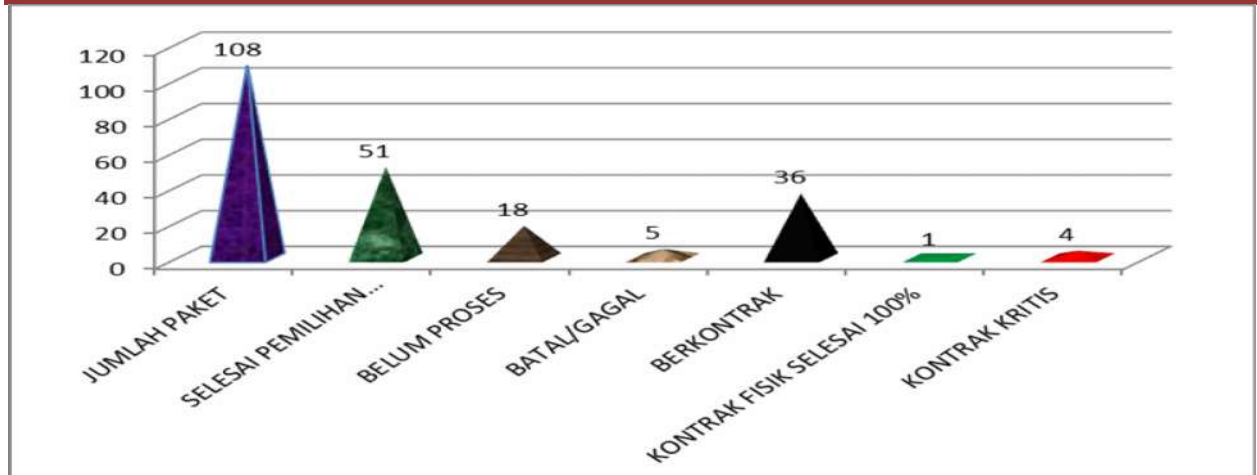

## 2. Data Kontrak Kritis dan Anprestasi

| No. | Nama Kegiatan/OPD   | Jenis Pengadaan Barang/Jasa | Nilai Kontrak (Rp) | Jangka waktu Pelaksanaan (Hari Kalender) | Sisa Waktu Pekerjaan/ Terlambat (Hari Kalender) | Prosentase Pekerjaan Kondisi Fisik (%) | Ket (Deviasi -) |
|-----|---|-----------------------------|--------------------|--|---|--|-----------------|
| 1.  | BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA.                                | Barang                      | 265.402.609,00     | 243                                      | 150   | 15,23                                  | -24,8%          |
| 2.  | Peningkatan Jalan Celukan Bawang - Pelabuhan                | Pekerjaan Konstruksi        | 3.008.864.744,74   | 120                                      | 29  | 22,652                                 | -28,9%          |
| 3.  | Peningkatan Jalan Lebah Siung Pancoran                      | Pekerjaan Konstruksi        | 3.754.132.249,94   | 120                                      | 29  | 55,466                                 | -29,5%          |
| 4.  | Peningkatan Jalan SP3. Tigawasa - Uma Sendi - Bingin Banjar | Pekerjaan Konstruksi        | 6.835.332.554,92   | 150                                      | 60  | 37,46                                  | -21,5%          |

### D. Pengembangan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa

Pengembangan kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa sangatlah diperlukan dalam menunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa itu sendiri. Pengembangan SDM dalam hal ini dapat berupa pengembangan profesi maupun pengembangan keahlian. Bentuk-bentuk pengembangan SDM Pengadaan Barang/Jasa antara lain seperti : bimbingan teknis, sosialisasi, ujian kompetensi, dan lain sebagainya. Pada Tahun Anggaran 2021, Pengembangan SDM Pengadaan Barang/Jasa telah disiapkan anggaran sebesar Rp.429.480.600,- melalui Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (4.01.03.2.03.03).

### E. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut diatas, proses pengadaan barang/jasa sampai dengan bulan Maret 2021 disimpulkan sebagai berikut :

1. Rekap data per tanggal 30 Juni 2021 setelah adanya refocusing/perubahan APBD terdapat RUP yang di proses oleh Pokja Pemilihan **sebanyak 108 paket dengan Pagu Anggaran Rp.262.210.240.927,-**.
2. Pengadaan barang/jasa yang diproses Pokja Pemilihan sampai dengan bulan Juni 2021 sebanyak 87 paket (83%), dan **sudah selesai tender sebanyak 51 paket (47%)** dengan total nilai kontrak sebesar Rp.80.571.329.797,23 (30,73%) dari total pagu anggaran sebesar Rp.262.210.240.926,68, yang sedang proses tender sebanyak 18 paket (31%), yang belum di proses sebesar 18 paket (17%) dan yang batal tender sebanyak 3 paket (3%) karena refocusing dan perubahan metode pemilihan menjadi e-purchasing.
3. Terdapat juga 2 paket pengadaan gagal proses yang sumber anggaran dari DAK pada Dinas Kesehatan yaitu Paket Belanja Jasa Konsultan Perencana Arsitektur-Jasa Desain Arsitektur senilai Rp.301.200.000,- dan Paket Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium senilai Rp.3.286.295.735, karena tidak cukup waktu akibat perencanaan dan pembangunan fisik dalam satu tahun anggaran dan adanya beberapa perubahan regulasi.
4. **Efisiensi anggaran sampai dengan Bulan Juni 2021 dari 51 (paket APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 yang sudah selesai proses tender) sebesar Rp.20.968.915.508,21 (20,65%)** dari total HPS Rp.101.540.245.305,44 dan sisa anggaran sebesar Rp.21.731.717.523,77 (21,24%) dari total pagu anggaran Rp.102.303.047.321,-.
5. Kendala/permasalahan dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana diuraikan diatas dan tindak lanjut yang telah laksanakan adalah :
  - a. Masih terdapat perangkat daerah yang terlambat dalam mengajukan Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP) yang dikarenakan beberapa kendala antara lain :
    - ✓ Beberapa paket pengadaan masih dalam proses persiapan oleh PPK.
    - ✓ Beberapa paket konstruksi yang mengalami keterlambatan, masih berproses pada perencanaan, hal ini disebabkan karena perencanaan dan pelaksanaan pembangunan konstruksi dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama.
    - ✓ Terjadi kekeliruan dalam input waktu pelaksanaan pengadaan pada aplikasi SiRUP.
    - ✓ Kesalahan input rekening anggaran.

- b. Terdapat beberapa perubahan regulasi pada pertengahan Tahun Anggaran yang memerlukan waktu tambahan untuk penyesuaian proses dan konsultasi/koordinasi dengan *leading sector* terkait.
  - c. Terdapat beberapa paket tambahan yang awalnya direncanakan Pemilihan Penyedia melalui *e-purchasing* namun dalam e-katalog tidak ditayangkan, sehingga perencanaan kurang matang dari sisi waktu proses Pemilihan Penyedia dan perencanaan pengadaan yang telah disusun di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
  - d. Dari monitoring pelaksanaan kontrak terdapat beberapa kontrak kritis
6. Dalam upaya peningkatan kinerja PBJ, dilakukan upaya sbb. :
- a. Melakukan penguatan perencanaan dan pengumuman RUP lebih awal melalui kegiatan reviu penyusunan RUP dan monitoring terhadap RUP yang telah diumumkan melalui SiRUP.
  - b. Percepatan pemilihan terutama pekerjaan fisik (konstruksi) agar tidak menumpuk di Triwulan III dan IV untuk menghindari keterlambatan penyelesaian fisik.
  - c. Melakukan monitoring evaluasi kemajuan pelaksanaan fisik pekerjaan konstruksi ke OPD khusus paket - paket strategis, mengetahui permasalahan lebih awal untuk solusi penyelesaian.
  - d. Pendampingan penyusunan rencana pengadaan dan pengendalian kontrak. Terutama kontrak kritis dimana Sesuai dengan Permen PU No. 07/PRT/M/2011 Buku PK 06A-BAB VII B6 Angka 39.2, kontrak dinyatakan kritis apabila:
    - ✓ Periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana.
    - ✓ Periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana.
    - ✓ Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampui tahun anggaran berjalan.Pada saat kontrak dinyatakan kritis, disarankan menerbitkan surat peringatan kepada Kontraktor/Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan *Show Cause Meeting* (SCM).
  - e. Pembinaan dan penguatan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang Jasa dengan melaksanakan Bimtek kepada PPK dan Pokja Pemilihan terkait serta Pejabat Pengadaan.
  - f. Pembentukan dan penetapan organisasi PBJ, khususnya PPK oleh PA tidak dibatasi/terikat Tahun Anggaran sehingga tidak menghambat proses pelaksanaan PBJ.
  - g. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan OPD yang belum melaksanakan/mengalami keterlambatan pengadaan.
  - h. Menyediakan layanan (Klinik) konsultasi pengadaan barang/jasa dan dibentuk Tim Layanan Clearing House Pengadaan Barang/Jasa.
  - i. Melakukan koordinasi/konsultasi kepada LKPP melalui surat.

Demikian laporan ini dibuat, untuk selanjutnya kami mohon arahan untuk perbaikan kinerja pengadanan berikutnya.

Singaraja, 10 Juli 2021  
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa,



**DATA TENDER/SELEKSI TAHUN ANGGARAN 2021**

| NO | NAMA SATKER   | NAMA PAKET  | JENIS PENGADAAN | PAGU           | HPS            | Nama Pemenang            | Alamat  | Nilai Hasil Tender(Rp.) | Sisa Anggaran (Rp.) | PROSES/BLELUM | KET  |
|----|---|---|-----------------|----------------|----------------|--------------------------|---|-------------------------|---------------------|---------------|------|
| 1  | 2   | 3   | 4               | 5              | 6              | 7                        | 8   | 9                       | 10                  | 11            | 12   |
| 01 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN                                  | 1 Rehabilitasi Bangunan Panti Benih/ Bangsal Hatchery dan Rehabilitasi kolam atau bak pemijahan/induk/ calon induk/ larva/ tandon | PK              | 321.080.950    | 320.809.688    | CV. UCINDO KARYA MANDIRI | Perumahan Mustika Laksmi Gg 4 No. 6 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali                  | 232.869.921,04          | 88.211.029          | Sudah Selesai | APBN |
|    | JUMLAH 01   | 1   |                 | 321.080.950    | 320.809.688    |                          |   | 232.869.921,04          | 88.211.029          |               |      |
| 2  | DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | 1 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur- Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung                           | JK              | 349.437.000    |                |                          |   |                         | 349.437.000         | Dalam Proses  | APBD |
|    | JUMLAH 02   | 1   |                 | 349.437.000    | -              | -                        | -   | -                       | 349.437.000         |               |      |
| 3  | SEKRETARIAT DAERAH  | 1 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermontor Perorangan  | B               | 445.500.000    | 405.550.000    | PT Agung Automall        | JALAN CUT MUTIAH NO 14 MENTENG JAKARTA PUSAT 10330 - Jakarta Pusat (Kota) - DKI Jakarta | 404600000,00            | 40.900.000          | Sudah Selesai | APBD |
|    | JUMLAH 03   | 1   |                 | 445.500.000    | 405.550.000    | -                        | -   | 404600000,00            | 40.900.000          |               |      |
| 4  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP  | 1 Belanja jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawasan Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung                              | JK              | 611.981.923    | 511.377.350    | PT. KENCANA ADHI KARMA   | JL. BATUSARI NOMOR 15 DENPASAR - Denpasar (Kota) - Bali                                 | 409.041.600             | 202.940.323         | Sudah Selesai | APBD |
|    |   | 2 Belanja Modal Taman (Pembangunan RTH Taman Bung Karno Tahap IV  | PK              | 15.178.311.319 | 15.178.310.778 | PT. SANUR JAYA UTAMA     | Jalan Setia Budi, Kuta - Badung - Badung (Kab.) - Bali                                  | 15.027.351.458          | 150.959.861         | Sudah Selesai | APBD |
|    | JUMLAH 04   | 2   |                 | 15.790.293.242 | 15.689.688.128 | 0                        | 0   | 15.436.393.058          | 353.900.184         |               |      |
| 5  | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH   | 1 BELANJA NATURA DAN PAKAN - NATURA.  | B               | 682.586.825    | 657.633.400    | CV KARYA SARI SEDANA     | Banjar Dinas Sari Tapak Dara Kubutambahan, Buleleng - Buleleng (Kab.) - Bali            | 612.113.200             | 70.473.625          | Sudah Selesai | APBD |
|    |   | 2 BELANJA MODAL ALAT DAPUR.   | B               | 678.300.000    |                |                          |   |                         | 678.300.000         | Belum Proses  | APBD |
|    |   | 3 BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN.   | PK              | 452.500.000    |                |                          |   |                         | 452.500.000         | Belum Proses  | APBD |
|    |   | 4 BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA - BANGUNAN KESEHATAN.   | PK              | 500.000.000    |                |                          |   |                         | 500.000.000         | Belum Proses  | APBD |

| NO | NAMA SATKER                         |   | NAMA PAKET  | JENIS PENGADAAN | PAGU                 | HPS                  | Nama Pemenang          | Alamat   | Nilai Hasil Tender(Rp.) | Sisa Anggaran (Rp.)  | PROSES/BLELUM | KET        |
|----|-------------------------------------|---|---|-----------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|-------------------------|----------------------|---------------|------------|
| 1  | 2                                   |   | 3   | 4               | 5                    | 6                    | 7                      | 8  | 9                       | 10                   | 11            | 12         |
|    |                                     | 5 | BELANJA MODAL ASET TETAP DALAM RENOVASI.  | B               | 464.000.000          | 463.641.014,22       | CV. Dewata Karya       | Br. Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali               | 357.207.881,07          | 106.792.119          | Sudah Selesai | APBD       |
|    |                                     | 6 | BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - ALAT TULIS KANTOR.   | B               | 328.315.000          | 302.598.600          | UD TRESNA JAYA         | Jalan Ahmad Yani No.5 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali                               | 236.935.530             | 91.379.470           | Sudah Selesai | APBD       |
|    |                                     | 7 | BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA.  | B               | 399.612.000          | 385.678.000          | UD TRESNA JAYA         | Jalan Ahmad Yani No.5 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali                               | 265.402.609             | 134.209.391          | Sudah Selesai | APBD       |
|    |                                     | 8 | BELANJA LINEN.  | B               | 417.543.025          | 415.207.500          |                        |  |                         | 417.543.025          | Dalam Proses  | APBD       |
|    |                                     | 9 | BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - BAHAN CETAK.   | JL              | 204.243.700          | 199.678.700          |                        |  |                         | 204.243.700          | Dalam Proses  | APBD       |
|    |                                     | 9 | <b>JUMLAH 05</b>  |                 | <b>4.127.100.550</b> | <b>2.424.437.214</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>1.471.659.220</b>    | <b>2.655.441.330</b> |               |            |
| 6  | SEKRETARIAT DPRD                    | 1 | Rehabilitas/ Renovasi Ringan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana Lantai 1/ Pemasangan lantai Vynil dan dinding HPL | PK              | 426.580.000          |                      |                        |  |                         | 426.580.000          | Belum Proses  | APBD       |
|    |                                     | 1 | <b>JUMLAH 06</b>  |                 | <b>426.580.000</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>               | <b>-</b>   | <b>-</b>                | <b>426.580.000</b>   |               |            |
| 7  | DINAS PARIWISATA                    | 1 | Pembuatan Tempat Parkir Barat Di DTW Eks. Pelabuhan Buleleng  | PK              | 617.555.570          | 606.094.045,62       | CV. Lissjaya Utama     | Griya Panji Asri Blok P/5 Panji- Singaraja - Buleleng - Buleleng (Kab.) - Bali         | 484.875.236,50          | 132.680.334          | Sudah Selesai | APBD (DAK) |
|    |                                     | 2 | Pembangunan Plaza/Pusat Jajanan Kuliner Di DTW Air Sanih Desa Bukti   | PK              | 285.000.000          | 284.999.121,18       | CV. KRISNA PUTRA BAL   | Wisma Arya Lantai I Blok 2, Jalan Pulau Irian No.36 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali | 228.002.337,37          | 56.997.663           | Sudah Selesai | APBD (DAK) |
|    |                                     | 3 | Pembangunan Plaza/Pusat Jajanan Kuliner Di DTW Pantai Lovina  | PK              | 285.000.000          | 284.961.920,55       | CV. KRISNA PUTRA BALI  | Wisma Arya Lantai I Blok 2, Jalan Pulau Irian No.36 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali | 227.969.557,66          | 57.030.442           | Sudah Selesai | APBD (DAK) |
|    |                                     | 4 | Pembuatan Tempat Parkir Barat Di DTW Pantai Lovina  | PK              | 257.480.400          | 257.466.895,40       | CV ARYA DEWATA UTAMA   | Wisma Arya Lanta I Blok 1, Jalan Pulau Irian No. 36 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali | 202.700.000             | 54.780.400           | Sudah Selesai | APBD (DAK) |
|    |                                     | 4 | <b>JUMLAH 7</b>   |                 | <b>1.445.035.970</b> | <b>1.433.521.983</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>   | <b>1.143.547.132</b>    | <b>301.488.838</b>   |               |            |
| 8  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 1 | Supervisi Konstruksi Pembangunan Jembatan Pangkung Dalem Ruas Jalan SP3. Gitgit - Wanagiri                                  | JK              | 259.000.000          | 258.443.900          | PT. KENCANA ADHI KARMA | JL. BATUSARI NOMOR 15 DENPASAR - Denpasar (Kota) - Bali                                | 230.814.650             | 28.185.350           | Sudah Selesai | APBD       |
|    |                                     | 2 | Supervisi Konstruksi Penggantian Jembatan Tukad Buleleng Ruas Jalan Bakung - Sari Mekar - Padang Bulia                      | JK              | 222.000.000          | 221.998.150,00       | PT. KENCANA ADHI KARMA | JL. BATUSARI NOMOR 15 DENPASAR - Denpasar (Kota) - Bali                                | 178.195.000             | 43.805.000           | Sudah Selesai | APBD       |
|    |                                     | 3 | Supervisi Konstruksi Peningkatan Jalan SP3. Tigawasa - Uma Sendi - Bingin Banjah  | JK              | 125.000.000          | 124.622.300          | PT MITRA TRI SAKTI     | JL. BUANA RAYA Gg. MEGA BUANA NO. 11 A PADANG SAMBIAN DENBAR - Badung (Kab.) - Bali    | 102.286.800             | 22.713.200           | Sudah Selesai | APBD       |



| NO | NAMA SATKER | NAMA PAKET |  | JENIS PENGADAAN | PAGU          | HPS              | Nama Pemenang           | Alamat   | Nilai Hasil Tender(Rp.) | Sisa Anggaran (Rp.) | PROSES/BLELUM | KET        |
|----|-------------|------------|--|-----------------|---------------|------------------|-------------------------|--|-------------------------|---------------------|---------------|------------|
| 1  | 2           | 3          | 4  | 5               | 6             | 7                | 8                       | 9  | 10                      | 11                  | 12            |            |
|    |             | 4          | Supervisi Konstruksi Pembangunan Jembatan Tukad Daya Ruas Jalan SP3. JN. Tikungan Bungkulan - Jembatan | JK              | 185.000.000   | 184.999.100      | PT MITRA TRI SAKTI      | JL. BUANA RAYA Gg. MEGA BUANA NO. 11 A PADANG SAMBIAN DENBAR - Badung (Kab.) - Bali                | 148.365.800             | 36.634.200          | Sudah Selesai | APBD       |
|    |             | 5          | Penguatan Database dan Survey Kondisi Jembatan   | JK              | 150.000.000   | 146.022.800      |                         |  |                         | 150.000.000         | Dalam Proses  | APBD       |
|    |             | 6          | Survey Kondisi Jalan   | JK              | 499.975.000   | 499.140.400      |                         |  |                         | 499.975.000         | Dalam Proses  | APBD       |
|    |             | 7          | Peningkatan SPAM Perdesaan Desa Kayu Putih   | PK              | 896.140.000   | 896.139.263      | CV. PUTRA BALI TIMUR    | Jalan Sakura I Kelurahan Semarang Klod Klungkung - Klungkung (Kab.) - Bali                         | 658.100.000             | 238.040.000         | Sudah Selesai | APBD (DAK) |
|    |             | 8          | Peningkatan SPAM Perdesaan Desa Panji Anom   | PK              | 1.592.130.000 | 1.592.124.332    | CV. ATMA KARYA          | JALAN KARGO PASAR NO. 14 DENPASAR - Denpasar (Kota) - Bali   | 1.111.888.258           | 480.241.742         | Sudah Selesai | APBD (DAK) |
|    |             | 9          | Peningkatan SPAM Perdesaan Desa Tegallinggah   | PK              | 1.274.922.000 | 1.274.914.820    | CV. PAYU JAYA SEJAHTERA | JALAN TUKAD BALIAN NO. 117 Z RENON, DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR, BALI - Denpasar (Kota) - Bali | 889.845.700             | 385.076.300         | Sudah Selesai | APBD (DAK) |
|    |             | 10         | Peningkatan SPAM Perdesaan Desa Tigawasa   | PK              | 1.682.150.000 | 1.682.143.598    | CV. ADI YASA            | JALAN PULAU IRIAN DSN. KAJANAN DESA PENGLATAN - BULELENG - Buleleng (Kab.) - Bali                  | 1.206.549.631,27        | 475.600.369         | Sudah Selesai | APBD (DAK) |
|    |             | 11         | Peningkatan SPAM Perdesaan Desa Wanagiri   | PK              | 1.251.171.000 | 1.251.162.094,74 | CV. Kuarsa Teknik       | Perum Nuansa Asri Pesona Blok A/10, Desa Bongon Tabanan - Tabanan (Kab.) - Bali                    | 923.630.000             | 327.541.000         | Sudah Selesai | APBD (DAK) |
|    |             | 12         | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lanyahan Petandakan   | PK              | 1.896.059.117 | 1.896.059.117    | CV. Perdana Niaga       | Jalan Pulau Irian Gg. Anggur No. 5 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali                              | 1.338.437.987,22        | 557.621.130         | Sudah Selesai | APBD       |
|    |             | 13         | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tabang  | PK              | 1.815.402.936 | 1.815.402.936    | CV. PUTRA BALE GEDE     | Jalan Untung Surapati Kel. Padangkerta - Amlapura - Karang Asem (Kab.) - Bali                      | 1.403.216.386,70        | 412.186.549         | Sudah Selesai | APBD (DAK) |
|    |             | 14         | Pengawasan/Supervisi Rehabilitasi Jaringan Irigasi   | JK              | 290.260.000   | 290.257.000      | CV. TRI MATRA DISAIN    | Jalan Subur Gg. Mirah Cempaka II No. 17 Denpasar/Jln. Gatsu I/VII No. 3B Lt.I Denpasar             | 225.060.000             | 65.200.000          | Sudah Selesai | APBD (DAK) |
|    |             | 15         | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jembong   | PK              | 1.278.218.032 | 1.278.211.111    | PT General Technics     | Jl. Pantai Baru, Banjar Dinas Dharma Yasa, Tukadmungga, Buleleng - Buleleng (Kab.) - Bali          | 969.756.731,69          | 308.461.300         | Sudah Selesai | APBD (DAK) |

| NO | NAMA SATKER | NAMA PAKET |  | JENIS PENGADAAN | PAGU            | HPS              | Nama Pemenang               | Alamat   | Nilai Hasil Tender(Rp.) | Sisa Anggaran (Rp.) | PROSES/BLELUM | KET        |
|----|-------------|------------|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------------|---------------|------------|
| 1  | 2           | 3          | 4  | 5               | 6               | 7                | 8                           | 9  | 10                      | 11                  | 12            |            |
|    |             | 16         | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kayu Putih  | PK              | 1.085.277.884   | 1.085.277.777    | CV. Perdana Niaga           | Jalan Pulau Irian Gg. Anggur No. 5 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali                          | 802.742.408,12          | 282.535.476         | Sudah Selesai | APBD (DAK) |
|    |             | 17         | Pemuktahiran Sistem Informasi/ Data Base Jaringan Irigasi di Kabupaten Buleleng                  | JK              | 130.000.000     | 129.932.440,00   | CV. Yogawidya Sarana Desain | Jalan Nagasari No. 3x, Kel. Penatih Dangin Puri, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar            | 99.976.360              | 30.023.640          | Sudah Selesai | APBD       |
|    |             | 18         | Peningkatan Jalan Celukan Bawang - Pelabuhan   | PK              | 3.905.000.000   | 3.904.997.783,65 | PT. BERAWANTANGI            | JL. PADANG MEKAR NO. 3X - Denpasar (Kota) - Bali   | 3.008.864.744,74        | 896.135.255         | Sudah Selesai | APBD (DAK) |
|    |             | 19         | Peningkatan Jalan Lebah Siung Pancoran   | PK              | 4.725.000.000   | 4.724.994.442    | PT.DHARMA BUANA KARYA       | JALAN A.YANI AMLAPURA - Karang Asem (Kab.) - Bali  | 3.754.132.249,94        | 970.867.750         | Sudah Selesai | APBD (DAK) |
|    |             | 20         | Peningkatan Jalan Pulau Komodo   | PK              | 5.544.000.000   | 5.543.999.214,2  | PT.DHARMA BUANA KARYA       | JALAN A.YANI AMLAPURA - Karang Asem (Kab.) - Bali  | 4.280.895.938,62        | 1.263.104.061       | Sudah Selesai | APBD (DAK) |
|    |             | 21         | Peningkatan Jalan SP3. Tigawasa - Uma Sendi - Bingin Banjah                                      | PK              | 8.750.000.000   | 8.749.999.192,15 | PT. DUARA BALI              | Jl. Bung tomo A.3 Denpasar - Denpasar (Kota) - Bali  | 6.835.332.554,92        | 1.914.667.445       | Sudah Selesai | APBD (DAK) |
|    |             | 22         | Pembangunan Jembatan Pangkung Dalem Ruas Jalan SP3. Gitgit - Wanagiri                            | PK              | 8.956.500.000   | 8.956.496.181,88 | PT.ADI MURTI                | Jalan Plawa No. 37 Denpasar Bali   | 6.810.504.951,37        | 2.145.995.049       | Sudah Selesai | APBD (DAK) |
|    |             | 23         | Penggantian Jembatan Tukad Buleleng Ruas Jalan Bakung - Sari Mekar - Padang Bulia                | PK              | 6.806.668.000   | 6.806.664.729,67 | BIMA AGUNG                  | Jl. Bima I / 1B Semarang - Semarang (Kota) - Jawa Tengah                                       | 5.055.347.178,98        | 1.751.320.821       | Sudah Selesai | APBD (DAK) |
|    |             | 24         | Pembangunan Jembatan Tukad Daya Ruas Jalan SP3. JN. Tikungan Bungkulan - Jembatan                | PK              | 3.232.383.000   | 3.232.364.539,97 | PT. TRI ASA CITRA ABADI     | Jl. Raya Sading No. 25 A, Lingk. Karang Suwung, Sading, Mengwi - Badung - Badung (Kab.) - Bali | 2.362.287.065,85        | 870.095.934         | Sudah Selesai | APBD (DAK) |
|    |             | 25         | Pengawasan/Supervisi Pembangunan SPAM Air Sanih  | JK              | 250.000.000     | 249.819.900      | PT. KENCANA ADHI KARMA      | JL. BATUSARI NOMOR 15 DENPASAR - Denpasar (Kota) - Bali  | 173.723.000             | 76.277.000          | Sudah Selesai | APBD       |
|    |             | 26         | Pembangunan SPAM Air Sanih   | PK              | 14.720.372.100  | 14.748.108.893   | PT.Karya Dewata Sarwa Indah | Jalan Kargo Pasar No. 18 Denpasar - Denpasar (Kota) - Bali                                     | 10.312.086.773,91       | 4.408.285.326       | Sudah Selesai | APBD       |
|    |             | 27         | Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Sanda   | PK              | 755.756.261     | 755.756.260,68   | CV Graha Palimanan          | jln.Gunung Rinjani Blok IIA No. 4 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali                           |                         | 755.756.261         | Dalam Proses  | APBD       |
|    |             | 28         | Pengadaan Air Baku Desa Banyupoh   | PK              | 2.364.000.000   | 2.363.887.288,15 | CV. Lissjaya Utama          | Griya Panji Asri Blok P/5 Panji- Singaraja - Buleleng - Buleleng (Kab.) - Bali                 |                         | 2.364.000.000       | Dalam Proses  | APBD       |
|    |             | 29         | Pembangunan Gedung Rawat Jalan, Gedung Rawat Inap dan Bangunan Penunjang RSUD Kabupaten Buleleng | PK              | 100.000.000.000 |                  |                             |  |                         | 100.000.000.000     | Belum Proses  | APBD       |
|    |             | 30         | Rehabilitasi Gedung dan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Buleleng                                    | PK              | 1.290.000.000   | 1.289.855.694    | PT. JAYA GRAHA UTAMA        | Jl. Siulan No.237 Penatih Dangin Puri, Denpasar - Denpasar (Kota) - Bali                       | 1.002.259.525,45        | 287.740.475         | Sudah Selesai | APBD       |

| NO | NAMA SATKER        | NAMA PAKET       | JENIS PENGADAAN   | PAGU | HPS                    | Nama Pemenang         | Alamat                | Nilai Hasil Tender(Rp.)   | Sisa Anggaran (Rp.)   | PROSES/BLELUM          | KET           |            |
|----|--------------------|------------------|---|------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|------------------------|---------------|------------|
| 1  | 2                  | 3                | 4   | 5    | 6                      | 7                     | 8                     | 9   | 10                    | 11                     | 12            |            |
|    |                    | 31               | Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Bebetin - Sekumpul  | PK   | 655.704.000            | 655.683.249,53        | CV. Lissjaya Utama    | Griya Panji Asri Blok P/5 Panji- Singaraja - Buleleng - Buleleng (Kab.) - Bali                                  | 457.103.036,95        | 198.600.963            | Sudah Selesai | APBD       |
|    |                    | 32               | Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Sekumpul – Lemukih  | PK   | 364.608.000            | 364.601.516,97        | cv.inersia            | BR. SEMANA, SINGAKERTA, UBUD, GIANYAR - Badung (Kab.) - Bali  | 246.465.334,12        | 118.142.666            | Sudah Selesai | APBD       |
|    |                    | 33               | Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Sp3. Munduk - Munduk - Dusun Tamblingan   | PK   | 276.318.000            | 276.296.314,79        | CV. KRISNA PUTRA BALI | Wisma Arya Lantai I Blok 2, Jalan Pulau Irian No.36 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali                          | 194.900.000,00        | 81.418.000             | Sudah Selesai | APBD       |
|    |                    | 34               | Rehabilitasi Jalan Asah Munduk- Pura Gubug  | PK   | 2.500.870.500          |                       |                       |   |                       | 2.500.870.500          | Dalam Proses  | APBD       |
|    |                    | 35               | Rehabilitasi Jalan Kayu Putih - Banyuatis   | PK   | 1.510.187.500          |                       |                       |   |                       | 1.510.187.500          | Dalam Proses  | APBD       |
|    |                    | 36               | Pendampingan Pemenuhan Persyaratan dan Pembahasan untuk Persetujuan Substansi Perda RTRW Kabupaten                    | JK   | 284.900.000            | 284.899.998,90        | CV. TRI MATRA DISAIN  | Jalan Subur Gg. Mirah Cempaka II No. 17 Denpasar/Jln. Gatsu I/VII No. 3B Lt.I Denpasar - Denpasar (Kota) - Bali | 264.154.000           | 20.746.000             | Sudah Selesai | APBD       |
|    |                    | 37               | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Padang Keling  | PK   | 1.999.892.031          | 1.999.892.031         | CV. Sandi Yudha       | Jl. Yudistira No.10 kendran - Buleleng (Kab.) - Bali  | 1.564.907.124,48      | 434.984.907            | Sudah Selesai | APBD (DAK) |
|    |                    | 38               | Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Rawat Jalan, Gedung Rawat Inap dan Bangunan Penunjang RSUD Kabupaten Buleleng | JK   | 2.500.000.000          |                       |                       |   |                       | 2.500.000.000          | Belum Proses  | APBD       |
|    |                    | <b>JUMLAH 8</b>  |   |      | <b>186.024.865.361</b> | <b>79.535.168.369</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>  | <b>56.611.829.192</b> | <b>129.413.036.168</b> |               |            |
| 9  | KECAMATAN BULELENG | 1                | Belanja Natura dan Pakan-Natura   | B    | 294.285.000            |                       |                       |   |                       | 294.285.000            | Belum Proses  | APBD       |
|    |                    | 2                | Belanja Natura dan Pakan-Natura   | B    | 208.917.700            |                       |                       |   |                       | 208.917.700            | Belum Proses  | APBD       |
|    |                    | <b>JUMLAH 09</b> |   |      | <b>503.202.700</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>  | <b>-</b>              | <b>503.202.700</b>     |               |            |
| 10 | DINAS KESEHATAN    | 1                | BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG KANTOR.   | PK   | 4.567.500.000          |                       |                       |   |                       | 4.567.500.000          | Belum Proses  | APBD       |
|    |                    | 2                | Belanja Modal alat kedokteran umum  | B    | 449.000.400            | 442.161.667           | PT. BALI WAHYU ABADI  | Jl Gatot Subroto IID No 3 Denpasar - Denpasar (Kota) - Bali   | 438.900.000           | 10.100.400             | Sudah Selesai | APBD (DAK) |
|    |                    | 3                | Belanja Modal Alat Kesehatan umum lainnya   | B    | 1.935.000.000          | 1.691.561.829         |                       |   |                       | 1.935.000.000          | Dalam Proses  | APBD (DAK) |
|    |                    | 4                | BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN  | PK   | 327.360.000            |                       |                       |   |                       | 327.360.000            | Belum Proses  | APBD       |
|    |                    | 5                | Belanja Modal Alat Kesehatan umum lainnya   | B    | 3.897.574.000          | 3.897.573.999,95      |                       |   |                       | 3.897.574.000          | Dalam Proses  | APBD (DAK) |
|    |                    | 6                | BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR.   | B    | 519.590.390            |                       |                       |   |                       | 519.590.390            | Belum Proses  | APBD       |
|    |                    | 7                | BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA  | PK   | 536.998.000            |                       |                       |   |                       | 536.998.000            | Belum Proses  | APBD       |
|    |                    | 8                | Belanja Jasa Kalibrasi  | JL   | 241.017.000            |                       |                       |   |                       | 241.017.000            | Belum Proses  | APBD       |
|    |                    | 9                | Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium  | PK   | 3.286.295.735          |                       |                       |   |                       | 3.286.295.735          | Gagal Tender  | APBD (DAK) |
|    |                    | 10               | BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA.   | PK   | 261.525.000            |                       |                       |   |                       | 261.525.000            | Belum Proses  | APBD       |
|    |                    | 11               | BELANJA PEMELIHARAAN INSTALASI-INSTALASI AIR KOTOR-INSTALASI AIR KOTOR LAINNYA.                                       | PK   | 299.200.000            |                       |                       |   |                       | 299.200.000            | Belum Proses  | APBD       |
|    |                    | 12               | Belanja Jasa Konsultan Perencana Arsitektur- Jasa Desain Arsitektur   | JK   | 301.200.000            |                       |                       |   |                       | 301.200.000            | Gagal Tender  | APBD       |

| NO | NAMA SATKER                                      |    | NAMA PAKET  | JENIS PENGADAAN | PAGU           | HPS              | Nama Pemenang        | Alamat   | Nilai Hasil Tender(Rp.) | Sisa Anggaran (Rp.) | PROSES/BLELUM | KET        |
|----|--|----|---|-----------------|----------------|------------------|----------------------|--|-------------------------|---------------------|---------------|------------|
| 1  | 2  |    | 3   | 4               | 5              | 6                | 7                    | 8  | 9                       | 10                  | 11            | 12         |
|    |  | 13 | Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung   | JK              | 65.904.265     |                  |                      |  |                         | 65.904.265          | Belum Proses  | APBD       |
|    |  | 14 | BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN ARSITEKTUR JASA DESAIN ARSITEKTURAL.   | JK              | 465.519.600    | 421.520.000      | PT MITRA TRI SAKTI   | JL. BUANA RAYA Gg. MEGA BUANA NO. 11 A PADANG SAMBIAN DENBAR - Badung (Kab.) - Bali                  | 378.763.000             | 86.756.600          | Sudah Selesai | APBD       |
|    |  | 15 | BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REKAYASA JASA PENGAWAS PEKERJAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG.  | JK              | 293.671.980    | 252.081.500      |                      |  |                         | 293.671.980         | Dalam Proses  | APBD       |
|    |  | 16 | (1.02.02.2.02.18) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus   | B               | 650.000.000    | 649.485.000      |                      |  |                         | 650.000.000         | Dalam Proses  | APBD (DAK) |
|    |  | 17 | Belanja modal alat kedokteran Lainnya   | B               | 1.600.000.000  | 1.599.653.333,31 | PT CML METRO MEDIKA  | L. Raya Dalung No. 39B. Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Badung - Bali - Badung (Kab.) - Bali | 1.448.480.000           | 151.520.000         | Sudah Selesai | APBD (DAK) |
|    |  | 18 | BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT.  | B               | 236.300.000    |                  |                      |  |                         | 236.300.000         | Belum Proses  | APBD (DAK) |
|    | JUMLAH 10  | 18 |   |                 | 19.933.656.370 | 8.954.037.329    | -                    | -  | 2.266.143.000           | 17.667.513.370      |               |            |
| 11 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 1  | BELANJA /ALAT BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR ALAT TULIS KANTOR.  | B               | 760.407.487    | 640.690.875      | CV. Delina           | JALAN BATANGHARI NO 9A DENPASAR - Denpasar (Kota) - Bali   | 442.786.234             | 317.621.253         | Sudah Selesai | APBD       |
|    |  | 2  | PENGADAAN BAHAN KOMPUTER(TONER, TINTA, CATRIDGE)  | B               | 628.266.740    | 458.972.008      | CV ANDAR JAVAS INTI  |  | 379.335.000             | 248.931.740         | Sudah Selesai |            |
|    |  | 3  | PENGADAAN CETAK BLANGKO.  | JL              | 265.041.330    | 219.012.757      | CV. MAHA TIRTA       | JALAN GAJAH MADA NO. 79 - Buleleng (Kab.) - Bali   | 167.541.000             | 97.500.330          | Sudah Selesai | APBD       |
|    |  | 4  | PENGADAAN CETAK BUKU DAN FOTO COPY.   | JL              | 944.231.677    | 758.911.032      | UD. SUDIRMAN GRAFIKA | JL. SUDIRMAN GG.VI/ 5D, SINGARAJA, BULELENG, BALI - Buleleng (Kab.) - Bali                           | 538.119.540,20          | 406.112.137         | Sudah Selesai | APBD       |
|    | JUMLAH 11  | 4  |   |                 | 2.597.947.234  | 2.077.586.672    | 0                    | 0  | 1.527.781.774           | 1.070.165.460       |               |            |
| 12 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA            | 1  | BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN BELANJA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 CEMPAGA, DAN BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 PEDAWA | PK              | 1.236.661.200  | 1.234.077.349,93 |                      |  |                         | 1.236.661.200       | Dalam Proses  | APBD (DAK) |
|    |  | 2  | Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 1 Paket Agung, SDN 2 Anturan, SDN 3 Pegayaman   | PK              | 1.801.688.400  | 1.664.824.086,39 |                      |  |                         | 1.801.688.400       | Dalam Proses  | APBD (DAK) |
|    |  | 3  | Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 1 Bongancina, SDN 4 Tista, SDN 3 Kedis, dan SDN 3 Busungbiu   | PK              | 2.046.702.000  | 2.011.759.607,41 |                      |  |                         | 2.046.702.000       | Dalam Proses  | APBD (DAK) |
|    |  | 4  | Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 4 Sumberkima, SDN 2 Penyabangan, SDN 1 Ringdikit dan SDN 1 Pengastulan  | PK              | 1.918.095.200  | 1.881.673.480,36 |                      |  |                         | 1.918.095.200       | Dalam Proses  | APBD (DAK) |

| NO | NAMA SATKER | NAMA PAKET  | JENIS PENGADAAN | PAGU          | HPS              | Nama Pemenang | Alamat | Nilai Hasil Tender(Rp.) | Sisa Anggaran (Rp.) | PROSES/BLELUM | KET        |
|----|-------------|---|-----------------|---------------|------------------|---------------|--------|-------------------------|---------------------|---------------|------------|
| 1  | 2           | 3   | 4               | 5             | 6                | 7             | 8      | 9                       | 10                  | 11            | 12         |
|    |             | 5 Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 4 Kubutambahan, SDN 1 Sangsit dan SDN 3 Suwug   | PK              | 1.752.688.400 | 1.741.761.737,80 |               |        |                         | 1.752.688.400       | Dalam Proses  | APBD (DAK) |
|    |             | 6 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Belanja Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 3 Les, Belanja Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 3 Tembok, Belanja Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 5 Les  | PK              | 1.182.061.200 | 1.179.607.169,94 |               |        |                         | 1.182.061.200       | Dalam Proses  | APBD (DAK) |
|    |             | 7 Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas dan Pembangunan perpustakaan SDN 3 Bondalem   | PK              | 603.739.500   | 602.240.958,21   |               |        |                         | 603.739.500         | Dalam Proses  | APBD (DAK) |
|    |             | 8 BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH SDN 1 BANJAR TEGAL, PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH SDN 1 SUKASADA, PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH SDN 1 GALUNGAN, PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH SDN 2 GALUNGAN, PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH SDN 2 TEJAKULA, PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH SDN 4 BONDALAM  | PK              | 1.300.314.600 | 1.300.298.293    |               |        |                         | 1.300.314.600       | Dalam Proses  | APBD (DAK) |
|    |             | 9 BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN PEMBANGUNAN RUANG GURU SD N 4 GOBLEG DAN BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN PEMBANGUNAN RUANG GURU SD N 1 BEBETIN  | PK              | 449.556.000   | 448.822.281,37   |               |        |                         | 449.556.000         | Dalam Proses  | APBD (DAK) |
|    |             | 10 Belanja Modal Rehabilitasi ruang laboratorium IPA, Rehabilitasi ruang kelas,dan Rehabilitasi toilet (jamban) SMPN 1 Sukasada dan Rehabilitasi ruang kelas SMPN 3 Sukasada  | PK              | 1.024.502.000 | 1.010.209.082,78 |               |        |                         | 1.024.502.000       | Dalam Proses  | APBD (DAK) |
|    |             | 11 BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG KELAS SMPN SATU ATAP 3 SUKASADA, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG GURU SMP NEGERI SATU ATAP 3 SUKASADA, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI PERPUSTAKAAN SEKOLAH SMPN SATU ATAP 3 SUKASADA, DAN BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI TOILET/JAMBAN SMPN SATU ATAP 3 SUKASADA | PK              | 1.001.000.000 | 981.693.193,45   |               |        |                         | 1.001.000.000       | Dalam Proses  | APBD (DAK) |
|    |             | 12 Belanja Modal Rehabilitasi ruang guru, Rehabilitasi ruang kelas dan Rehabilitasi ruang UKS SMPN 1 Banjar dan Rehabilitasi ruang laboratorium komputer SMPN 2 Busungbiu   | PK              | 1.216.871.600 | 1.199.646.322,74 |               |        |                         | 1.216.871.600       | Dalam Proses  | APBD (DAK) |

| NO | NAMA SATKER | NAMA PAKET |  | JENIS PENGADAAN | PAGU          | HPS              | Nama Pemenang | Alamat | Nilai Hasil Tender(Rp.) | Sisa Anggaran (Rp.) | PROSES/BLELUM | KET        |
|----|-------------|------------|--|-----------------|---------------|------------------|---------------|--------|-------------------------|---------------------|---------------|------------|
| 1  | 2           | 3          | 4  | 5               | 6             | 7                | 8             | 9      | 10                      | 11                  | 12            |            |
|    |             | 13         | Belanja Modal Rehabilitasi ruang kelas, Rehabilitasi toilet (jamban) SMPN 1 Kubutambahan dan Rehabilitasi ruang kelas, Rehabilitasi toilet (jamban), Rehabilitasi ruang UKS SMPN 1 Sawan serta Rehabilitasi ruang kelas SMPN 4 Sawan   | PK              | 2.175.331.400 | 2.121.585.724,20 |               |        |                         | 2.175.331.400       | Dalam Proses  | APBD (DAK) |
|    |             | 14         | Belanja Modal Rehabilitasi ruang kelas SMPN 1 Seririt dan Rehabilitasi ruang kelas, Rehabilitasi toilet (jamban) dan Rehabilitasi ruang laboratorium IPA serta Rehabilitasi ruang perpustakaan SMPN 4 Gerokgak   | PK              | 2.095.579.000 | 2.036.555.721,77 |               |        |                         | 2.095.579.000       | Dalam Proses  | APBD (DAK) |
|    |             | 15         | Belanja Modal Rehabilitasi ruang kelas, Rehabilitasi toilet (jamban) SMPN 2 Singaraja dan Rehabilitasi ruang kelas SMPN 3 Singaraja dan Rehabilitasi ruang laboratorium komputer, Rehabilitasi ruang guru SMPN 6 Singaraja   | PK              | 2.088.711.000 | 2.016.372.567    |               |        |                         | 2.088.711.000       | Dalam Proses  | APBD (DAK) |
|    |             | 16         | BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG KELAS SMPN 5 SINGARAJA, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG GURU SMP NEGERI 5 SINGARAJA, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG KELAS SMPN 7 SINGARAJA, DAN BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI LABORATORIUM IPA SMPN 7 SINGARAJA   | PK              | 1.552.819.000 | 1.516.178.980,42 |               |        |                         | 1.552.819.000       | Dalam Proses  | APBD (DAK) |
|    |             | 17         | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rehabilitasi ruang kelas, Rehabilitasi Ruang Guru dan Kepala Sekolah, Pembangunan area bermain TK Negeri Pembina Singaraja, dan Rehabilitasi ruang kelas TK N Pembina Kec. Sukasada  | PK              | 649.162.000   | 625.548.857,88   |               |        |                         | 649.162.000         | Dalam Proses  | APBD (DAK) |
|    |             | 18         | BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG KELAS TK NEGERI PEMBINA KEC. GEROKGAK, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG GURU DAN KEPALA SEKOLAH TK NEGERI PEMBINA KEC. GEROKGAK, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN PEMBANGUNAN AREA BERMAIN TK N DESA PANGKUNGPAPUK, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG KELAS TK N DESA PANGKUNGPAPUK, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG KELAS TK NEGERI DESA MUNDUK BESTALA | PK              | 1.032.371.750 | 1.019.196.998,34 |               |        |                         | 1.032.371.750       | Dalam Proses  | APBD (DAK) |

| NO | NAMA SATKER   | NAMA PAKET |   | JENIS PENGADAAN | PAGU                   | HPS                    | Nama Pemenang                                      | Alamat   | Nilai Hasil Tender(Rp.) | Sisa Anggaran (Rp.)    | PROSES/BLELUM | KET        |
|----|---|------------|---|-----------------|------------------------|------------------------|--|--|-------------------------|------------------------|---------------|------------|
| 1  | 2   | 3          | 4   | 5               | 6                      | 7                      | 8  | 9  | 10                      | 11                     | 12            |            |
|    |   | 19         | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rehabilitasi ruang kelas TK Negeri Desa Banjar dan Rehabilitasi ruang kelas, Rehabilitasi Ruang Guru dan Kepala Sekolah TK N Desa Pedawa dan Pembangunan area bermain TK N Pembina Kec. Banjar  | PK              | 813.941.000            | 801.509.564,09         |  |  |                         | 813.941.000            | Dalam Proses  | APBD (DAK) |
|    |   | 20         | BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG KELAS TKN DESA BONTIHING, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG KELAS TKN DESA TAMBAKAN, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI TOILET (JAMBAN) TKN DESA TAMBAKAN | PK              | 575.566.300            | 546.215.240,47         |  |  |                         | 575.566.300            | Dalam Proses  | APBD (DAK) |
|    |   | 21         | Pengadaan Media Pendidikan SMP  | B               | 393.600.000            |                        |  |  |                         | 393.600.000            | Batal         | APBD (DAK) |
|    |   | 22         | Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi (TIK) SMP   | B               | 240.250.000            |                        |  |  |                         | 240.250.000            | Batal         | APBD (DAK) |
|    |   | 23         | Pengadaan Media Pendidikan SD   | B               | 516.600.000            |                        |  |  |                         | 516.600.000            | Batal         | APBD (DAK) |
|    |   | 24         | Kain Seragam Merah Putih dan Kain Seragam   | B               | 700.150.000            |                        |  |  |                         |                        | Belum Proses  |            |
|    | <b>JUMLAH 12</b>  | <b>24</b>  |   |                 | <b>28.367.961.550</b>  | <b>25.939.777.218</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>                | <b>27.667.811.550</b>  |               |            |
| 13 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 1          | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | B               | 300.000.000            | 299.761.200            | CV. Serba Lancar Abadi                             | Jl. WR. Supratman No. 412, Penarukan Buleleng, Bali - Buleleng (Kab.) - Bali                             | 297.146.500             | 2.853.500              | Sudah Selesai | APBD (DAK) |
|    | <b>JUMLAH 13</b>  | <b>1</b>   |   |                 | <b>300.000.000</b>     | <b>299.761.200</b>     | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>297.146.500</b>      | <b>2.853.500</b>       |               |            |
| 14 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                      | 1          | Belanja Akomodasi Pelatihan Dasar CPNS  | JL              | 1.270.080.000          | 1.270.080.000          | PT MADE BALI (HOTEL MADE BALI), PT NUSA INDAH BALI | JL RAYA SEMPIDI NO 41 BADUNG 80351 BALI INDONESIA, JL WARIBANG NO 99 KESIMAN PETILAN DENPASAR TIMUR BALI | 1.179.360.000           | 90.720.000             | Sudah Selesai | APBD       |
|    | <b>JUMLAH 14</b>  | <b>1</b>   |   |                 | <b>1.270.080.000</b>   | <b>1.270.080.000</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>1.179.360.000</b>    | <b>90.720.000</b>      |               |            |
| 15 | DINAS PERTANIAN   | 1          | Belanja Barang Untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID 19   | B               | 307.500.000            | 307.264.500            |  |  |                         | 307.500.000            | Dalam Proses  | APBN       |
|    | <b>JUMLAH 15</b>  | <b>1</b>   |   |                 | <b>307.500.000</b>     | <b>307.264.500</b>     | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>                | <b>307.500.000</b>     |               |            |
|    |   |            | <b>TOTAL</b>  |                 | <b>262.210.240.927</b> | <b>138.657.682.301</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>80.571.329.797</b>   | <b>180.938.761.129</b> |               |            |

## MONITORING KONTRAK 2021

| NO | NAMA SATKER                         | NAMA PAKET   | PENYEDIA/ALAMAT   | NILAI KONTRAK  | SUMBER DANA | NO. KONTRAK                         | TANGGAL MULAI PELAKSANAAN | JANGKA WAKTU PELAKSANAAN | PROGRES FISIK | REALISASI KEUANGAN |
|----|-------------------------------------|--|---|----------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|--------------------|
| 1  | 2                                   | 3  | 4   | 5              | 6           | 7                                   | 8                         | 9                        | 10            | 11                 |
| 1  | SEKRETARIAT DAERAH                  | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermontor Perorangan   | PT Agung Automall JALAN CUT MUTIAH NO 14 MENTENG JAKARTA PUSAT 10330 - Jakarta Pusat (Kota) - DKI Jakarta | 404.600.000    | APBD        | 027/24/III/PPK/2021 (30 MARET 2021) | 27-Apr-21                 | 30 hari                  | 100%          | 100%               |
| 2  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP              | Belanja jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawasan Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung      | PT. KENCANA ADHI KARMA JL. BATUSARI NOMOR 15 DENPASAR - Denpasar (Kota) - Bali                            | 409.041.600    | APBD        | 600/05/PA-DLH/2021                  | 11-Mei-21                 | 210 hari kalender        | 0,0174%       | 0                  |
| 3  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP              | Belanja Modal Taman (Pembangunan RTH Taman Bung Karno Tahap IV   | PT. SANUR JAYA UTAMA Jalan Setia Budi, Kuta - Badung - Badung (Kab.) - Bali                               | 15.027.351.458 | APBD        | 600/07/PA-DLH/2021                  | 11-Mei-21                 | 210 hari kalender        | 0,0174%       | 0                  |
| 4  | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH             | BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - ALAT TULIS KANTOR.  | UD TRESNA JAYA Jalan Ahmad Yani No.5 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali                                   | 236.935.530    | APBD        | 027/738.11/2021 (18 maret 2021)     | 18-Mar-21                 | 275 hari kalender        | 31,60%        | 26,39%             |
| 5  | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH             | BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA.   | UD TRESNA JAYA Jalan Ahmad Yani No.5 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali                                   | 265.402.609    | APBD        | 027/1074.3/2021 (28 april 2021)     | 28-Apr-21                 | 243 hari kalender        | 40%           | 15,23%             |
| 6  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Supervisi Konstruksi Pembangunan Jembatan Pangkung Dalem Ruas Jalan SP3. Gitgit - Wanagiri             | PT. KENCANA ADHI KARMA JL. BATUSARI NOMOR 15 DENPASAR - Denpasar (Kota) - Bali                            | 230.814.650    | APBD        | 620/2507.12/IV/2021 (19 april 2021) | 18-Mei-21                 | 210 hari kalender        | 0             | 0                  |
| 7  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Supervisi Konstruksi Penggantian Jembatan Tukad Buleleng Ruas Jalan Bakung - Sari Mekar - Padang Bulia | PT. KENCANA ADHI KARMA JL. BATUSARI NOMOR 15 DENPASAR - Denpasar (Kota) - Bali                            | 178.195.000    | APBD        | 620/2502/IV/2021 (19-04-2021)       | 19-Mei-21                 | 180 hari kalender        | 0             | 0                  |
| 8  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Supervisi Konstruksi Peningkatan Jalan SP3. Tigawasa - Uma Sendi - Bingin Banjah                       | PT MITRA TRI SAKTI JL. BUANA RAYA Gg. MEGA BUANA NO. 11 A PADANG SAMBIAN DENBAR - Badung (Kab.) - Bali    | 102.286.800    | APBD        | 620/1891/III/2021 (24 maret 2021)   | 30-Mar-21                 | 150 hari kalender        | 14,36%        | 0                  |



| NO | NAMA SATKER                         | NAMA PAKET   | PENYEDIA/ALAMAT  | NILAI KONTRAK | SUMBER DANA | NO. KONTRAK                       | TANGGAL MULAI PELAKSANAAN | JANGKA WAKTU PELAKSANAAN | PROGRES FISIK | REALISASI KEUANGAN |
|----|-------------------------------------|--|--|---------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|--------------------|
| 1  | 2                                   | 3  | 4  | 5             | 6           | 7                                 | 8                         | 9                        | 10            | 11                 |
| 9  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Supervisi Konstruksi Pembangunan Jembatan Tukad Daya Ruas Jalan SP3. JN. Tikungan Bungkulan - Jembatan | PT MITRA TRI SAKTI JL. BUANA RAYA Gg. MEGA BUANA NO. 11 A PADANG SAMBIAN DENBAR - Badung (Kab.) - Bali                     | 148.365.800   | APBD        | 620/2504/IV/2021 (19 april 2021)  | 19/04/2021                | 150 hari kalender        |               |                    |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Peningkatan SPAM Perdesaan Desa Kayu Putih   | CV. PUTRA BALI TIMUR Jalan Sakura I Kelurahan Semarapura Klod Klungkung - Klungkung (Kab.) - Bali                          | 658.100.000   | APBD (DAK)  | 690/2649/IV/2021                  | 27/04/2021                | 150 hari kalender        | 10%           | 0                  |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Peningkatan SPAM Perdesaan Desa Panji Anom   | CV. ATMA KARYA JALAN KARGO PASAR NO. 14 DENPASAR - Denpasar (Kota) - Bali  | 1.111.888.258 | APBD (DAK)  | 690/2512/IV/2021                  | 20/04/2021                | 150 hari kalender        | 20%           | 0                  |
| 12 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Peningkatan SPAM Perdesaan Desa Tegallinggah   | CV. PAYU JAYA SEJAHTERA JALAN TUKAD BALIAN NO. 117 Z RENON, DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR, BALI - Denpasar (Kota) - Bali | 889.845.700   | APBD (DAK)  | 690/2684/IV/2021                  | 28/04/2021                | 150 hari kalender        | 10%           | 0                  |
| 13 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Peningkatan SPAM Perdesaan Desa Tigawasa   | CV. ADI YASA JALAN PULAU IRIAN DSN. KAJANAN DESA PENGLATAN - BULELENG - Buleleng (Kab.) - Bali                             | 1.206.549.631 | APBD (DAK)  | 690/2618/IV/2021                  | 26/04/2021                | 150 hari kalender        | 15%           | 0                  |
| 14 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Peningkatan SPAM Perdesaan Desa Wanagiri   | CV. Kuarsa Teknik Perum Nuansa Asri Pesona Blok A/10, Desa Bongan Tabanan - Tabanan (Kab.) - Bali                          | 923.630.000   | APBD (DAK)  | 690/2615/IV/2021                  | 26/04/2021                | 150 hari kalender        | 10%           | 0                  |
| 15 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Pengawasan/Supervisi Rehabilitasi Jaringan Irigasi   | CV. TRI MATRA DISAIN Jalan Subur Gg. Mirah Cempaka II No. 17 Denpasar/Jln. Gatsu I/II No. 3B Lt.I Denpasar                 | 225.060.000   | APBD (DAK)  | 611/3302/IV/2021 (19 mei 2021)    | 19-Mei-21                 | 150 hari kalender        | 8%            | 0                  |
| 16 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Pemuktahiran Sistem Informasi/ Data Base Jaringan Irigasi di Kabupaten Buleleng                        | CV. Yogawidya Sarana Desain Jalan Nagasari No. 3x, Kel. Penatih Dangin Puri, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar            | 99.976.360    | APBD        | 611/3263/IV/2021 (18 mei 2021)    | 18-Mei-21                 | 60 hari kalender         | 22,00%        | 0                  |
| 17 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Peningkatan Jalan Celukan Bawang - Pelabuhan   | PT. BERAWANTANGI JL. PADANG MEKAR NO. 3X - Denpasar (Kota) - Bali  | 3.008.864.745 | APBD (DAK)  | 620/1840/III/2021 (18 maret 2021) | 30-Mar-21                 | 120 hari kalender        | 22,652        | 20%                |

| NO | NAMA SATKER                         | NAMA PAKET   | PENYEDIA/ALAMAT  | NILAI KONTRAK | SUMBER DANA | NO. KONTRAK                       | TANGGAL MULAI PELAKSANAAN | JANGKA WAKTU PELAKSANAAN | PROGRES FISIK | REALISASI KEUANGAN |
|----|-------------------------------------|--|--|---------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|--------------------|
| 1  | 2                                   | 3  | 4  | 5             | 6           | 7                                 | 8                         | 9                        | 10            | 11                 |
| 18 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Peningkatan Jalan Lebah Siung Pancoran   | PT.DHARMA BUANA KARYA JALAN A.YANI AMLAPURA - Karang Asem (Kab.) - Bali  | 3.754.132.250 | APBD (DAK)  | 620/1843/III/2021 (18 maret 2021) | 30-Mar-21                 | 120 hari kalender        | 55,466        | 20%                |
| 19 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Peningkatan Jalan Pulau Komodo   | PT.DHARMA BUANA KARYA JALAN A.YANI AMLAPURA - Karang Asem (Kab.) - Bali  | 4.280.895.939 | APBD (DAK)  | 620/1842/III/2021 (18 maret 2021) | 30-Mar-21                 | 120 hari kalender        | 60,676        | 3,02%              |
| 20 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Peningkatan Jalan SP3. Tigawasa - Uma Sendi - Bingin Banjar  | PT. DUARA BALI Jl. Bung tomo A.3 Denpasar - Denpasar (Kota) - Bali   | 6.835.332.555 | APBD (DAK)  | 620/1841/III/2021 (18 maret 2021) | 30-Mar-21                 | 150 hari kalender        | 37,46         | 17,24%             |
| 21 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Pembangunan Jembatan Pangkung Dalem Ruas Jalan SP3. Gitgit - Wanagiri                              | PT.ADI MURTI Jalan Plawa No. 37 Denpasar Bali  | 6.810.504.951 | APBD (DAK)  | 620/3252/V/2021 (18 mei 2021)     | 18-Mei-21                 | 210 hari kalender        | 0             | 0                  |
| 22 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Penggantian Jembatan Tukad Buleleng Ruas Jalan Bakung - Sari Mekar - Padang Bulia                  | BIMA AGUNG Jl. Bima I / 1B Semarang - Semarang (Kota) - Jawa Tengah  | 5.055.347.179 | APBD (DAK)  | 620/3253/V/2021 (18 mei 2021)     | 19-Mei-21                 | 180 hari kalender        | 1,35%         | 0                  |
| 23 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Pendampingan Pemenuhan Persyaratan dan Pembahasan untuk Persetujuan Substansi Perda RTRW Kabupaten | CV. TRI MATRA DISAIN Jalan Subur Gg. Mirah Cempaka II No. 17 Denpasar/Jln. Gatsu I/VII No. 3B Lt.I Denpasar - Denpasar (Kota) - Bali | 264.154.000   | APBD        | 640/3070/V/2021 (6 MEI 2021)      | 06-Mei-21                 | 120 hari kalender        | 0             | 0                  |
| 24 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tabang  | CV. PUTRA BALE GEDE Jalan Untung Surapati Kel. Padangkerta - Amlapura - Karang Asem (Kab.) - Bali                                    | 1.403.216.387 | APBD        | 611/3300/V/2021 (19 mei 2021)     | 19-Mei-21                 | 150 hari kalender        | 0,10%         | 0                  |
| 25 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jembong   | PT General Technics Jl. Pantai Baru, Banjar Dinas Dharma Yasa, Tukadmungga, Buleleng - Buleleng (Kab.) - Bali                        | 969.756.732   | APBD        | 611/3292/V/2021 (19 mei 2021)     | 19-Mei-21                 | 150 hari kalender        | 0,10%         | 0                  |
| 26 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kayu Putih  | CV. Perdana Niaga Jalan Pulau Irian Gg. Anggur No. 5 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali  | 802.742.408   | APBD        | 611/3298/V/2021 (19 mei 2021)     | 19-Mei-21                 | 150 hari kalender        | 0,10%         | 0                  |
| 27 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lanyahan Petandakan   | CV. Perdana Niaga Jalan Pulau Irian Gg. Anggur No. 5 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali  | 1.338.437.987 | APBD        | 611/3296/V/2021 (19 mei 2021)     | 19-Mei-21                 | 150 hari kalender        | 0,10%         | 0                  |

| NO | NAMA SATKER                                      | NAMA PAKET   | PENYEDIA/ALAMAT  | NILAI KONTRAK | SUMBER DANA | NO. KONTRAK                                       | TANGGAL MULAI PELAKSANAAN | JANGKA WAKTU PELAKSANAAN | PROGRES FISIK | REALISASI KEUANGAN |
|----|--|--|--|---------------|-------------|---|---------------------------|--------------------------|---------------|--------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5             | 6           | 7   | 8                         | 9                        | 10            | 11                 |
| 28 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG              | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Padang Keling   | CV. Sandi Yudha Jl. Yudistira No.10 kendran - Buleleng (Kab.) - Bali                                   | 1.564.907.124 | APBD        | 611/3294/V/2021 (19 mei 2021)                     | 19-Mei-21                 | 150 hari kalender        | 0,10%         | 0                  |
| 29 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG              | Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Bebetin - Sekumpul   | CV. Lissjaya Utama Griya Panji Asri Blok P/5 Panji- Singaraja - Buleleng - Buleleng cv.inersia BR.     | 457.103.037   | APBD        | 620/3306/V/2021                                   | 19-Mei-21                 | 120 hari kalender        | 6,220%        | 0                  |
| 30 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG              | Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Sekumpul – Lemukih   | SEMANA, SINGAKERTA, UBUD, GIANJAR - Badung CV. KRISNA PUTRA  | 246.465.334   | APBD        | 620/3310/V/2021                                   | 19-Mei-21                 | 120 hari kalender        | 27,202%       | 0                  |
| 31 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG              | Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Sp3. Munduk - Munduk - Dusun Tamblingan  | BALI Wisma Arya Lantai I Blok 2, Jalan Pulau Irian No.36   | 194.900.000   | APBD        | 620/3314/V/2021                                   | 19-Mei-21                 | 120 hari kalender        | 39,489%       | 0                  |
| 32 | DINAS KESEHATAN                                  | BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN ARSITEKTUR JASA DESAIN ARSITEKTURAL.  | PT MITRA TRI SAKTI JL. BUANA RAYA Gg. MEGA BUANA NO. 11 A PADANG SAMBIAN DENBAR - Badung (Kab.) - Bali | 378.763.000   | APBD        | 027/279/V/2021                                    | 03-Mei-21                 | 60 hari kalender         | 10%           | 0                  |
| 33 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | BELANJA /ALAT BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR ALAT TULIS KANTOR.   | CV. Delina JALAN BATANGHARI NO 9A DENPASAR - Denpasar (Kota) - Bali                                    | 442.786.234   | APBD        | 027/05/II/PPK-BPKPD/2021 027/06/II/PPK-BPKPD/2021 | 25/02/021                 | 300 hari                 | 43,34%        | 10,49%             |
| 34 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | PENGADAAN CETAK BLANGKO.   | CV. MAHA TIRTA JALAN GAJAH MADA NO. 79 - Buleleng (Kab.) - Bali  | 167.541.000   | APBD        | 027/10/IV/PPK-BKPD/2021                           | 20/04/2021                | 255 hari kalender        | 13,22%        | 0                  |
| 35 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | PENGADAAN CETAK BUKU DAN FOTO COPY.  | UD. SUDIRMAN GRAFIKA JL. SUDIRMAN GG.VI/ 5D, SINGARAJA, BULELENG, BALI - Buleleng (Kab.) - Bali        | 538.119.540   | APBD        | 027/14/IV/PPK-BKPD/2021 027/16/IV/PPK-BPKPD/2021  | 20/04/2021                | 253 hari kalender        | 7,20%         | 0                  |
| 36 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN             | Rehabilitasi Bangunan Panti Benih/ Bangsal Hatchery dan Rehabilitasi kolam atau bak pemijahan/induk/ calon induk/ larva/tandon | CV. UCINDO KARYA MANDIRI Perumahan Mustika Laksmi Gg 4 No. 6 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali        | 232.869.921   | APBN        | 027/1235/V/PPK/DKPP/2021                          | 31/05/2021                | 90 HARI KALENDER         | 25,00%        | 0                  |

| NO | NAMA SATKER  | NAMA PAKET  | PENYEDIA/ALAMAT   | NILAI KONTRAK | SUMBER DANA | NO. KONTRAK                             | TANGGAL MULAI PELAKSANAAN  | JANGKA WAKTU PELAKSANAAN                  | PROGRES FISIK | REALISASI KEUANGAN |
|----|--|---|---|---------------|-------------|---|--|---|---------------|--------------------|
| 1  | 2  | 3   | 4   | 5             | 6           | 7                                       | 8  | 9   | 10            | 11                 |
| 37 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Akomodasi Pelatihan Dasar CPNS                        | PT MADE BALI (HOTEL MADE BALI), PT NUSA INDAH BALI (JL RAYA SEMPIDI NO 41 BADUNG 80351 BALI INDONESIA, JL WARIBANG NO 99 KESIMAN PETILAN DENPASAR TIMUR BALI) | 1.179.360.000 | APBD        | 027/31.2/V/PPK/BKPSDM/2021 (31/05/2021) | gelombang I : on campus 1 tanggal 16 juli 2021 s/d 6 agustus 2021 dan campus II dari tgl 22 september s/d 24 september 2021<br>Gelombang II : on campus tgl 2 agustus 2021 s/d 25 agustus 2021 dan on campus II dr tgl 4 oktober 2021 s/d 6 oktober 2021<br>Gelombang III: on campus I tgl 12 agustus 2021 s/d 4 september 2021 dan on campus II dr tgl 11 oktober s/d 13 oktober 2021 | 21 hari kerja/ on campus setiap gelombang | 0,00%         | 0                  |
|    |  |   |   |               |             | 027/31.3/v/ppk/bkpsdm/2021 (31/05/2021) | gelombang IV : on campus I tgl 19 agustus 2021 s/d 10 september 2021 dan on campus II dr tgl 25 oktober s/d 27 oktober 2021  | 21 hari kerja/ on campus setiap gelombang | 0,00%         | 0                  |
| 38 | DINAS PARIWISATA                                       | Pembuatan Tempat Parkir Barat Di DTW Pantai Lovina            | CV ARYA DEWATA UTAMA Wisma Arya Lanta I Blok 1, Jalan Pulau Irian No. 36 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali   | 202.700.000   | APBD        | 556/24/VI/2021 (11 juni 2021)           | 11/06/2021   | 90 HARI KALENDER                          | 1,35%         | 0                  |
| 39 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG                    | Rehabilitasi Gedung dan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Buleleng | PT. JAYA GRAHA UTAMA Jl. Siulan No.237 Penatih Dangin Puri, Denpasar - Denpasar (Kota) - Bali   | 1.002.259.525 | APBD        | 640/4154/VI/2021 (21 juni 2021)         | 21/06/2021   | 180 hari kalender                         | 0,00%         | 0                  |

| NO | NAMA SATKER                         | NAMA PAKET  | PENYEDIA/ALAMAT   | NILAI KONTRAK | SUMBER DANA | NO. KONTRAK | TANGGAL MULAI PELAKSANAAN | JANGKA WAKTU PELAKSANAAN | PROGRES FISIK | REALISASI KEUANGAN |
|----|-------------------------------------|---|---|---------------|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------|---------------|--------------------|
| 1  | 2                                   | 3   | 4   | 5             | 6           | 7           | 8                         | 9                        | 10            | 11                 |
| 40 | DINAS PARIWISATA                    | Pembangunan Plaza/Pusat Jajanan Kuliner Di DTW Air Sanih Desa Bukti               | CV. KRISNA PUTRA BALI<br>Wisma Arya Lantai I Blok 2,<br>Jalan Pulau Irian No.36<br>Singaraja - Buleleng (Kab.)<br>- Bali              | 228.002.337   | APBD        |             |                           |                          |               |                    |
| 41 | DINAS PARIWISATA                    | Pembuatan Tempat Parkir Barat Di DTW Eks. Pelabuhan Buleleng                      | CV. Lissjaya Utama Griya<br>Panji Asri Blok P/5 Panji-<br>Singaraja - Buleleng -<br>Buleleng (Kab.) - Bali                            | 484.875.237   | APBD        |             |                           |                          |               |                    |
| 42 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Pembangunan Jembatan Tukad Daya Ruas Jalan SP3. JN. Tikungan Bungkulan - Jembatan | PT. TRI ASA CITRA<br>ABADI Jl. Raya Sading<br>No. 25 A, Lingk. Karang<br>Suwung, Sading, Mengwi -<br>Badung - Badung (Kab.) -<br>Bali | 2.362.287.066 | APBD        |             |                           |                          |               |                    |

| NO | NAMA SATKER                                      | NAMA PAKET   | PENYEDIA/ALAMAT  | NILAI KONTRAK | SUMBER DANA | NO. KONTRAK | TANGGAL MULAI PELAKSANAAN | JANGKA WAKTU PELAKSANAAN | PROGRES FISIK | REALISASI KEUANGAN |
|----|--|--|--|---------------|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------|---------------|--------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5             | 6           | 7           | 8                         | 9                        | 10            | 11                 |
| 43 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG              | Pengawasan/Supervisi Pembangunan SPAM Air Sanih              | PT. KENCANA ADHI KARMA JL. BATUSARI NOMOR 15 DENPASAR - Denpasar (Kota) - Bali                               | 173.723.000   |             |             |                           |                          |               |                    |
| 44 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | PENGADAAN BAHAN KOMPUTER(TONER, TINTA, CARTRIDGE)            | CV ANDAR JAVAS INTI  | 379.335.000   |             |             |                           | 175 HARI KALENDER        |               |                    |
| 45 | DINAS PARIWISATA                                 | Pembangunan Plaza/Pusat Jajanan Kuliner Di DTW Pantai Lovina | CV. KRISNA PUTRA BALI Wisma Arya Lantai I Blok 2, Jalan Pulau Irian No.36 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali | 227.969.558   |             |             |                           |                          |               |                    |

| NO | NAMA SATKER   | NAMA PAKET  | PENYEDIA/ALAMAT   | NILAI KONTRAK | SUMBER DANA | NO. KONTRAK | TANGGAL MULAI PELAKSANAAN | JANGKA WAKTU PELAKSANAAN | PROGRES FISIK | REALISASI KEUANGAN |
|----|---|---|---|---------------|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------|---------------|--------------------|
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5             | 6           | 7           | 8                         | 9                        | 10            | 11                 |
| 46 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | CV. Serba Lancar<br>Abadi Jl. WR.<br>Supratman No. 412,<br>Penarukan Buleleng,<br>Bali - Buleleng (Kab.) -<br>Bali                    | 297.146.500   |             |             |                           |                          |               |                    |
| 47 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH   | BELANJA NATURA DAN PAKAN - NATURA.                  | CV KARYA SARI<br>SEDANA Banjar Dinas<br>Sari Tapak Dara<br>Kubutambahan,<br>Buleleng - Buleleng<br>(Kab.) - Bali                      | 612.113.200   |             |             |                           |                          |               |                    |
| 48 | DINAS KESEHATAN   | Belanja modal alat kedokteran Lainnya               | PT CML METRO MEDIKA JL.<br>Raya Dalung No. 39B.<br>Kelurahan Dalung, Kecamatan<br>Kuta Utara, Badung - Bali -<br>Badung (Kab.) - Bali | 1.448.480.000 |             |             |                           |                          |               |                    |

| NO | NAMA SATKER                         | NAMA PAKET                               | PENYEDIA/ALAMAT   | NILAI KONTRAK         | SUMBER DANA | NO. KONTRAK | TANGGAL MULAI PELAKSANAAN | JANGKA WAKTU PELAKSANAAN | PROGRES FISIK | REALISASI KEUANGAN |
|----|-------------------------------------|--|---|-----------------------|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------|---------------|--------------------|
| 1  | 2                                   | 3  | 4   | 5                     | 6           | 7           | 8                         | 9                        | 10            | 11                 |
| 49 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH             | BELANJA MODAL ASET TETAP DALAM RENOVASI. | CV. Dewata Karya Br. Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali | 357.207.881           |             |             |                           |                          |               |                    |
| 50 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Pembangunan SPAM Air Sanih               | PT.Karya Dewata Sarwa Indah Jalan Kargo Pasar No. 18 Denpasar - Denpasar (Kota) - Bali    | 10.312.086.774        |             |             |                           |                          |               |                    |
| 51 | DINAS KESEHATAN                     | Belanja Modal alat kedokteran umum       | PT. BALI WAHYU ABADI JI Gatot Subroto IID No 3 Denpasar - Denpasar (Kota) - Bali          | 438.900.000           |             |             |                           |                          |               |                    |
|    |                                     | <b>TOTAL</b>                             |   | <b>80.571.329.797</b> |             |             |                           |                          |               |                    |



## DOKUMENTASI KEGIATAN

1.





***Kegiatan klarifikasi dukungan pabrik paket pekerjaan Pembangunan SPAM Air Sanih bertempat di kantor dan pabrik PT Langgeng Makmur Industri pada tanggal 4 Juni 2021***

2.



***Kegiatan aanwijzing paket Pengadaan Accessories untuk 3.800 Unit Sambungan Rumah Baru, Pengadaan Pipa GI 1/2 (15 mm) Sepanjang 22.800 Meter untuk Pemasangan Sambungan Baru, Pengadaan Air Baku Desa Banyupoh, Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sanda dan Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi tanggal 7 Juni 2021***

3.



***Kegiatan pembuktian kualifikasi paket Survey Kondisi Jalan, Penguatan Database dan Survey Kondisi Jembatan pada tanggal 7 Juni 2021***

4.



***Kegiatan reviu persiapan dokumen pengadaan paket Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya/ Set Persalinan, Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya/ UKS KIT, Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya/ Set KIA dan KB, Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya/ Set Pasca Persalinan dan Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya/ Lansia KIT tanggal 7 Juni 2021***

5. k



***Kegiatan aanwijzing terhadap 17 paket dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bulelengpada tanggal 10 Juni 2021***

6.



***Rapat tindaklanjut tender DAK Fisik TA. 2021 sehubungan terbitnya Perlem LKPP 12 Tahun 2021 bersama SKPD terkait pada tanggal 11 Juni 2021***

7.



***Menghadiri rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Program Pemberantasan Korupsi Periode Triwulan II tahun 2021 yang dipimpin langsung Bupati Buleleng pada tanggal 15 Juni 2021***



8.



***Anggota Pokja Pemilihan mengikuti Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Kompetensi Ahli Muda K3 Konstruksi yang digelar Firma KM & Partner Secara Daring (Online) dari tanggal 15-19 Juni 2021***

9.



***Menghadiri undangan rapat PCM terkait paket Pembuatan Tempat Parkir DI DTW Pantai Lovina pada tanggal 15 Juni 2021***

10.



***Mentoring Clearing House Pengadaan dengan narasumber Bapak Eben Henry Reagen Mangihut Simanjuntak dari Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP-RI dan dihadiri seluruh Tim Clearing House Pemkab Buleleng bertempat diruang rapat Bappeda pada tanggal 16 Juni 2021***

11.



***Reviu dokumen persiapan pengadaan paket Pengadaan Media Pendidikan SMP dan Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SMP pada tanggal 17 Juni 2021***

12.



***Menghadiri rapat kemajuan pekerjaan bulan III untuk paket Peningkatan Jalan SP3. Tigawasa-Uma Sendi-Bingin Banjah, Peningkatan Jalan Lebah Siung-Pancoran, Peningkatan Jalan Pulau Komodo dan Peningkatan Jalan Celukan Bawang-Pelabuhan pada tanggal 28Juni 2021***

13.



***Rapat membahas Draft Perbup tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Buleleng sebagai pengganti Peraturan Bupati Buleleng 61 Tahun 2020 pada tanggal 29 Juni 2021***
