

# LAPORAN PENGADAAN BARANG/JASA BULAN JULI 2021

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

2021



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja Telepon (0362) 21985  
[www.setda.bulelengkab.go.id](http://www.setda.bulelengkab.go.id) email: [setda@bulelengkab.go.id](mailto:setda@bulelengkab.go.id)

Singaraja, 9 Agustus 2021

K e p a d a

Nomor : 027/80/VIII/BPBJ/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) gabung  
Hal : Laporan Pengadaan Barang/Jasa  
Sampai Dengan Bulan Juli 2021

Yth. Bupati Buleleng  
melalui Sekretaris  
Daerah Kabupaten Buleleng  
di –  
Singaraja

Dengan hormat kami sampaikan laporan realisasi pengadaan barang/jasa sampai dengan bulan **Juli** Tahun Anggaran 2021, yang diproses melalui Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, dengan perincian sebagai berikut :

I. Data Paket Pengadaan yang diproses (PERENCANAAN) melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Buleleng berdasarkan RUP :

Terdapat perubahan rencana paket tender/seleksi melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa akibat refocusing anggaran sebagai berikut :

| No.    | Jenis Pengadaan | Rencana Umum Pengadaan<br>TA 2021 |                   | Keterangan                            |
|--------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|        |                 | Paket                             | Pagu (Rp.)        |                                       |
| 1      | Barang          | 27                                | 18.137.198.567,-  | Tambahan 1 Paket dari Dinas Pertanian |
| 2      | Konstruksi      | 62                                | 235.248.478.885,- |                                       |
| 3      | Konsultansi     | 17                                | 6.983.849.768,-   |                                       |
| 4      | Jasa Lainnya    | 5                                 | 2.924.613.707,-   |                                       |
| Jumlah |                 | 111                               | 263.294.140.927,- |                                       |

II. Data Paket Masuk Berdasarkan Jenis Pengadaan :

| No     | Jenis Pengadaan  | Paket Masuk |                     | Sedang Proses |                     | Selesai |                     | Gagal Tender/Tender Ulang |                     | Di Batalkan |                     | Sisa Paket |                     |
|--------|------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|
|        |                  | Jml.        | Pagu Anggaran (Rp.) | Jml.          | Pagu Anggaran (Rp.) | Jml.    | Pagu Anggaran (Rp.) | Jml.                      | Pagu Anggaran (Rp.) | Jml.        | Pagu Anggaran (Rp.) | Jml.       | Pagu Anggaran (Rp.) |
| 1      | 2                | 3           | 4                   | 5             | 6                   | 7       | 8                   | 9                         | 10                  | 11          | 12                  | 13         | 14                  |
| 1      | Barang           | 19          | 15.027.505.477      | 5             | 5.813.317.025       | 14      | 9.214.188.452       | 0                         | -                   | 3           | 1.150.450.000       | 5          | 1.959.243.090       |
| 2      | Konstruksi       | 54          | 132.444.315.885     | 3             | 8.578.558.000       | 50      | 120.579.462.150     | 1                         | 3.286.295.735       | 0           | -                   | 8          | 102.804.163.000     |
| 3      | Jasa Konsultansi | 15          | 4.417.945.503       | 1             | 349.437.000         | 13      | 3.767.308.503       | 1                         | 301.200.000         | 0           | -                   | 2          | 2.565.904.265       |
| 4      | Jasa Lainnya     | 4           | 2.683.596.707       | 1             | 204.243.700         | 3       | 2.479.353.007       | 0                         | -                   | 0           | -                   | 1          | 241.017.000         |
| Jumlah |                  | 92          | 154.573.363.572     | 10            | 14.945.555.725      | 80      | 136.040.312.112     | 2                         | 3.587.495.735       | 3           | 1.150.450.000       | 16         | 107.570.327.355     |

III. Efisiensi Terhadap Pagu Anggaran dan HPS :

Efisiensi Terhadap Pagu Anggaran


| Paket Selesai |                     | Nilai Kontrak (Rp.) | Nilai Kontrak (Rp.) |       |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|
| Jumlah        | Pagu Anggaran (Rp.) |                     | Efisiensi           | (%)   |
| 80            | 136.040.312.111,68  | 106.658.105.668,77  | 29.382.206.443,01   | 21,60 |




Total Efisiensi Terhadap HPS

| Paket Selesai |                    | Nilai Kontrak (Rp.) | Efisiensi         |       |
|---------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------|
| Jumlah        | HPS (Rp.)          |                     | Efisiensi         | (%)   |
| 80            | 134.404.998.101,13 | 106.658.105.668,67  | 27.746.892.432,46 | 20,64 |

IV. DATA SEBARAN PEMENANG TENDER/SELEKSI/PEMILIHAN PENYEDIA

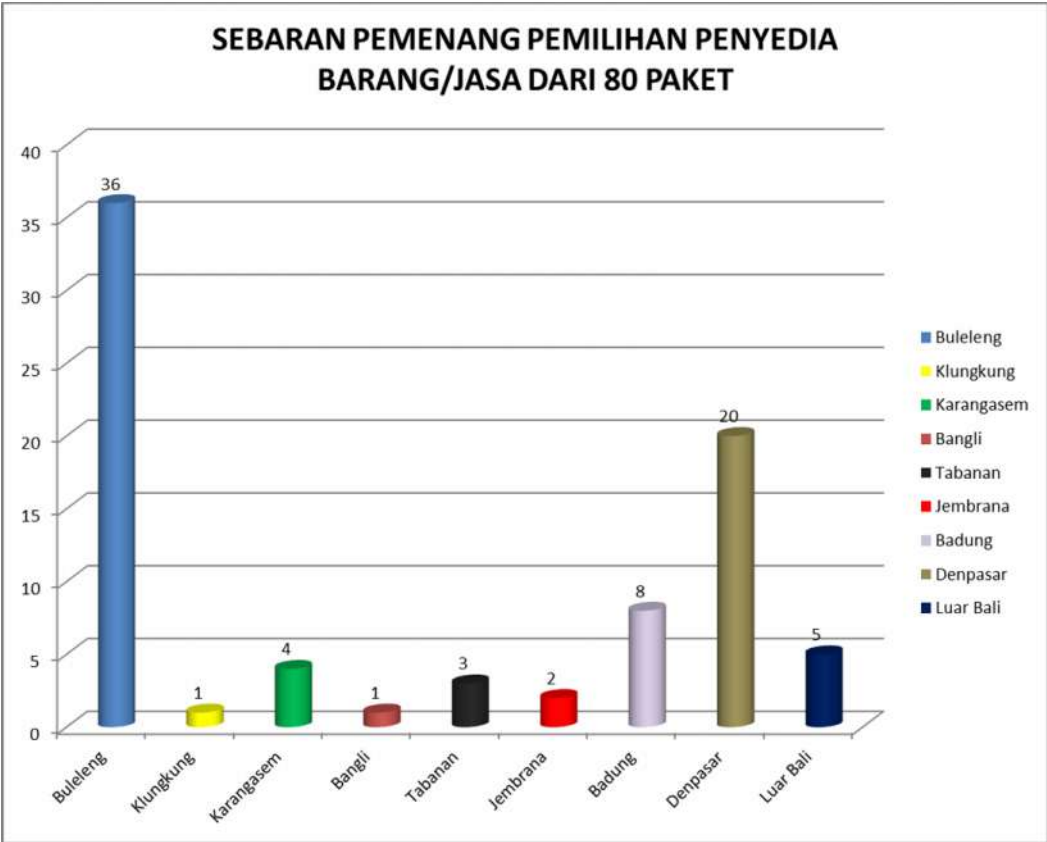

V. MONITORING PELAKSANAAN KONTRAK

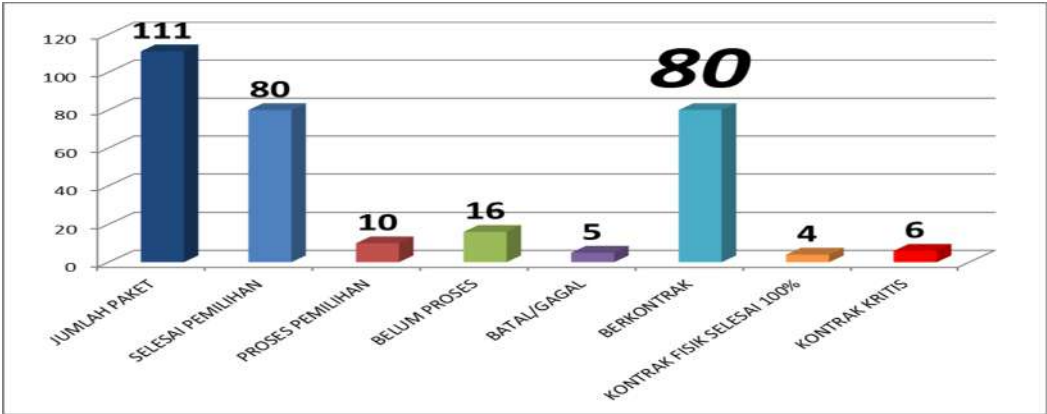

Catatan : Kontrak kritis yaitu kontrak yang pelaksanaannya mengalami deviasi minus di atas 10%.

VI. DATA PERMASALAHAN

a. Sanggahan

| No. | Nama Paket/OPD  | Sumber Dana              | Sanggahan | Pengaduan | Proses Peradilan | Ket.               |
|-----|---|--------------------------|-----------|-----------|------------------|--------------------|
| 1.  | Belanja Modal Taman (Pembangunan RTH Taman Bung Karno Tahap IV) | APBD (BKK Provinsi Bali) | 1         | -         | -                | Tender Dilanjutkan |
| 2.  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lanyahan Petandakan          | APBD                     | 1         | -         | -                | Tender Dilanjutkan |

|       |   |                          |    |   |   |                    |
|-------|---|--------------------------|----|---|---|--------------------|
| 3.    | Pemuktahiran Sistem Informasi/ Data Base Jaringan Irigasi di Kabupaten Buleleng | APBD                     | 1  | - | - | Tender Dilanjutkan |
| 4.    | Pengawasan/Supervisi Rehabilitasi Jaringan Irigasi                              | APBD                     | 1  | - | - | Tender Dilanjutkan |
| 5.    | Belanja natura dan Pakan - Natura   | APBD                     | 1  | - | - | Tender Dilanjutkan |
| 6.    | Pembangunan Jembatan Pangkung Dalem Ruas Jalan SP3. Gitgit - Wanagiri           | APBD                     | 2  | - | - | Tender Dilanjutkan |
| 7.    | Pembangunan SPAM Air Sanih  | APBD (BKK Provinsi Bali) | 1  | - | - | Evaluasi Ulang     |
| 8.    | Paket Pekerjaan Survei Kondisi Jalan  | APBD (DAK)               | 1  | - | - | Tender Dilanjutkan |
| 9.    | Penguatan Data base dan Survei Kondisi Jembatan                                 | APBD (DAK)               | 1  | - | - | Tender Dilanjutkan |
| TOTAL |   |                          | 10 |   |   |                    |

b. Penetapan Daftar Hitam

| No. | Nama Penyedia | Alamat | Pekerjaan | No. Keputusan | Waktu Sanksi |
|-----|---------------|--------|-----------|---------------|--------------|
| 1.  | NIHIL         | -      | -         | -             | -            |

Dapat kami laporkan kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa saat ini pada lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng dan SDM Jabatan Fungsibnal Pengelola Pengadaan Barang/Jasa untuk Pokja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

A. *Existing* Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng

| No. | Formasi         | Kebutuhan | Terisi | Kurang | Ket.                      |
|-----|-----------------|-----------|--------|--------|---------------------------|
| 1   | 2               | 3         | 4      | 5      | 6                         |
| 1   | JF PPBJ Madya   | 2         | 1      | 1      |                           |
| 2   | JF PPBJ Muda    | 11        | 1      | 10     |                           |
| 3   | JF PPBJ Pertama | 19        | 13     | 6      | 5 (lima) Orang masih CPNS |
|     | TOTAL           | 32        | 15     | 17     |                           |

*Keterangan : Baru Terpenuhi 46,87% dari Kebutuhan*

B. *Existing* Pokja Pemilihan Permanen pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng

| No. | Formasi                  | Kebutuhan | Terisi | Kurang |
|-----|--------------------------|-----------|--------|--------|
| 1   | 2                        | 3         | 4      | 5      |
| 1   | Pokja Pemilihan Permanen | 20        | 10     | 10     |

*Keterangan : Baru Terpenuhi 50% dari Kebutuhan*

Dari data dimaksud diatas dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Kesimpulan :

- a. Proses pengadaan barang/jasa sampai dengan bulan **Juli** 2021 disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Pengadaan barang/jasa yang diproses Pokja Pemilihan sampai dengan bulan Juni 2021 sebanyak 95 paket (86%), dan ***sudah selesai tender sebanyak 80 paket (72,07%)*** dengan total nilai kontrak sebesar Rp.106.658.105.668,67 (40,51%) dari total pagu anggaran sebesar Rp.263.294.140.926,68, yang sedang proses tender sebanyak 10 paket (9,01%), yang belum di proses sebesar 16 paket (14,41%) dan yang batal tender sebanyak 3 paket (2,7%) karena *refocusing* dan perubahan metode pemilihan menjadi *e-purchasing*.
  - 2) Terdapat juga 2 paket pengadaan gagal proses yang sumber anggaran dari DAK pada Dinas Kesehatan yaitu Paket Belanja Jasa Konsultan Perencana Arsitektur-Jasa Desain Arsitektur senilai Rp.301.200.000,- dan Paket Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium senilai Rp.3.286.295.735, karena tidak cukup waktu akibat perencanaan dan pembangunan fisik dalam satu tahun anggaran dan adanya beberapa perubahan regulasi.
  - 3) ***Efisiensi anggaran sampai dengan Bulan Juli 2021 dari 80 paket APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 yang sudah selesai proses tender) sebesar Rp.27.746.892.432,46 (20,64%) dari total HPS Rp.134.404.998.101,13*** dan sisa anggaran sebesar Rp.29.382.206.443,01 (21,60%) dari total pagu anggaran Rp.136.040.312.111,68,-.
  - 4) Rincian pelaksanaan pengadaan barang/jasa dijelaskan lebih rinci pada dokumen terlampir.
- b. SDM Jabfung PBJ
- 1) Prosentase capaian pemenuhan Jabfung PBJ lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng yaitu ***46,87%***, dimana kebutuhan Jabfung PBJ sebanyak 32 orang dan sudah terisi sebanyak 15 orang.
  - 2) Prosentase capaian pemenuhan Jabfung PBJ untuk Pokja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yaitu ***50%***, dimana kebutuhan Jabfung PBJ sebanyak 20 orang dan sudah terisi sebanyak 10 orang.

## 2. Langkah-langkah yang telah dilakukan :

- a. Melakukan penguatan perencanaan dan pengumuman RUP lebih awal melalui kegiatan reviu penyusunan RUP dan monitoring terhadap RUP yang telah diumumkan melalui SiRUP.
- b. Percepatan pemilihan terutama pekerjaan fisik (konstruksi) agar tidak menumpuk di Triwulan III dan IV untuk menghindari keterlambatan penyelesaian fisik.
- c. Melakukan monitoring evaluasi kemajuan pelaksanaan fisik pekerjaan konstruksi ke OPD khusus paket – paket strategis, mengetahui permasalahan lebih awal untuk solusi penyelesaian.
- d. Pendampingan penyusunan rencana pengadaan dan pengendalian kontrak. Terutama kontrak kritis dimana Sesuai dengan Permen PU No. 07/PRT/M/2011 Buku PK 06A-BAB VII B6 Angka 39.2, kontrak dinyatakan kritis apabila:
  - ✓ Periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana.
  - ✓ Periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana.
  - ✓ Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

Pada saat kontrak dinyatakan kritis, disarankan menerbitkan surat peringatan kepada Kontraktor/Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan *Show Cause Meeting* (SCM).

- e. Pembinaan dan penguatan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang Jasa dengan melaksanakan Bimtek kepada PPK dan Pokja Pemilihan terkait serta Pejabat Pengadaan.
- f. Pembentukan dan penetapan organisasi PBJ, khususnya PPK oleh PA tidak dibatasi/terikat Tahun Anggaran sehingga tidak menghambat proses pelaksanaan PBJ.
- g. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan OPD yang belum melaksanakan/mengalami keterlambatan pengadaan.
- h. Menyediakan layanan (Klinik) konsultasi pengadaan barang/jasa dan dibentuk Tim Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa.
- i. Melakukan koordinasi/konsultasi kepada LKPP melalui surat.

Demikian kami sampaikan untuk maklum dan mohon arahan lebih lanjut.  
Terima kasih.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa,



**Tembusan** disampaikan kepada :

1. Yth. Wakil Bupati Buleleng sebagai laporan;
2. Yth. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng;
3. Yth. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng;
5. Yth. Kepala BPKPD Kabupaten Buleleng;
6. Yth. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng;
7. Arsip.


Laporan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng Melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Sampai dengan Bulan : **Juli 2021**

A. PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

1. Data Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa TA 2021



Tangkapan Layar Monev Tepra  
(<https://monev.lkpp.go.id/tepra/summary?instansi=D30&tahun=2021>)

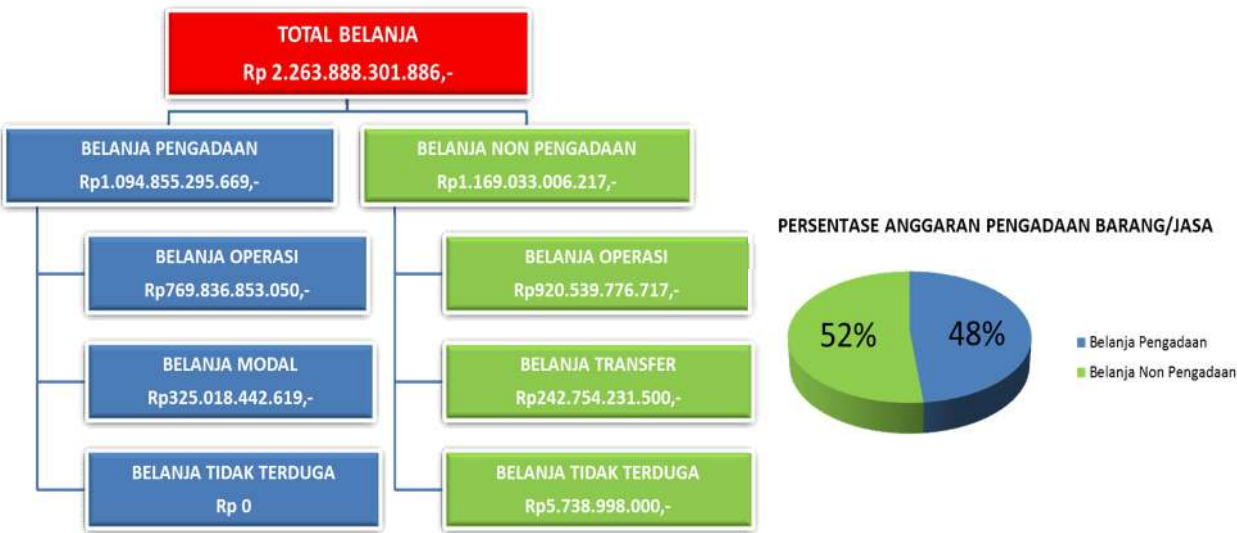

Pagu Anggaran untuk belanja melalui pengadaan berubah menjadi **Rp 1.094.855.295.669,-**

2. Data Paket Pengadaan Yang Diproses Melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Berdasarkan RUP

| No     | Jenis Pengadaan | Rencana Umum Pengadaan TA 2021 |                   | Keterangan                 |
|--------|-----------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|
|        |                 | Paket                          | Pagu (Rp.)        |                            |
| 1      | Barang          | 27                             | 18.137.198.567,-  | Tambahan 1 Dinas Pertanian |
| 2      | Konstruksi      | 62                             | 235.248.478.885,- |                            |
| 3      | Konsultansi     | 17                             | 6.983.849.768,-   |                            |
| 4      | Jasa Lainnya    | 5                              | 2.924.613.707,-   |                            |
| Jumlah |                 | 111                            | 263.294.140.927,- |                            |


Sumber : <https://sirup.lkpp.go.id> per Juni 2021

B. PROSES PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

1. Data Penyelesaian Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa

| Jenis Pengadaan Barang/Jasa | Satuan              | Total RUP TA 2021 | Total Paket Dengan Nilai > 200 Juta (Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya) Dan Di Atas 50 Juta Untuk Jasa Konsultansi |                 |                 |                           |                |                    |               |                 | Sisa Pekerjaan PB/ (3-(5+7+8+9)) |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|---|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------|--------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|
|                             |                     |                   | Paket Yang Masuk  | Seleksi         |                 |                           | Dalam Proses   | Gagal/Tender Ulang | Ditunda/batal |                 |                                  |
|                             |                     |                   |   | Bulan Ini       | S/d Bulan ini   | (%)Jumlah Paket (7:4x100) |                |                    |               |                 |                                  |
| 1                           | 2                   | 3                 | 4   | 5               | 6               | 7                         | 8              | 9                  | 10            |                 |                                  |
| Barang                      | Paket               | 27                | 19  | 14              | 14              | 73,68                     | 5              | -                  | 3             | 5               |                                  |
|                             | Pagu (Rp.)          | 18.137.198.567    | 15.027.505.477  | 9.214.188.452   | 9.214.188.452   | 61,32                     | 5.813.317.025  | -                  | 1.150.450.000 | 1.959.243.090   |                                  |
|                             | HPS (Rp.)           |                   | 13.207.208.926  | 8.564.427.427   | 8.564.427.427   | 64,85                     | 4.642.781.500  | -                  | -             |                 |                                  |
|                             | Nilai Kontrak (Rp.) |                   | 7.244.266.554   | 7.244.266.554   | 7.244.266.554   | 100,00                    | -              | -                  | -             |                 |                                  |
| Konstruksi                  | Paket               | 62                | 54  | 50              | 50              | 92,59                     | 3              | 1                  | -             | 8               |                                  |
|                             | Pagu (Rp.)          | 235.248.478.885   | 132.444.315.885   | 120.579.462.150 | 120.579.462.150 | 91,04                     | 11.864.853.735 | 3.286.295.735      | -             | 99.517.867.265  |                                  |
|                             | HPS (Rp.)           |                   | 128.596.006.621   | 120.017.452.047 | 120.017.452.047 | 93,33                     | 8.578.554.574  | -                  | -             |                 |                                  |
|                             | Nilai Kontrak (Rp.) |                   | 94.641.753.564  | 94.641.753.564  | 94.641.753.564  | 100,00                    | -              | -                  | -             |                 |                                  |
| Konsultansi                 | Paket               | 17                | 15  | 13              | 13              | 86,67                     | 1              | 1                  | -             | 2               |                                  |
|                             | Pagu (Rp.)          | 6.983.849.768     | 4.417.945.503   | 3.767.308.503   | 3.767.308.503   | 85,27                     | 650.637.000    | 301.200.000        | -             | 2.264.704.265   |                                  |
|                             | HPS (Rp.)           |                   | 3.924.408.839   | 3.575.114.839   | 3.575.114.839   | 91,10                     | 345.294.000    | -                  | -             |                 |                                  |
|                             | Nilai Kontrak (Rp.) |                   | 2.887.065.010   | 2.887.065.010   | 2.887.065.010   | 100,00                    | -              | -                  | -             |                 |                                  |
| Jasa Lainnya                | Paket               | 5                 | 4   | 3               | 3               | 75,00                     | 1              | -                  | -             | 1               |                                  |
|                             | Pagu (Rp.)          | 2.924.613.707     | 2.683.596.707   | 2.479.353.007   | 2.479.353.007   | 92,39                     | 204.243.700    | -                  | -             | 241.017.000     |                                  |
|                             | HPS (Rp.)           |                   | 2.447.682.489   | 2.248.003.789   | 2.248.003.789   | 91,84                     | 195.678.700    | -                  | -             |                 |                                  |
|                             | Nilai Kontrak (Rp.) |                   | 1.885.020.540   | 1.885.020.540   | 1.885.020.540   | 100,00                    | -              | -                  | -             |                 |                                  |
| Jumlah Total                | Paket               | 111               | 92  | 80              | 80              | 86,96                     | 10             | 2                  | 3             | 16              |                                  |
|                             | Pagu (Rp.)          | 263.294.140.927   | 154.573.363.572   | 136.040.312.112 | 136.040.312.112 | 88,01                     | 18.533.051.460 | 3.587.495.735      | 1.150.450.000 | 103.982.831.620 |                                  |
|                             | HPS (Rp.)           |                   | 148.175.306.875   | 134.404.998.101 | 134.404.998.101 | 90,71                     | 13.770.308.774 | -                  | -             |                 |                                  |
|                             | Nilai Kontrak (Rp.) |                   | 106.658.105.659   | 106.658.105.659 | 106.658.105.659 | 100,00                    | -              | -                  | -             |                 |                                  |

Dalam bentuk grafik

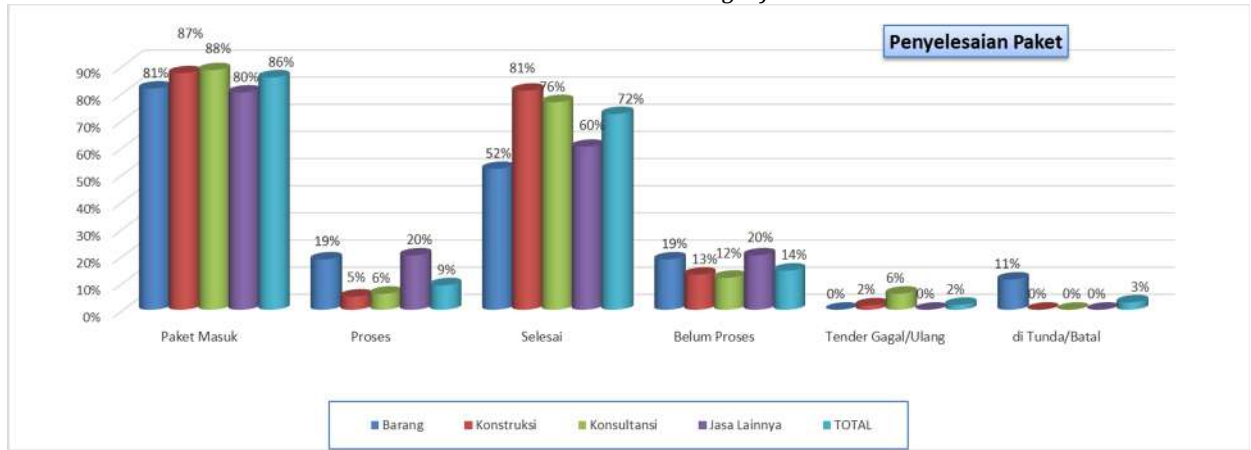


2. Ketepatan Waktu Penyelesaian Paket Sesuai Dengan RUP

| Jenis Pengadaan Barang/Jasa | Target | Selesai |       | Deviasi (Target - Paket Selesai) |       |
|-----------------------------|--------|---------|-------|----------------------------------|-------|
|                             |        | Paket   | (%)   | Paket (Target -Selesai)          | (%)   |
| 1. Barang                   | 27     | 14      | 51,85 | 13                               | 48,15 |
| 2. Konstruksi               | 62     | 50      | 80,65 | 12                               | 19,35 |
| 3. Konsultansi              | 17     | 13      | 76,47 | 4                                | 23,53 |
| 4. Jasa Lainnya             | 5      | 3       | 60,00 | 2                                | 40,00 |
| Jumlah                      | 111    | 80      | 72,07 | 31                               | 27,93 |

Keterangan : Deviasi = Sisa Paket dibagi Target x 100 (dalam persen)



Dalam bentuk grafik

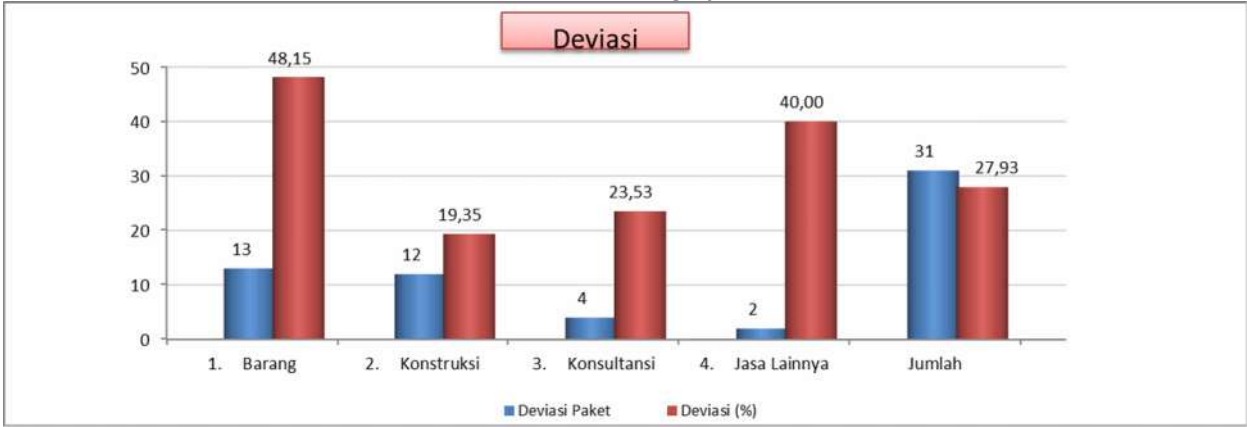

3. Daftar Proses Pengadaan Barang Jasa Berdasarkan Perangkat Daerah


| No. | Nama Perangkat Daerah   | Proses Pelaksanaan Tender |              |               |                |              |                    |
|-----|---|---------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------------|
|     |   | Jumlah                    | Dalam Proses | Sudah Selesai | Ditunda /Batal | Belum Proses | Gagal/Tender Ulang |
| 1   | 2   | 3                         | 4            | 5             | 6              | 7            | 8                  |
| 1   | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                      | 1                         | 0            | 1             | 0              | 0            |                    |
| 2   | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                    |
| 3   | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                    |
| 4   | BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH  | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                    |
| 5   | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  | 4                         | 0            | 4             | 0              | 0            |                    |
| 6   | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                    |
| 7   | DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH   | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                    |
| 8   | DINAS KEBUDAYAAN  | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                    |
| 9   | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                    |
| 10  | DINAS KESEHATAN   | 19                        | 3            | 6             | 0              | 8            | 2                  |
| 11  | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  | 1                         | 0            | 1             | 0              | 0            |                    |
| 12  | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK                                       | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                    |
| 13  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP  | 2                         | 0            | 2             | 0              | 0            |                    |
| 14  | DINAS PARIWISATA  | 4                         | 0            | 4             | 0              | 0            |                    |
| 15  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG   | 38                        | 2            | 34            | 0              | 2            |                    |
| 16  | DINAS PEMADAM KEBAKARAN   | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                    |
| 17  | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                    |
| 18  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU                                      | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                    |
| 19  | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA   | 24                        | 0            | 20            | 3              | 1            |                    |
| 20  | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 1                         | 0            | 1             | 0              | 0            |                    |
| 21  | DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH                       | 1                         | 1            | 0             | 0              | 0            |                    |
| 22  | DINAS PERHUBUNGAN   | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                    |
| 23  | DINAS PERTANIAN   | 3                         | 0            | 2             | 0              | 1            |                    |
| 24  | DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN   | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                    |
| 25  | DINAS SOSIAL  | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                    |
| 26  | DINAS TENAGA KERJA  | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                    |
| 27  | INSPEKTORAT DAERAH  | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                    |
| 28  | KECAMATAN BANJAR  | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                    |
| 29  | KECAMATAN BULELENG  | 2                         | 0            | 0             | 0              | 2            |                    |
| 30  | KECAMATAN BUSUNGBIU   | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                    |
| 31  | KECAMATAN GEROKGAK  | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                    |
| 32  | KECAMATAN KUBUTAMBAHAN  | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                    |
| 33  | KECAMATAN SAWAN   | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                    |
| 34  | KECAMATAN SERIRIT   | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                    |
| 35  | KECAMATAN SUKASADA  | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                    |
| 36  | KECAMATAN TEJAKULA  | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                    |
| 37  | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH   | 9                         | 3            | 4             | 0              | 2            |                    |
| 38  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  | 0                         | 0            | 0             | 0              | 0            |                    |
| 39  | SEKRETARIAT DAERAH  | 1                         | 0            | 1             | 0              | 0            |                    |

|       |                  |     |   |    |   |    |   |
|-------|------------------|-----|---|----|---|----|---|
| 40    | SEKRETARIAT DPRD | 1   | 0 | 0  | 0 | 1  |   |
| TOTAL |                  | 111 | 9 | 80 | 3 | 17 | 2 |

4. Data Efisiensi APBD Terhadap Pagu Anggaran dan HPS

| Jenis Pengadaan Barang/Jasa | Pemilihan Selesai |                    |                    |                     | Efisiensi  |       |   |       |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|-------|---|-------|
|                             | Paket             | Pagu (Rp.)         | HPS (Rp.)          | Nilai Kontrak (Rp.) | Terhadap Pagu Anggaran (Rp.)<br>(Pagu - Nilai Kontrak) |       | Terhadap HPS (Rp.)<br>(HPS - Nilai Kontrak) |       |
|                             |                   |                    |                    |                     | (Rp.)  | %     | (Rp.)                                       | %     |
| 1. Barang                   | 14                | 9.214.188.452,00   | 8.564.427.426,53   | 7.244.266.554,07    | 1.969.921.897,93                                       | 21,38 | 1.320.160.872,46                            | 15,41 |
| 2. Konstruksi               | 50                | 120.579.462.149,68 | 120.017.452.047,03 | 94.641.753.564,40   | 25.937.708.585,28                                      | 21,51 | 25.375.698.482,63                           | 21,14 |
| 3. Jasa Konsultansi         | 13                | 3.767.308.503,00   | 3.575.114.838,90   | 2.887.065.010,00    | 880.243.493,00   | 23,37 | 688.049.828,90                              | 19,25 |
| 4. Jasa Lainnya             | 3                 | 2.479.353.007,00   | 2.248.003.788,67   | 1.885.020.540,20    | 594.332.466,80   | 23,97 | 362.983.248,47                              | 16,15 |
| Jumlah                      | 80                | 136.040.312.111,68 | 134.404.998.101,13 | 106.658.105.668,67  | 29.382.206.443,01                                      | 21,60 | 27.746.892.432,46                           | 20,64 |


Dalam bentuk grafik

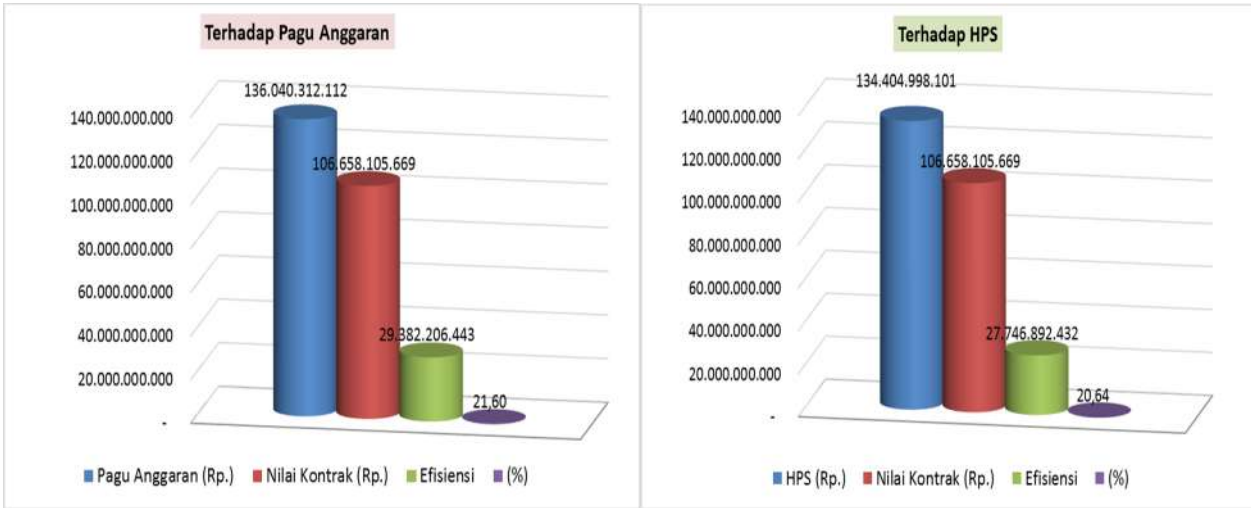

5. Tingkat Partisipasi Penyedia dan Kualitas Penawaran

| No | Jenis Pengadaan Barang | Jumlah | a. Partisipasi Penyedia     |  | b. Kualitas penawaran             |                                |               |
|----|------------------------|--------|-----------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|
|    |                        | Paket  | Jumlah Penawaran Yang Masuk | Rata-rata Partisipasi Penyedia/Paket (4:3) | Jumlah Penawaran Yang Di evaluasi | Penawaran Yang Memenuhi Syarat | (%) (7:6x100) |
| 1  | 2                      | 3      | 4                           | 5  | 6                                 | 7                              | 8             |
| 1  | Barang                 | 27     | 79                          | 2,93                                       | 69                                | 51                             | 73,91         |
| 2  | Kontruksi              | 62     | 838                         | 13,52                                      | 259                               | 147                            | 56,76         |
| 3  | Konsultansi            | 17     | 91                          | 5,35                                       | 81                                | 48                             | 59,26         |
| 4  | Jasa Lainnya           | 5      | 19                          | 3,80                                       | 15                                | 5                              | 33,33         |
|    | Jumlah                 | 111    | 1.027                       | 9,25                                       | 424                               | 251                            | 59,20         |

Dalam bentuk grafik

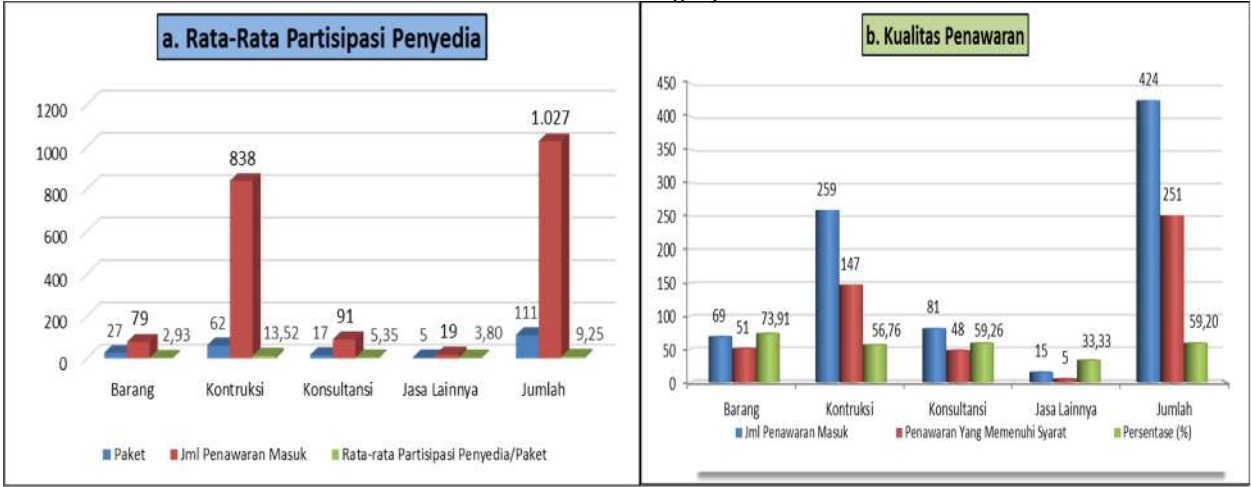

6. Sanggahan dari Penyedia

| No.    | Jenis Pengadaan Barang | Jumlah Paket Pemilihan Selesai Proses | Sanggahan |       | Tindak lanjut               |              |               |         | Ket |
|--------|------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|--------------|---------------|---------|-----|
|        |                        |                                       | Jml       | (%)   | Sanggahan Penyedia Diterima |              | Jawaban Pokja |         |     |
|        |                        |                                       |           |       | Evaluasi Ulang              | Lelang Ulang | Diterima      | Banding |     |
| 1      | Barang                 | 14                                    | 1         | 7,1%  | -                           | -            | 1             | -       | -   |
| 2      | Kontruksi              | 50                                    | 5         | 10%   | 1                           | -            | 4             | -       | -   |
| 3      | Konsultansi            | 13                                    | 4         | 30,8% | -                           | -            | 4             | -       | -   |
| 4      | Jasa Lainnya           | 3                                     | 0         | 0,0%  | -                           | -            | 0             | -       | -   |
|        |                        |                                       |           |       |                             |              |               |         |     |
| Jumlah |                        | 80                                    | 10        | 12,5% | 1                           | -            | 9             | -       | -   |

7. Data Pengaduan

| No     | Asal Pengaduan/Hasil Pemeriksaan | Nama Kegiatan/ OPD | Jenis Pengadaan Barang/Jasa | Jml Pengaduan | Nilai Pekerjaan (Rp) | Jumlah Tindak Lanjut |               | Ket/ Penjelasan |
|--------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
|        |                                  |                    |                             |               |                      | Selesai              | Proses Lanjut |                 |
| 1      | APH                              |                    |                             |               |                      |                      |               |                 |
| 2      | Penyedia                         |                    |                             |               |                      |                      |               |                 |
| 3      | Masyarakat                       |                    |                             |               |                      |                      |               |                 |
| 4      | Media Masa                       |                    |                             |               |                      |                      |               |                 |
| Jumlah |                                  |                    |                             |               |                      |                      |               |                 |


Nihil

8. DATA SEBARAN PEMENANG TENDER/SELEKSI/PEMILIHAN PENYEDIA



C. MONITORING PELAKSANAAN KONTRAK OPD

1. Data Paket Berkontrak OPD

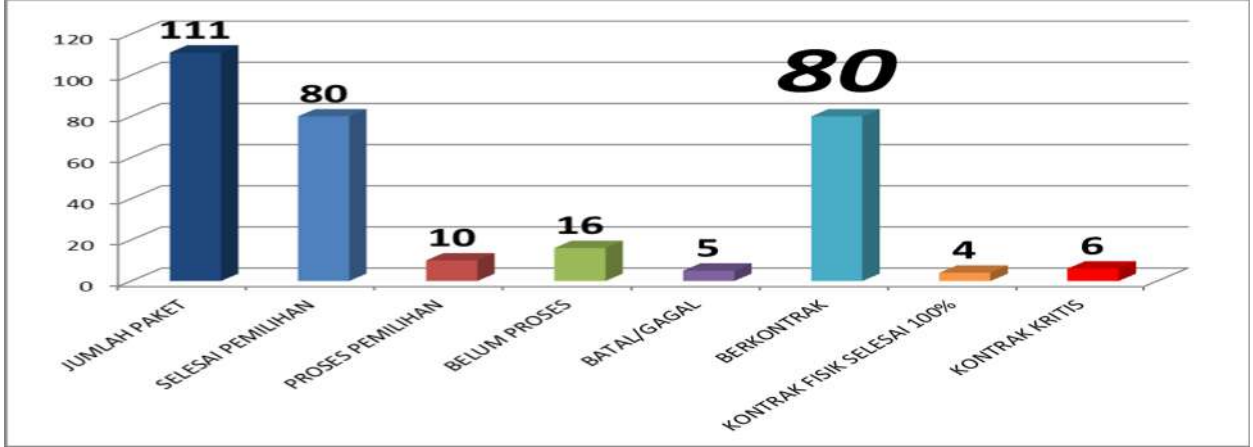

## 2. Data Kontrak Kritis dan Anprestasi

| No | Nama Paket   | Nilai Kontrak<br>(Rp) | Jangka Waktu Pelaksanaan | Sisa Waktu Pekerjaan/Terlambat | Prosentase Pekerjaan Kondisi Fisik (%) | Ket              |
|----|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|--|------------------|
| 1  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jembong   | 969.756.731,69        | 150 hari kalender        | 76 hari kalender               | 20,52%                                 | deviasi -10,13%  |
| 2  | Supervisi Konstruksi Pembangunan Jembatan Pangkung Dalem Ruas Jalan SP3. Gitgit - Wanagiri | 230.814.650,00        | 210 hari kalender        | 130 hari kalender              | 1,40%                                  | deviasi - 11,28% |
| 3  | Pembangunan Jembatan Pangkung Dalem Ruas Jalan SP3. Gitgit - Wanagiri                      | 6.810.504.951,37      | 210 hari kalender        | 130 hari kalender              | 1,40%                                  | deviasi - 11,28% |
| 4  | Supervisi Konstruksi Peningkatan Jalan SP3. Tigawasa - Uma Sendi - Bingin Banjah           | 102.286.800,00        | 150 hari kalender        | 30 hari kalender               | 36,24%                                 | deviasi - 10%    |
| 5  | Peningkatan Jalan SP3. Tigawasa - Uma Sendi - Bingin Banjah                                | 6.835.332.554,92      | 150 hari kalender        | 30 hari kalender               | 38,44%                                 | deviasi - 16,24% |
| 6  | Pembuatan Tempat Parkir Barat Di DTW Pantai Lovina   | 202.700.000,00        | 90 hari kalender         | 35 hari kalender               | 16,15%                                 | deviasi -23,16%  |

### D. Pengembangan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa

Pengembangan kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa sangatlah diperlukan dalam menunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa itu sendiri. Pengembangan SDM dalam hal ini dapat berupa pengembangan profesi maupun pengembangan keahlian. Bentuk-bentuk pengembangan SDM Pengadaan Barang/Jasa antara lain seperti : bimbingan teknis, sosialisasi, ujian kompetensi, dan lain sebagainya. Pada Tahun Anggaran 2021, Pengembangan SDM Pengadaan Barang/Jasa telah disiapkan anggaran sebesar Rp.429.480.600,- melalui Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (4.01.03.2.03.03).

### E. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut diatas, proses pengadaan barang/jasa sampai dengan bulan Juli 2021 disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengadaan barang/jasa yang diproses Pokja Pemilihan sampai dengan bulan Juni 2021 sebanyak 95 paket (86%), dan ***sudah selesai tender sebanyak 80 paket (72,07%)*** dengan total nilai kontrak sebesar Rp.106.658.105.668,67 (40,51%) dari total pagu anggaran sebesar Rp.263.294.140.926,68, yang sedang proses tender sebanyak 10 paket (9,01%), yang belum di proses sebesar 16 paket (14,41%) dan yang batal tender sebanyak 3 paket (2,7%) karena refocusing dan perubahan metode pemilihan menjadi e-purchasing.
2. Terdapat juga 2 paket pengadaan gagal proses yang sumber anggaran dari DAK pada Dinas Kesehatan yaitu Paket Belanja Jasa Konsultan Perencana Arsitektur-Jasa Desain Arsitektur senilai Rp.301.200.000,- dan Paket Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium senilai Rp.3.286.295.735, karena tidak cukup waktu akibat perencanaan dan pembangunan fisik dalam satu tahun anggaran dan adanya beberapa perubahan regulasi.
3. ***Efisiensi anggaran sampai dengan Bulan Juli 2021 dari 80 paket APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 yang sudah selesai proses tender) sebesar Rp.27.746.892.432,46 (20,64%) dari total HPS Rp.134.404.998.101,13 dan sisa anggaran sebesar Rp.29.382.206.443,01 (21,60%) dari total pagu anggaran Rp.136.040.312.111,68,-.***
4. Kendala/permasalahan dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana diuraikan diatas dan tindak lanjut yang telah laksanakan adalah :
  - a. Masih terdapat perangkat daerah yang terlambat dalam mengajukan Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP) yang dikarenakan beberapa kendala antara lain :
    - ✓ Beberapa paket pengadaan masih dalam proses persiapan oleh PPK.
    - ✓ Beberapa paket kontruksi yang mengalami keterlambatan, masih berproses pada perencanaan, hal ini disebabkan karena perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kontruksi dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama.



- ✓ Terjadi kekeliruan dalam input waktu pelaksanaan pengadaan pada aplikasi SiRUP.
  - ✓ Kesalahan input rekening anggaran.
  - b. Terdapat beberapa perubahan regulasi pada pertengahan Tahun Anggaran yang memerlukan waktu tambahan untuk penyesuaian proses dan konsultasi/koordinasi dengan *leading sector* terkait.
  - c. Terdapat beberapa paket tambahan yang awalnya direncanakan Pemilihan Penyedia melalui *e-purchasing* namun dalam e-katalog tidak ditayangkan, sehingga perencanaan kurang matang dari sisi waktu proses Pemilihan Penyedia dan perencanaan pengadaan yang telah disusun di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
  - d. Dari monitoring pelaksanaan kontrak terdapat beberapa kontrak kritis
5. Dalam upaya peningkatan kinerja PBJ, dilakukan upaya sbb. :
- a. Melakukan penguatan perencanaan dan pengumuman RUP lebih awal melalui kegiatan reviu penyusunan RUP dan monitoring terhadap RUP yang telah diumumkan melalui SiRUP.
  - b. Percepatan pemilihan terutama pekerjaan fisik (konstruksi) agar tidak menumpuk di Triwulan III dan IV untuk menghindari keterlambatan penyelesaian fisik.
  - c. Melakukan monitoring evaluasi kemajuan pelaksanaan fisik pekerjaan konstruksi ke OPD khusus paket – paket strategis, mengetahui permasalahan lebih awal untuk solusi penyelesaian.
  - d. Pendampingan penyusunan rencana pengadaan dan pengendalian kontrak. Terutama kontrak kritis dimana Sesuai dengan Permen PU No. 07/PRT/M/2011 Buku PK 06A-BAB VII B6 Angka 39.2, kontrak dinyatakan kritis apabila:
    - ✓ Periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana.
    - ✓ Periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana.
    - ✓ Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
 Pada saat kontrak dinyatakan kritis, disarankan menerbitkan surat peringatan kepada Kontraktor/Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan *Show Cause Meeting* (SCM).
  - e. Pembinaan dan penguatan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang Jasa dengan melaksanakan Bimtek kepada PPK dan Pokja Pemilihan terkait serta Pejabat Pengadaan.
  - f. Pembentukan dan penetapan organisasi PBJ, khususnya PPK oleh PA tidak dibatasi/terikat Tahun Anggaran sehingga tidak menghambat proses pelaksanaan PBJ.
  - g. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan OPD yang belum melaksanakan/mengalami keterlambatan pengadaan.
  - h. Menyediakan layanan (Klinik) konsultasi pengadaan barang/jasa dan dibentuk Tim Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa.
  - i. Melakukan koordinasi/konsultasi kepada LKPP melalui surat.

Demikian laporan ini dibuat, untuk selanjutnya kami mohon arahan untuk perbaikan kinerja pengadaan berikutnya.

Singaraja, 9 Agustus 2021  
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa,



DATA TENDER/SELEKSI TAHUN ANGGARAN 2021

| NO | NAMA SATKER   | NAMA PAKET |  | PAGU           | HPS            | Nama Pemenang            | Alamat  | Nilai Hasil Tender(Rp.) | Efisiensi Rp.) | PROSES/BLELUM | SUMBER DANA |
|----|---|------------|--|----------------|----------------|--------------------------|---|-------------------------|----------------|---------------|-------------|
| 1  | 2   | 3          |  | 4              | 5              | 6                        | 7   | 8                       | 9              | 10            | 11          |
| 01 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN                                  | 1          | Rehabilitasi Bangunan Panti Benih/ Bangsal Hatchery dan Rehabilitasi kolam atau bak pemijahan/induk/ calon induk/ larva/tandon | 321.080.950    | 320.809.688    | CV. UCINDO KARYA MANDIRI | Perumahan Mustika Laksmi Gg 4 No. 6 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali                  | 232.869.921,04          | 87.939.767     | Sudah Selesai | APBD (DAK)  |
|    | JUMLAH 01   | 1          |  | 321.080.950    | 320.809.688    |                          |   | 232.869.921,04          | 87.939.767     |               |             |
| 2  | DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | 1          | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung                           | 349.437.000    | 349.294.000    |                          |   |                         | 349.294.000    | Dalam Proses  | APBD        |
|    | JUMLAH 02   | 1          |  | 349.437.000    | 349.294.000    | -                        | -   | -                       | 349.294.000    |               |             |
| 3  | SEKRETARIAT DAERAH  | 1          | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermontor Perorangan   | 445.500.000    | 405.550.000    | PT Agung Automall        | JALAN CUT MUTIAH NO 14 MENTENG JAKARTA PUSAT 10330 - Jakarta Pusat (Kota) - DKI Jakarta | 404.600.000             | 950.000        | Sudah Selesai | APBD        |
|    | JUMLAH 03   | 1          |  | 445.500.000    | 405.550.000    | -                        | -   | 404600000,00            | 950.000        |               |             |
| 4  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP  | 1          | Belanja jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawsan Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung                               | 611.981.923    | 511.377.350    | PT. KENCANA ADHI KARMA   | JL. BATUSARI NOMOR 15 DENPASAR - Denpasar (Kota) - Bali                                 | 409.041.600             | 102.335.750    | Sudah Selesai | APBD        |
|    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP  | 2          | Belanja Modal Taman (Pembangunan RTH Taman Bung Karno Tahap IV   | 15.178.311.319 | 15.178.310.778 | PT. SANUR JAYA UTAMA     | Jalan Setia Budi, Kuta - Badung - Badung (Kab.) - Bali                                  | 15.027.351.458          | 150.959.320    | Sudah Selesai | APBD        |
|    | JUMLAH 04   | 2          |  | 15.790.293.242 | 15.689.688.128 | 0                        | 0   | 15.436.393.058          | 253.295.070    |               |             |
| 5  | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH   | 1          | BELANJA NATURA DAN PAKAN - NATURA.   | 682.586.825    | 657.633.400    | CV KARYA SARI SEDANA     | Banjar Dinas Sari Tapak Dara Kubutambahan, Buleleng - Buleleng (Kab.) - Bali            | 612.113.200             | 45.520.200     | Sudah Selesai | APBD        |
|    | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH   | 2          | BELANJA MODAL ALAT DAPUR.  | 678.300.000    |                |                          |   |                         | 0              | Dalam Proses  | APBD        |

| NO | NAMA SATKER                         | NAMA PAKET |   | PAGU          | HPS            | Nama Pemenang          | Alamat   | Nilai Hasil Tender(Rp.) | Efisiensi Rp.) | PROSES/BLELUM | SUMBER DANA |
|----|-------------------------------------|------------|---|---------------|----------------|------------------------|--|-------------------------|----------------|---------------|-------------|
|    | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH             | 3          | BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN.   | 452.500.000   |                |                        |  |                         | 0              | Belum Proses  | APBD        |
|    | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH             | 4          | BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG - BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA - BANGUNAN KESEHATAN.                                   | 500.000.000   |                |                        |  |                         | 0              | Belum Proses  | APBD        |
|    | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH             | 5          | BELANJA MODAL ASET TETAP DALAM RENOVASI.  | 464.000.000   | 463.641.014,22 | CV. Dewata Karya       | Br. Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali               | 357.207.881,07          | 106.433.133    | Sudah Selesai | APBD        |
|    | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH             | 6          | BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - ALAT TULIS KANTOR.   | 328.315.000   | 302.598.600    | UD TRESNA JAYA         | Jalan Ahmad Yani No.5 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali                               | 236.935.530             | 65.663.070     | Sudah Selesai | APBD        |
|    | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH             | 7          | BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA.  | 399.612.000   | 385.678.000    | UD TRESNA JAYA         | Jalan Ahmad Yani No.5 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali                               | 265.402.609             | 120.275.391    | Sudah Selesai | APBD        |
|    | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH             | 8          | BELANJA LINEN.  | 417.543.025   | 415.207.500    |                        |  |                         | 415.207.500    | Dalam Proses  | APBD        |
|    | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH             | 9          | BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - BAHAN CETAK.   | 204.243.700   | 199.678.700    |                        |  |                         | 199.678.700    | Dalam Proses  | APBD        |
|    | JUMLAH 05                           | 9          |   | 4.127.100.550 | 2.424.437.214  | 0                      | 0  | 1.471.659.220           | 952.777.994    |               |             |
| 6  | SEKRETARIAT DPRD                    | 1          | Rehabilitas/ Renovasi Ringan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana Lantai 1/ Pemasangan lantai Vynil dan dinding HPL | 426.580.000   |                |                        |  |                         | -              | Belum Proses  | APBD        |
|    | JUMLAH 06                           | 1          |   | 426.580.000   | -              | -                      | -  | -                       | -              |               |             |
| 7  | DINAS PARIWISATA                    | 1          | Pembuatan Tempat Parkir Barat Di DTW Eks. Pelabuhan Buleleng  | 617.555.570   | 606.094.045,62 | CV. Lissjaya Utama     | Griya Panji Asri Blok P/5 Panji- Singaraja - Buleleng - Buleleng (Kab.) - Bali         | 484.875.236,50          | 121.218.809    | Sudah Selesai | APBD (DAK)  |
|    | DINAS PARIWISATA                    | 2          | Pembangunan Plaza/Pusat Jajanan Kuliner Di DTW Air Sanih Desa Bukti   | 285.000.000   | 284.999.121,18 | CV. KRISNA PUTRA BAL   | Wisma Arya Lantai I Blok 2, Jalan Pulau Irian No.36 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali | 228.002.337,37          | 56.996.784     | Sudah Selesai | APBD (DAK)  |
|    | DINAS PARIWISATA                    | 3          | Pembangunan Plaza/Pusat Jajanan Kuliner Di DTW Pantai Lovina  | 285.000.000   | 284.961.920,55 | CV. KRISNA PUTRA BALI  | Wisma Arya Lantai I Blok 2, Jalan Pulau Irian No.36 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali | 227.969.557,66          | 56.992.363     | Sudah Selesai | APBD (DAK)  |
|    | DINAS PARIWISATA                    | 4          | Pembuatan Tempat Parkir Barat Di DTW Pantai Lovina  | 257.480.400   | 257.466.895,40 | CV ARYA DEWATA UTAMA   | Wisma Arya Lanta I Blok 1, Jalan Pulau Irian No. 36 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali | 202.700.000             | 54.766.895     | Sudah Selesai | APBD (DAK)  |
|    | JUMLAH 7                            | 4          |   | 1.445.035.970 | 1.433.521.983  | -                      | -  | 1.143.547.132           | 289.974.851    |               |             |
| 8  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 1          | Supervisi Konstruksi Pembangunan Jembatan Pangkung Dalem Ruas Jalan SP3. Gitgit - Wanagiri                                  | 259.000.000   | 258.443.900    | PT. KENCANA ADHI KARMA | JL. BATUSARI NOMOR 15 DENPASAR - Denpasar (Kota) - Bali                                | 230.814.650             | 27.629.250     | Sudah Selesai | APBD (DAK)  |
|    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 2          | Supervisi Konstruksi Penggantian Jembatan Tukad Buleleng Ruas Jalan Bakung - Sari Mekar - Padang Bulia                      | 222.000.000   | 221.998.150,00 | PT. KENCANA ADHI KARMA | JL. BATUSARI NOMOR 15 DENPASAR - Denpasar (Kota) - Bali                                | 178.195.000             | 43.803.150     | Sudah Selesai | APBD (DAK)  |

| NO | NAMA SATKER                         | NAMA PAKET |  | PAGU          | HPS              | Nama Pemenang               | Alamat  | Nilai Hasil Tender(Rp.) | Efisiensi Rp.) | PROSES/BLELUM | SUMBER DANA |
|----|-------------------------------------|------------|--|---------------|------------------|-----------------------------|---|-------------------------|----------------|---------------|-------------|
|    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 3          | Supervisi Konstruksi Peningkatan Jalan SP3. Tigawasa - Uma Sendi - Bingin Banjah                       | 125.000.000   | 124.622.300      | PT MITRA TRI SAKTI          | JL. BUANA RAYA Gg. MEGA BUANA NO. 11 A PADANG SAMBIAN DENBAR - Badung (Kab.) - Bali                         | 102.286.800             | 22.335.500     | Sudah Selesai | APBD (DAK)  |
|    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 4          | Supervisi Konstruksi Pembangunan Jembatan Tukad Daya Ruas Jalan SP3. JN. Tikungan Bungkulan - Jembatan | 185.000.000   | 184.999.100      | PT MITRA TRI SAKTI          | JL. BUANA RAYA Gg. MEGA BUANA NO. 11 A PADANG SAMBIAN DENBAR - Badung (Kab.) - Bali                         | 148.365.800             | 36.633.300     | Sudah Selesai | APBD        |
|    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 5          | Penguatan Database dan Survey Kondisi Jembatan   | 150.000.000   | 146.022.800      | CV. Yogawidya Sarana Desain | Jalan Nagasari No. 3x, Kel. Penatih Dangin Puri, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar - Tabanan (Kab.) - Bali | 106.694.500             | 39.328.300     | Sudah Selesai | APBD (DAK)  |
|    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 6          | Survey Kondisi Jalan   | 499.975.000   | 499.140.400      | CV. Yogawidya Sarana Desain | Jalan Nagasari No. 3x, Kel. Penatih Dangin Puri, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar - Tabanan (Kab.) - Bali | 349.764.800             | 149.375.600    | Sudah Selesai | APBD (DAK)  |
|    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 7          | Peningkatan SPAM Perdesaan Desa Kayu Putih   | 896.140.000   | 896.139.263      | CV. PUTRA BALI TIMUR        | Jalan Sakura I Kelurahan Semarapura Klod Klungkung - Klungkung (Kab.) - Bali                                | 658.100.000             | 238.039.263    | Sudah Selesai | APBD (DAK)  |
|    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 8          | Peningkatan SPAM Perdesaan Desa Panji Anom   | 1.592.130.000 | 1.592.124.332    | CV. ATMA KARYA              | JALAN KARGO PASAR NO. 14 DENPASAR - Denpasar (Kota) - Bali  | 1.111.888.258           | 480.236.074    | Sudah Selesai | APBD (DAK)  |
|    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 9          | Peningkatan SPAM Perdesaan Desa Tegallingshah  | 1.274.922.000 | 1.274.914.820    | CV. PAYU JAYA SEJAHTERA     | JALAN TUKAD BALIAN NO. 117 Z RENON, DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR, BALI - Denpasar (Kota) - Bali          | 889.845.700             | 385.069.120    | Sudah Selesai | APBD (DAK)  |
|    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 10         | Peningkatan SPAM Perdesaan Desa Tigawasa   | 1.682.150.000 | 1.682.143.598    | CV. ADI YASA                | JALAN PULAU IRIAN DSN. KAJANAN DESA PENGILATAN - BULELENG - Buleleng (Kab.) - Bali                          | 1.206.549.631,27        | 475.593.966    | Sudah Selesai | APBD (DAK)  |
|    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 11         | Peningkatan SPAM Perdesaan Desa Wanagiri   | 1.251.171.000 | 1.251.162.094,74 | CV. Kuarsa Teknik           | Perum Nuansa Asri Pesona Blok A/10, Desa Bongon Tabanan - Tabanan (Kab.) - Bali                             | 923.630.000             | 327.532.095    | Sudah Selesai | APBD (DAK)  |
|    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 12         | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lanyahan Petandakan   | 1.896.059.117 | 1.896.059.117    | CV. Perdana Niaga           | Jalan Pulau Irian Gg. Anggur No. 5 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali                                       | 1.338.437.987,22        | 557.621.130    | Sudah Selesai | APBD (DAK)  |



| NO | NAMA SATKER                         | NAMA PAKET |   | PAGU           | HPS              | Nama Pemenang                  | Alamat   | Nilai Hasil Tender(Rp.) | Efisiensi Rp.) | PROSES/BLELUM | SUMBER DANA   |
|----|-------------------------------------|------------|---|----------------|------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|---------------|---------------|
|    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 13         | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tabang   | 1.815.402.936  | 1.815.402.936    | CV. PUTRA BALE GEDE            | Jalan Untung Surapati<br>Kel. Padangkerta -<br>Amlapura - Karang<br>Asem (Kab.) - Bali                     | 1.403.216.386,70        | 412.186.549    | Sudah Selesai | APBD<br>(DAK) |
|    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 14         | Pengawasan/Supervisi Rehabilitasi Jaringan Irigasi                                | 290.260.000    | 290.257.000      | CV. TRI MATRA DISAIN           | Jalan Subur Gg. Mirah<br>Cempaka II No. 17<br>Denpasar/Jln. Gatsu<br>I/VII No. 3B Lt.I<br>Denpasar         | 225.060.000             | 65.197.000     | Sudah Selesai | APBD<br>(DAK) |
|    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 15         | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jembong  | 1.278.218.032  | 1.278.211.111    | PT General Technics            | Jl. Pantai Baru, Banjar<br>Dinas Dharma Yasa,<br>Tukadmungga,<br>Buleleng - Buleleng<br>(Kab.) - Bali      | 969.756.731,69          | 308.454.379    | Sudah Selesai | APBD<br>(DAK) |
|    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 16         | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kayu Putih                                     | 1.085.277.884  | 1.085.277.777    | CV. Perdana Niaga              | Jalan Pulau Irian Gg.<br>Anggur No. 5 Singaraja -<br>Buleleng (Kab.) - Bali                                | 802.742.408,12          | 282.535.369    | Sudah Selesai | APBD<br>(DAK) |
|    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 17         | Pemuktahiran Sistem Informasi/ Data Base Jaringan Irigasi di Kabupaten Buleleng   | 130.000.000    | 129.932.440,00   | CV. Yogawidya Sarana<br>Desain | Jalan Nagasari No. 3x,<br>Kel. Penatih Dangin<br>Puri, Kec. Denpasar<br>Timur, Kota Denpasar               | 99.976.360              | 29.956.080     | Sudah Selesai | APBD<br>(DAK) |
|    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 18         | Peningkatan Jalan Celukan Bawang - Pelabuhan                                      | 3.905.000.000  | 3.904.997.783,65 | PT. BERAWANTANGI               | JL. PADANG MEKAR<br>NO. 3X - Denpasar<br>(Kota) - Bali   | 3.008.864.744,74        | 896.133.039    | Sudah Selesai | APBD<br>(DAK) |
|    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 19         | Peningkatan Jalan Lebah Siung Pancoran  | 4.725.000.000  | 4.724.994.442    | PT.DHARMA BUANA KARYA          | JALAN A.YANI<br>AMLAPURA - Karang<br>Asem (Kab.) - Bali  | 3.754.132.249,94        | 970.862.192    | Sudah Selesai | APBD<br>(DAK) |
|    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 20         | Peningkatan Jalan Pulau Komodo  | 5.544.000.000  | 5.543.999.214,2  | PT.DHARMA BUANA KARYA          | JALAN A.YANI<br>AMLAPURA - Karang<br>Asem (Kab.) - Bali  | 4.280.895.938,62        | 1.263.103.276  | Sudah Selesai | APBD<br>(DAK) |
|    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 21         | Peningkatan Jalan SP3. Tigawasa - Uma Sendi - Bingin Banjah                       | 8.750.000.000  | 8.749.999.192,15 | PT. DUARA BALI                 | Jl. Bung tomo A.3<br>Denpasar - Denpasar<br>(Kota) - Bali  | 6.835.332.554,92        | 1.914.666.637  | Sudah Selesai | APBD<br>(DAK) |
|    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 22         | Pembangunan Jembatan Pangkung Dalem Ruas Jalan SP3. Gitgit - Wanagiri             | 8.956.500.000  | 8.956.496.181,88 | PT.ADI MURTI                   | Jalan Plawa No. 37<br>Denpasar Bali  | 6.810.504.951,37        | 2.145.991.231  | Sudah Selesai | APBD<br>(DAK) |
|    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 23         | Penggantian Jembatan Tukad Buleleng Ruas Jalan Bakung - Sari Mekar - Padang Bulia | 6.806.668.000  | 6.806.664.729,67 | BIMA AGUNG                     | Jl. Bima I / 1B<br>Semarang - Semarang<br>(Kota) - Jawa Tengah   | 5.055.347.178,98        | 1.751.317.551  | Sudah Selesai | APBD<br>(DAK) |
|    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 24         | Pembangunan Jembatan Tukad Daya Ruas Jalan SP3. JN. Tikungan Bungkulan - Jembatan | 3.232.383.000  | 3.232.364.539,97 | PT. TRI ASA CITRA ABADI        | Jl. Raya Sading No. 25<br>A, Lingk. Karang<br>Suwung, Sading,<br>Mengwi - Badung -<br>Badung (Kab.) - Bali | 2.362.287.065,85        | 870.077.474    | Sudah Selesai | APBD<br>(DAK) |
|    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 25         | Pengawasan/Supervisi Pembangunan SPAM Air Sanih                                   | 250.000.000    | 249.819.900      | PT. KENCANA ADHI KARMA         | JL. BATUSARI NOMOR<br>15 DENPASAR -<br>Denpasar (Kota) - Bali  | 173.723.000             | 76.096.900     | Sudah Selesai | APBD          |
|    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 26         | Pembangunan SPAM Air Sanih  | 14.720.372.100 | 14.748.108.893   | PT.Karya Dewata Sarwa Indah    | Jalan Kargo Pasar<br>No. 18 Denpasar -<br>Denpasar (Kota) -<br>Bali  | 10.312.086.773,91       | 4.436.022.119  | Sudah Selesai | APBD          |

| NO | NAMA SATKER                         | NAMA PAKET |   | PAGU            | HPS              | Nama Pemenang         | Alamat  | Nilai Hasil Tender(Rp.) | Efisiensi Rp.) | PROSES/BLELUM | SUMBER DANA |
|----|-------------------------------------|------------|---|-----------------|------------------|-----------------------|---|-------------------------|----------------|---------------|-------------|
|    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 27         | Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sanda  | 755.756.261     | 755.756.260,68   | CV Graha Palimanan    | jln.Gunung Rinjani Blok IIA No. 4 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali  | 587.119.367,18          | 168.636.894    | Sudah Selesai | APBD        |
|    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 28         | Pengadaan Air Baku Desa Banyupoh  | 2.364.000.000   | 2.363.887.288,15 | CV. Lissjaya Utama    | Griya Panji Asri Blok P/5 Panji- Singaraja - Buleleng - Buleleng (Kab.) - Bali                                  | 1.891.109.830,40        | 472.777.458    | Sudah Selesai | APBD        |
|    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 29         | Pembangunan Gedung Rawat Jalan, Gedung Rawat Inap dan Bangunan Penunjang RSUD Kabupaten Buleleng                      | 100.000.000.000 |                  |                       |   |                         | -              | Belum Proses  | APBD        |
|    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 30         | Rehabilitasi Gedung dan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Buleleng   | 1.290.000.000   | 1.289.855.694    | PT. JAYA GRAHA UTAMA  | Jl. Siulan No.237 Penatih Dangin Puri, Denpasar - Denpasar (Kota) - Bali  | 1.002.259.525,45        | 287.596.169    | Sudah Selesai | APBD        |
|    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 31         | Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Bebetin - Sekumpul  | 655.704.000     | 655.683.249,53   | CV. Lissjaya Utama    | Griya Panji Asri Blok P/5 Panji- Singaraja - Buleleng - Buleleng (Kab.) - Bali                                  | 457.103.036,95          | 198.580.213    | Sudah Selesai | APBD        |
|    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 32         | Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Sekumpul – Lemukih  | 364.608.000     | 364.601.516,97   | cv.inersia            | BR. SEMANA, SINGAKERTA, UBUD, GIANYAR - Badung (Kab.) - Bali  | 246.465.334,12          | 118.136.183    | Sudah Selesai | APBD        |
|    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 33         | Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Sp3. Munduk - Munduk - Dusun Tamblingan   | 276.318.000     | 276.296.314,79   | CV. KRISNA PUTRA BALI | Wisma Arya Lantai I Blok 2, Jalan Pulau Irian No.36 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali                          | 194.900.000,00          | 81.396.315     | Sudah Selesai | APBD        |
|    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 34         | Rehabilitasi Jalan Asah Munduk- Pura Gubug  | 2.500.870.500   | 2.500.869.720,52 | PT SARI SENTANA ARKA  | Jalan Pasekan No. 4 Br. Kapal - Ds. Batubulan Kangin, Kec. Sukawati - Kab. Gianyar - Gianyar (Kab.) - Bali      |                         | 2.500.869.721  | Dalam Proses  | APBD        |
|    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 35         | Rehabilitasi Jalan Kayu Putih - Banyuatis   | 1.510.187.500   | 1.510.185.853,26 | PT. BERAWANTANGI      | JL. PADANG MEKAR NO. 3X - Denpasar (Kota) - Bali  |                         | 1.510.185.853  | Dalam Proses  | APBD        |
|    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 36         | Pendampingan Pemenuhan Persyaratan dan Pembahasan untuk Persetujuan Substansi Perda RTRW Kabupaten                    | 284.900.000     | 284.899.998,90   | CV. TRI MATRA DISAIN  | Jalan Subur Gg. Mirah Cempaka II No. 17 Denpasar/Jln. Gatsu I/VII No. 3B Lt.I Denpasar - Denpasar (Kota) - Bali | 264.154.000             | 20.745.999     | Sudah Selesai | APBD        |
|    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 37         | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Padang Keling  | 1.999.892.031   | 1.999.892.031    | CV. Sandi Yudha       | Jl. Yudistira No.10 kendran - Buleleng (Kab.) - Bali  | 1.564.907.124,48        | 434.984.907    | Sudah Selesai | APBD (DAK)  |
|    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 38         | Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Rawat Jalan, Gedung Rawat Inap dan Bangunan Penunjang RSUD Kabupaten Buleleng | 2.500.000.000   |                  |                       |   |                         | -              | Belum Proses  | APBD        |
|    | JUMLAH 8                            | 38         |   | 186.024.865.361 | 83.546.223.943   | -                     | -   | 59.546.517.690          | 23.999.706.253 |               |             |
| 9  | KECAMATAN BULELENG                  | 1          | Belanja Natura dan Pakan-Natura   | 294.285.000     |                  |                       |   |                         | -              | Belum Proses  | APBD        |
|    | KECAMATAN BULELENG                  | 2          | Belanja Natura dan Pakan-Natura   | 208.917.700     |                  |                       |   |                         | -              | Belum Proses  | APBD        |
|    | JUMLAH 09                           | 2          |   | 503.202.700     | -                | -                     | -   | -                       | -              |               |             |
| 10 | DINAS KESEHATAN                     | 1          | BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG KANTOR.   | 4.567.500.000   | 4.567.499.000    |                       |   |                         | 4.567.499.000  | Dalam Proses  | APBD        |
|    | DINAS KESEHATAN                     | 2          | Belanja Modal alat kedokteran umum  | 449.000.400     | 442.161.667      | PT. BALI WAHYU ABADI  | Jl Gatot Subroto IID No 3 Denpasar - Denpasar (Kota) - Bali   | 438.900.000             | 3.261.667      | Sudah Selesai | APBD (DAK)  |

| NO | NAMA SATKER     | NAMA PAKET |   | PAGU           | HPS              | Nama Pemenang          | Alamat   | Nilai Hasil Tender(Rp.) | Efisiensi Rp.) | PROSES/BLELUM | SUMBER DANA |
|----|-----------------|------------|---|----------------|------------------|------------------------|--|-------------------------|----------------|---------------|-------------|
|    | DINAS KESEHATAN | 3          | Belanja Modal Alat Kesehatan umum lainnya   | 1.935.000.000  | 1.691.561.829    | MUTIARA BERSAUDARA     | JL. RAYA DEKET WETAN NO. 246 DEKET - Lamongan (Kab.) - Jawa Timur                                    | 1.247.400.000,00        | 444.161.829    | Sudah Selesai | APBD (DAK)  |
|    | DINAS KESEHATAN | 4          | BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN  | 327.360.000    |                  |                        |  |                         | -              | Belum Proses  | APBD        |
|    | DINAS KESEHATAN | 5          | Belanja Modal Alat Kesehatan umum lainnya   | 3.897.574.000  | 3.897.573.999,95 |                        |  |                         | 3.897.574.000  | Dalam Proses  | APBD (DAK)  |
|    | DINAS KESEHATAN | 6          | BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR.                                       | 519.590.390    |                  |                        |  |                         | -              | Belum Proses  | APBD        |
|    | DINAS KESEHATAN | 7          | BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA  | 536.998.000    |                  |                        |  |                         | -              | Belum Proses  | APBD        |
|    | DINAS KESEHATAN | 8          | Belanja Jasa Kalibrasi  | 241.017.000    |                  |                        |  |                         | -              | Belum Proses  | APBD        |
|    | DINAS KESEHATAN | 9          | Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium  | 3.286.295.735  |                  |                        |  |                         | -              | Gagal Tender  | APBD (DAK)  |
|    | DINAS KESEHATAN | 10         | BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA.   | 261.525.000    |                  |                        |  |                         | -              | Belum Proses  | APBD        |
|    | DINAS KESEHATAN | 11         | BELANJA PEMELIHARAAN INSTALASI-INSTALASI AIR KOTOR-INSTALASI AIR KOTOR LAINNYA.                   | 299.200.000    |                  |                        |  |                         | -              | Belum Proses  | APBD        |
|    | DINAS KESEHATAN | 12         | Belanja Jasa Konsultan Perencana Arsitektur-<br>Jasa Desain Arsitektur                            | 301.200.000    |                  |                        |  |                         | -              | Gagal Tender  | APBD (DAK)  |
|    | DINAS KESEHATAN | 13         | Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Rekayasa-<br>Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung | 65.904.265     |                  |                        |  |                         | -              | Belum Proses  | APBD        |
|    | DINAS KESEHATAN | 14         | BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN ARSITEKTUR JASA DESAIN ARSITEKTURAL.                         | 465.519.600    | 421.520.000      | PT MITRA TRI SAKTI     | JL. BUANA RAYA Gg. MEGA BUANA NO. 11 A PADANG SAMBIAN DENBAR - Badung (Kab.) - Bali                  | 378.763.000             | 42.757.000     | Sudah Selesai | APBD        |
|    | DINAS KESEHATAN | 15         | BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REKAYASA JASA PENGAWAS PEKERJAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG.  | 293.671.980    | 252.081.500      | T. KENCANA ADHI KARM   | JL. BATUSARI NOMOR 15 DENPASAR - Denpasar (Kota) - Bali  | 220.225.500             | 31.856.000     | Sudah Selesai | APBD        |
|    | DINAS KESEHATAN | 16         | (1.02.02.2.02.18) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus   | 650.000.000    | 649.485.000      | PT. Riasen Ary Wirawan | Perum Dalung Permai Blok K3 No. 12 Dalung - Badung - Badung (Kab.) - Bali                            | 620.400.000             | 29.085.000     | Sudah Selesai | APBD (DAK)  |
|    | DINAS KESEHATAN | 17         | Belanja modal alat kedokteran Lainnya   | 1.600.000.000  | 1.599.653.333,31 | PT CML METRO MEDIKA    | L. Raya Dalung No. 39B. Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Badung - Bali - Badung (Kab.) - Bali | 1.448.480.000           | 151.173.333    | Sudah Selesai | APBD (DAK)  |
|    | DINAS KESEHATAN | 18         | BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT.  | 236.300.000    |                  |                        |  |                         | -              | Belum Proses  | APBD        |
|    | DINAS KESEHATAN | 19         | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya   | 330.000.000    | 330.000.000      |                        |  |                         |                | Dalam Proses  | APBD (DAK)  |
|    | JUMLAH 10       | 19         |   | 20.263.656.370 | 13.521.536.329   | -                      | -  | 4.354.168.500           | 9.167.367.829  |               |             |

| NO        | NAMA SATKER                                      | NAMA PAKET |  | PAGU          | HPS              | Nama Pemenang          | Alamat  | Nilai Hasil Tender(Rp.) | Efisiensi Rp.) | PROSES/BLELUM | SUMBER DANA |
|-----------|--|------------|--|---------------|------------------|------------------------|---|-------------------------|----------------|---------------|-------------|
| 11        | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 1          | BELANJA /ALAT BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR ALAT TULIS KANTOR.   | 760.407.487   | 640.690.875      | CV. Delina             | JALAN BATANGHARI NO 9A DENPASAR - Denpasar (Kota) - Bali  | 442.786.234             | 197.904.641    | Sudah Selesai | APBD        |
|           | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 2          | PENGADAAN BAHAN KOMPUTER(TONER, TINTA, CATRIDGE)   | 628.266.740   | 458.972.008      | CV ANDAR JAVAS INTI    | Gondanglegi RT02/RW 22, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta - Sleman (Kab.) - DI Yogyakarta | 379.335.000             | 79.637.008     | Sudah Selesai | APBD        |
|           | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 3          | PENGADAAN CETAK BLANGKO.   | 265.041.330   | 219.012.757      | CV. MAHA TIRTA         | JALAN GAJAH MADA NO. 79 - Buleleng (Kab.) - Bali  | 167.541.000             | 51.471.757     | Sudah Selesai | APBD        |
|           | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 4          | PENGADAAN CETAK BUKU DAN FOTO COPY.  | 944.231.677   | 758.911.032      | UD. SUDIRMAN GRAFIKA   | JL. SUDIRMAN GG.VI/ 5D, SINGARAJA, BULELENG, BALI - Buleleng (Kab.) - Bali                        | 538.119.540,20          | 220.791.492    | Sudah Selesai | APBD        |
| JUMLAH 11 |  | 4          |  | 2.597.947.234 | 2.077.586.672    | 0                      | 0   | 1.527.781.774           | 549.804.897    |               |             |
| 12        | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA            | 1          | BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN BELANJA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 CEMPAGA,DAN BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 PEDAWA           | 1.236.661.200 | 1.234.077.349,93 | CV. PUTRA CATUR DEWATA | JALAN ACHMAD YANI NO 135 A SINGARAJA - Buleleng (Kab.) - Bali                                     | 1.007.896.078,81        | 226.181.271    | Sudah Selesai | APBD (DAK)  |
|           | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA            | 2          | Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 1 Paket Agung, SDN 2 Anturan, SDN 3 Pegayaman  | 1.801.688.400 | 1.664.824.086,39 | KRESNA DWIPA CV        | Br.Metra Kelod, Ds.Yangapi, Tembuku,Bangli - Bangli (Kab.) - Bali                                 | 1.394.941.508,65        | 269.882.578    | Sudah Selesai | APBD (DAK)  |
|           | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA            | 3          | Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 1 Bongancina, SDN 4 Tista, SDN 3 Kedis, dan SDN 3 Busungbiu  | 2.046.702.000 | 2.011.759.607,41 | CV. KARYA SENTOSA      | JALAN BILAWA NO 49 DESA PERANCAK, JEMBRANA - BALI. - Jembrana (Kab.) - Bali                       | 1.609.422.223,70        | 402.337.384    | Sudah Selesai | APBD (DAK)  |
|           | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA            | 4          | Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 4 Sumberkima, SDN 2 Penyabangan, SDN 1 Ringdikit dan SDN 1 Pengastulan   | 1.918.095.200 | 1.881.673.480,36 | CV. BUMI RAYA          | JALAN JALAK NO 12 SINGARAJA - Buleleng (Kab.) - Bali  | 1.542.010.045,12        | 339.663.435    | Sudah Selesai | APBD (DAK)  |
|           | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA            | 5          | Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 4 Kubutambahan, SDN 1 Sangsit dan SDN 3 Suwug  | 1.752.688.400 | 1.741.761.737,80 | CV Dema Karya Mandiri  | Jalan Pulau Komodo Gg Kresna No 15 Kelurahan Banyuning - Buleleng (Kab.) - Bali                   | 1.478.712.411,43        | 263.049.326    | Sudah Selesai | APBD (DAK)  |
|           | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA            | 6          | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Belanja Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 3 Les, Belanja Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 3 Tembok, Belanja Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 5 Les | 1.182.061.200 | 1.179.607.169,94 | CV. Adi Putra          | Jl. Gunung Batur Gang II No. 1 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali                                 | 925.022.928,54          | 254.584.241    | Sudah Selesai | APBD (DAK)  |



| NO | NAMA SATKER                           | NAMA PAKET |   | PAGU          | HPS              | Nama Pemenang         | Alamat  | Nilai Hasil Tender(Rp.) | Efisiensi Rp.) | PROSES/BLELUM | SUMBER DANA |
|----|---------------------------------------|------------|---|---------------|------------------|-----------------------|---|-------------------------|----------------|---------------|-------------|
|    | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | 7          | Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas dan Pembangunan perpustakaan SDN 3 Bondalem   | 603.739.500   | 602.240.958,21   | PT. Glebeg Bali Utama | Jl. Kargo Indah II No 11 Denpasar - Denpasar (Kota) - Bali                                | 471.710.666,82          | 130.530.291    | Sudah Selesai | APBD (DAK)  |
|    | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | 8          | BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH SDN 1 BANJAR TEGAL, PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH SDN 1 SUKASADA, PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH SDN 1 GALUNGAN, PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH SDN 2 GALUNGAN, PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH SDN 2 TEJAKULA, PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH SDN 4 BONDALEM  | 1.300.314.600 | 1.300.298.293    | CV. KARYA SENTOSA     | JALAN BILAWA NO 49 DESA PERANCAK, JEMBRANA - BALI. - Jembrana (Kab.) - Bali               | 1.040.263.732,12        | 260.034.561    | Sudah Selesai | APBD (DAK)  |
|    | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | 9          | BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN PEMBANGUNAN RUANG GURU SD N 4 GOBLEG DAN BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN PEMBANGUNAN RUANG GURU SD N 1 BEBETIN  | 449.556.000   | 448.822.281,37   | CV. SUWASTIKA JAYA    | Jalan Ratulangi Depan Terminal No.8 - Buleleng (Kab.) - Bali                              | 360.762.824,70          | 88.059.457     | Sudah Selesai | APBD (DAK)  |
|    | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | 10         | Belanja Modal Rehabilitasi ruang laboratorium IPA, Rehabilitasi ruang kelas,dan Rehabilitasi toilet (jamban) SMPN 1 Sukasada dan Rehabilitasi ruang kelas SMPN 3 Sukasada   | 1.024.502.000 | 1.010.209.082,78 | CV. ADI YASA          | JALAN PULAU IRIAN DSN. KAJANAN DESA PENGELATAN - BULELENG - Buleleng (Kab.) - Bali        | 767.154.259,64          | 243.054.823    | Sudah Selesai | APBD (DAK)  |
|    | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | 11         | BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG KELAS SMPN SATU ATAP 3 SUKASADA, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG GURU SMP NEGERI SATU ATAP 3 SUKASADA, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI PERPUSTAKAAN SEKOLAH SMPN SATU ATAP 3 SUKASADA, DAN BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI TOILET/JAMBAAN SMPN SATU ATAP 3 SUKASADA | 1.001.000.000 | 981.693.193,45   | CV SARI KARYA         | Tanah Kapling Banyuning Tengah,Kelurahan Banyuning,Kab. Buleleng - Buleleng (Kab.) - Bali | 750.158.938,78          | 231.534.255    | Sudah Selesai | APBD (DAK)  |
|    | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | 12         | Belanja Modal Rehabilitasi ruang guru, Rehabilitasi ruang kelas dan Rehabilitasi ruang UKS SMPN 1 Banjar dan Rehabilitasi ruang laboratorium komputer SMPN 2 Busungbiu  | 1.216.871.600 | 1.199.646.322,74 | PT. Glebeg Bali Utama | Jl. Kargo Indah II No 11 Denpasar - Denpasar (Kota) - Bali                                | 928.795.011,06          | 270.851.312    | Sudah Selesai | APBD (DAK)  |
|    | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | 13         | Belanja Modal Rehabilitasi ruang kelas, Rehabilitasi toilet (jamban) SMPN 1 Kubutambahan dan Rehabilitasi ruang kelas, Rehabilitasi toilet (jamban), Rehabilitasi ruang UKS SMPN 1 Sawan serta Rehabilitasi ruang kelas SMPN 4 Sawan  | 2.175.331.400 | 2.121.585.724,20 | CV. Lissjaya Utama    | Griya Panji Asri Blok P/5 Panji- Singaraja - Buleleng - Buleleng (Kab.) - Bali            | 1.638.885.855,80        | 482.699.868    | Sudah Selesai | APBD (DAK)  |

| NO | NAMA SATKER                           | NAMA PAKET |   | PAGU          | HPS              | Nama Pemenang         | Alamat   | Nilai Hasil Tender(Rp.) | Efisiensi Rp.) | PROSES/BLELUM | SUMBER DANA |
|----|---------------------------------------|------------|---|---------------|------------------|-----------------------|--|-------------------------|----------------|---------------|-------------|
|    | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | 14         | Belanja Modal Rehabilitasi ruang kelas SMPN 1 Seririt dan Rehabilitasi ruang kelas, Rehabilitasi toilet (jamban) dan Rehabilitasi ruang laboratorium IPA serta Rehabilitasi ruang perpustakaan SMPN 4 Gerokgak  | 2.095.579.000 | 2.036.555.721,77 | CV.KEMBAR SARI SEDANA | Jl.P Menjangan Perum Banyuning Permai Blok A/10 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali | 1.628.737.434,10        | 407.818.288    | sudah Selesai | APBD (DAK)  |
|    | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | 15         | Belanja Modal Rehabilitasi ruang kelas, Rehabilitasi toilet (jamban) SMPN 2 Singaraja dan Rehabilitasi ruang kelas SMPN 3 Singaraja dan Rehabilitasi ruang laboratorium komputer, Rehabilitasi ruang guru SMPN 6 Singaraja  | 2.088.711.000 | 2.016.372.567    | CV.KEMBAR SARI SEDANA | Jl.P Menjangan Perum Banyuning Permai Blok A/10 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali | 1.597.638.514,18        | 418.734.053    | Sudah Selesai | APBD (DAK)  |
|    | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | 16         | BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG KELAS SMPN 5 SINGARAJA, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG GURU SMP NEGERI 5 SINGARAJA, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG KELAS SMPN 7 SINGARAJA, DAN BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI LABORATORIUM IPA SMPN 7 SINGARAJA  | 1.552.819.000 | 1.516.178.980,42 | CV. Lissjaya Utama    | Griya Panji Asri Blok P/5 Panji- Singaraja - Buleleng - Buleleng (Kab.) - Bali     | 1.112.107.937,36        | 404.071.043    | Sudah Selesai | APBD (DAK)  |
|    | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | 17         | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rehabilitasi ruang kelas, Rehabilitasi Ruang Guru dan Kepala Sekolah, Pembangunan area bermain TK Negeri Pembina Singaraja, dan Rehabilitasi ruang kelas TK N Pembina Kec. Sukasada   | 649.162.000   | 625.548.857,88   | CV. Dewata Karya      | Br. Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali           | 492.614.579,82          | 132.934.278    | Sudah Selesai | APBD (DAK)  |
|    | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | 18         | BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG KELAS TK NEGERI PEMBINA KEC. GEROKGAK, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG GURU DAN KEPALA SEKOLAH TK NEGERI PEMBINA KEC. GEROKGAK , BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN PEMBANGUNAN AREA BERMAIN TK N DESA PANGKUNPARUK, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG KELAS TK N DESA PANGKUNPARUK, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG KELAS TK NEGERI DESA MUNDUK BESTALA | 1.032.371.750 | 1.019.196.998,34 | CV. SARI MERTA BAWA   | BR. DINAS UMASARI KAUH, PERING SARI, SELAT - Karang Asem (Kab.) - Bali             | 815.357.598,83          | 203.839.400    | Sudah Selesai | APBD (DAK)  |
|    | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | 19         | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rehabilitasi ruang kelas TK Negeri Desa Banjar dan Rehabilitasi ruang kelas, Rehabilitasi Ruang Guru dan Kepala Sekolah TK N Desa Pedawa dan Pembangunan area bermain TK N Pembina Kec. Banjar  | 813.941.000   | 801.509.564,09   | CV. SANTOSA           | Jalan Yudistira No. 37 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali                          | 604.608.605             | 196.900.959    | Sudah Selesai | APBD (DAK)  |

| NO | NAMA SATKER   | NAMA PAKET |   | PAGU            | HPS             | Nama Pemenang                                      | Alamat   | Nilai Hasil Tender(Rp.) | Efisiensi Rp.) | PROSES/BLELUM | SUMBER DANA |
|----|---|------------|---|-----------------|-----------------|--|--|-------------------------|----------------|---------------|-------------|
|    | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA   | 20         | BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG KELAS TKN DESA BONTIHING, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG KELAS TKN DESA TAMBAKAN, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI TOILET (JAMBAN) TKN DESA TAMBAKAN | 575.566.300     | 546.215.240,47  | CV. SANTOSA  | Jalan Yudistira No. 37<br>Singaraja - Buleleng<br>(Kab.) - Bali  | 403.701.119,67          | 142.514.121    | Sudah Selesai | APBD (DAK)  |
|    | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA   | 21         | Pengadaan Media Pendidikan SMP  | 393.600.000     |                 |  |  |                         |                | Batal         | APBD (DAK)  |
|    | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA   | 22         | Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi (TIK) SMP   | 240.250.000     |                 |  |  |                         |                | Batal         | APBD (DAK)  |
|    | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA   | 23         | Pengadaan Media Pendidikan SD   | 516.600.000     |                 |  |  |                         |                | Batal         | APBD (DAK)  |
|    | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA   | 24         | Kain Seragam Merah Putih dan Kain Seragam   | 700.150.000     |                 |  |  |                         |                | Belum Proses  | APBD        |
|    | JUMLAH 12   | 24         |   | 28.367.961.550  | 25.939.777.218  | -  | -  | 20.570.502.274          | 5.369.274.944  |               |             |
| 13 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 1          | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 300.000.000     | 299.761.200     | CV. Serba Lancar Abadi                             | Jl. WR. Supratman No. 412,<br>Penarukan Buleleng, Bali -<br>Buleleng (Kab.) - Bali   | 297.146.500             | 2.614.700      | Sudah Selesai | APBD (DAK)  |
|    | JUMLAH 13   | 1          |   | 300.000.000     | 299.761.200     | -  | -  | 297.146.500             | 2.614.700      |               |             |
| 14 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                      | 1          | Belanja Akomodasi Pelatihan Dasar CPNS  | 1.270.080.000   | 1.270.080.000   | PT MADE BALI (HOTEL MADE BALI), PT NUSA INDAH BALI | JL RAYA SEMPIDI NO 41<br>BADUNG 80351 BALI<br>INDONESIA, JL<br>WARIBANG NO 99<br>KESIMAN PETILAN<br>DENPASAR TIMUR BALI      | 1.179.360.000           | 90.720.000     | Sudah Selesai | APBD        |
|    | JUMLAH 14   | 1          |   | 1.270.080.000   | 1.270.080.000   | -  | -  | 1.179.360.000           | 90.720.000     |               |             |
| 15 | DINAS PERTANIAN   | 1          | Belanja Barang Untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID 19   | 307.500.000     | 307.264.500     | SUDARMA BALI UTAMA                                 | Jl. Diponegoro gg.<br>Camar no 5 seririt -<br>Buleleng (Kab.) - Bali   | 292.928.400             | 14.336.100     | Sudah Selesai | APBN        |
|    | DINAS PERTANIAN   | 2          | Belanja Modal Personal Computer - Komputer Personal   | 264.000.000     | 259.776.000     | cv alzika rakasa                                   | Jalan Otto<br>Iskandardinata No.<br>277 RT 004/ RW 002<br>Kel. Balong Gede<br>Kec. Regol -<br>Bandung (Kota) -<br>Jawa Barat | 200.631.200             | 59.144.800     | Sudah Selesai | APBD (DAK)  |
|    | DINAS PERTANIAN   | 3          | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman   | 489.900.000     |                 |  |  |                         |                | Dalam Proses  | APBD        |
|    | JUMLAH 15   | 3          |   | 571.500.000     | 567.040.500     | -  | -  | 493.559.600             | 73.480.900     |               |             |
|    |   |            |   |                 |                 |  |  |                         |                |               |             |
|    |   |            |   |                 |                 |  |  |                         |                |               |             |
|    | TOTAL   | 111        |   | 262.804.240.927 | 147.845.306.875 | -  | -  | 106.658.105.669         | 41.187.201.206 |               |             |

## MONITORING KONTRAK 2021

| NO | NAMA SATKER                         | NAMA PAKET   | PENYEDIA/ALAMAT   | NILAI KONTRAK  | SUMBER DANA | NO. KONTRAK                         | TANGGAL MULAI PELAKSANAAN | JANGKA WAKTU PELAKSANAAN | JULI         |                 |                |
|----|-------------------------------------|--|---|----------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|----------------|
|    |                                     |  |   |                |             |                                     |                           |                          | Target Fisik | Realisasi FISIK | Realisasi KEU. |
| 1  | 2                                   | 3  | 4   | 5              | 6           | 7                                   | 8                         | 9                        | 10           | 11              | 12             |
| 1  | SEKRETARIAT DAERAH                  | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan  | PT Agung Automall JALAN CUT MUTIAH NO 14 MENTENG JAKARTA PUSAT 10330 - Jakarta Pusat (Kota) - DKI Jakarta | 404.600.000    | APBD        | 027/24/III/PPK/2021 (30 MARET 2021) | 27-Apr-21                 | 30 hari                  | 100%         | 100%            | 404.600.000    |
| 2  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP              | Belanja jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawasan Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung      | PT. KENCANA ADHI KARMA JL. BATUSARI NOMOR 15 DENPASAR - Denpasar (Kota) - Bali                            | 409.041.600    | APBD        | 600/05/PA-DLH/2021                  | 11-Mei-21                 | 210 hari kalender        | 17,52%       | 26,54%          |                |
| 3  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP              | Belanja Modal Taman (Pembangunan RTH Taman Bung Karno Tahap IV   | PT. SANUR JAYA UTAMA Jalan Setia Budi, Kuta - Badung - Badung (Kab.) - Bali                               | 15.027.351.458 | APBD        | 600/07/PA-DLH/2021                  | 11-Mei-21                 | 210 hari kalender        | 17,52%       | 26,54%          |                |
| 4  | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH             | BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - ALAT TULIS KANTOR.  | UD TRESNA JAYA Jalan Ahmad Yani No.5 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali                                   | 236.935.530    | APBD        | 027/738.11/2021 (18 maret 2021)     | 18-Mar-21                 | 275 hari kalender        | 60%          | 70,86%          | Rp 111.270.222 |
| 5  | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH             | BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA.   | UD TRESNA JAYA Jalan Ahmad Yani No.5 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali                                   | 265.402.609    | APBD        | 027/1074.3/2021 (28 april 2021)     | 28-Apr-21                 | 243 hari kalender        | 42%          | 50,00%          | Rp 40.428.000  |
| 6  | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH             | BELANJA NATURA DAN PAKAN - NATURA.   | CV KARYA SARI SEDANA Banjar Dinas Sari Tapak Dara Kubutambahan, Buleleng - Buleleng (Kab.) - Bali         | 612.113.200    | APBD        | 027/1833.3.2021 930 juni 2021)      | 30-Jun-21                 | 184 hari kalender        | 15%          | 24,32%          |                |
| 7  | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH             | BELANJA MODAL ASET TETAP DALAM RENOVASI.   | CV. Dewata Karya Br. Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali                 | 357.207.881,07 | APBD        | 027/1947/2021 (12 Juli 2021)        | 14-Jul-21                 | 60 hari kalender         | 25%          | 40,00%          |                |
| 8  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Supervisi Konstruksi Pembangunan Jembatan Pangkung Dalem Ruas Jalan SP3. Gitgit - Wanagiri             | PT. KENCANA ADHI KARMA JL. BATUSARI NOMOR 15 DENPASAR - Denpasar (Kota) - Bali                            | 230.814.650    | APBD (DAK)  | 620/2507.12/IV/2021 (19 april 2021) | 18-Mei-21                 | 210 hari kalender        | 12,68%       | 1,40%           |                |
| 9  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Supervisi Konstruksi Penggantian Jembatan Tukad Buleleng Ruas Jalan Bakung - Sari Mekar - Padang Bulia | PT. KENCANA ADHI KARMA JL. BATUSARI NOMOR 15 DENPASAR - Denpasar (Kota) - Bali                            | 178.195.000    | APBD (DAK)  | 620/2502/IV/2021 (19-04-2021)       | 19-Mei-21                 | 180 hari kalender        | 6,46%        | 4,01%           |                |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Supervisi Konstruksi Peningkatan Jalan SP3. Tigawasa - Uma Sendi - Bingin Banjar                       | PT MITRA TRI SAKTI JL. BUANA RAYA Gg. MEGA BUANA NO. 11 A PADANG SAMBIAN DENBAR - Badung (Kab.) - Bali    | 102.286.800    | APBD (DAK)  | 620/1891/III/2021 (24 maret 2021)   | 30-Mar-21                 | 150 hari kalender        | 46,24%       | 36,24%          |                |

| NO | NAMA SATKER                         | NAMA PAKET   | PENYEDIA/ALAMAT  | NILAI KONTRAK | SUMBER DANA | NO. KONTRAK                       | TANGGAL MULAI PELAKSANAAN | JANGKA WAKTU PELAKSANAAN | JULI         |                 |                  |
|----|-------------------------------------|--|--|---------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|------------------|
|    |                                     |  |  |               |             |                                   |                           |                          | Target Fisik | Realisasi FISIK | Realisasi KEU.   |
| 1  | 2                                   | 3  | 4  | 5             | 6           | 7                                 | 8                         | 9                        | 10           | 11              | 12               |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Supervisi Konstruksi Pembangunan Jembatan Tukad Daya Ruas Jalan SP3. JN. Tikungan Bungkulan - Jembatan | PT MITRA TRI SAKTI JL. BUANA RAYA Gg. MEGA BUANA NO. 11 A PADANG SAMBIAN DENBAR - Badung (Kab.) - Bali                     | 148.365.800   | APBD        | 620/2504/IV/2021 (19 april 2021)  | 19/04/2021                | 150 hari kalender        | 4,48%        | 5,14%           |                  |
| 12 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Peningkatan SPAM Perdesaan Desa Kayu Putih   | CV. PUTRA BALI TIMUR Jalan Sakura I Kelurahan Semarapura Klod Klungkung - Klungkung (Kab.) - Bali                          | 658.100.000   | APBD (DAK)  | 690/2649/IV/2021                  | 27/04/2021                | 150 hari kalender        | 63,45%       | 61,42%          | 197.430.000      |
| 13 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Peningkatan SPAM Perdesaan Desa Panji Anom   | CV. ATMA KARYA JALAN KARGO PASAR NO. 14 DENPASAR - Denpasar (Kota) - Bali  | 1.111.888.258 | APBD (DAK)  | 690/2512/IV/2021                  | 20/04/2021                | 150 hari kalender        | 76,73%       | 81,16%          | 333.566.477      |
| 14 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Peningkatan SPAM Perdesaan Desa Tegallingham   | CV. PAYU JAYA SEJAHTERA JALAN TUKAD BALIAN NO. 117 Z RENON, DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR, BALI - Denpasar (Kota) - Bali | 889.845.700   | APBD (DAK)  | 690/2684/IV/2021                  | 28/04/2021                | 150 hari kalender        | 44,41%       | 74,93%          | 266.953.710      |
| 15 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Peningkatan SPAM Perdesaan Desa Tigawasa   | CV. ADI YASA JALAN PULAU IRIAN DSN. KAJANAN DESA PENGILATAN - BULELENG - Buleleng (Kab.) - Bali                            | 1.206.549.631 | APBD (DAK)  | 690/2618/IV/2021                  | 26/04/2021                | 150 hari kalender        | 66,31%       | 66,30%          | 361.964.889      |
| 16 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Peningkatan SPAM Perdesaan Desa Wanagiri   | CV. Kuarsa Teknik Perum Nuansa   | 923.630.000   | APBD (DAK)  | 690/2615/IV/2021                  | 26/04/2021                | 150 hari kalender        | 60,21%       | 55,72%          | 277.089.000      |
| 17 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Pengawasan/Supervisi Rehabilitasi Jaringan Irigasi   | CV. TRI MATRA DISAIN Jalan Subur Gg. Mirah Cempaka II No. 17 Denpasar/Jln. Gatsu I/VII No. 3B Lt.I Denpasar                | 225.060.000   | APBD (DAK)  | 611/3302/V/2021 (19 mei 2021)     | 19-Mei-21                 | 150 hari kalender        |              | 49,33%          |                  |
| 18 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Pemuktahiran Sistem Informasi/ Data Base Jaringan Irigasi di Kabupaten Buleleng                        | CV. Yogawidya Sarana Desain Jalan Nagasari No. 3x, Kel. Penatih Dangin Puri, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar            | 99.976.360    | APBD        | 611/3263/V/2021 (18 mei 2021)     | 18-Mei-21                 | 60 hari kalender         | 100%         | 100%            | 19.995.272       |
| 19 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Peningkatan Jalan Celukan Bawang - Pelabuhan   | PT. BERAWANTANGI JL. PADANG MEKAR NO. 3X - Denpasar (Kota) - Bali  | 3.008.864.745 | APBD (DAK)  | 620/1840/III/2021 (18 maret 2021) | 30-Mar-21                 | 120 hari kalender        | 99,68%       | 94,61%          |                  |
| 20 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Peningkatan Jalan Lebah Siung Pancoran   | PT.DHARMA BUANA KARYA JALAN A.YANI AMLAPURA - Karang Asem (Kab.) - Bali  | 3.754.132.250 | APBD (DAK)  | 620/1843/III/2021 (18 maret 2021) | 30-Mar-21                 | 120 hari kalender        | 94,86%       | 96,75%          | 1.201.322.240    |
| 21 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Peningkatan Jalan Pulau Komodo   | PT.DHARMA BUANA KARYA JALAN A.YANI AMLAPURA - Karang Asem (Kab.) - Bali  | 4.280.895.939 | APBD (DAK)  | 620/1842/III/2021 (18 maret 2021) | 30-Mar-21                 | 120 hari kalender        | 99,85%       | 97,83%          | 1.369.886.400    |
| 22 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Peningkatan Jalan SP3. Tigawasa - Uma Sendi - Bingin Banjah  | PT. DUARA BALI Jl. Bung tomo A.3 Denpasar - Denpasar (Kota) - Bali   | 6.835.332.555 | APBD (DAK)  | 620/1841/III/2021 (18 maret 2021) | 30-Mar-21                 | 150 hari kalender        | 54,68%       | 38,44%          |                  |
| 23 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Pembangunan Jembatan Pangkung Dalem Ruas Jalan SP3. Gitgit - Wanagiri                                  | PT.ADI MURTI Jalan Plawa No. 37 Denpasar Bali  | 6.810.504.951 | APBD (DAK)  | 620/3252/V/2021 (18 mei 2021)     | 18-Mei-21                 | 210 hari kalender        | 12,68%       | 1,40%           | 1.362.100.800,00 |



| NO | NAMA SATKER                         | NAMA PAKET   | PENYEDIA/ALAMAT  | NILAI KONTRAK  | SUMBER DANA | NO. KONTRAK                   | TANGGAL MULAI PELAKSANAAN | JANGKA WAKTU PELAKSANAAN | JULI         |                 |                  |
|----|-------------------------------------|--|--|----------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|------------------|
|    |                                     |  |  |                |             |                               |                           |                          | Target Fisik | Realisasi FISIK | Realisasi KEU.   |
| 1  | 2                                   | 3  | 4  | 5              | 6           | 7                             | 8                         | 9                        | 10           | 11              | 12               |
| 24 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Penggantian Jembatan Tukad Buleleng Ruas Jalan Bakung - Sari Mekar - Padang Bulia                  | BIMA AGUNG Jl. Bima I / 1B Semarang - Semarang (Kota) - Jawa Tengah  | 5.055.347.179  | APBD (DAK)  | 620/3253/V/2021 (18 mei 2021) | 19-Mei-21                 | 180 hari kalender        | 6,46%        | 4,01%           | 1.011.069.400,00 |
| 25 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Pendampingan Pemenuhan Persyaratan dan Pembahasan untuk Persetujuan Substansi Perda RTRW Kabupaten | CV. TRI MATRA DISAIN Jalan Subur Gg. Mirah Cempaka II No. 17 Denpasar/Jln. Gatsu I/VII No. 3B Lt.I Denpasar - Denpasar (Kota) - Bali | 264.154.000    | APBD        | 640/3070/V/2021 (6 MEI 2021)  | 06-Mei-21                 | 120 hari kalender        |              | 40%             |                  |
| 26 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tabang  | CV. PUTRA BALE GEDE Jalan Untung Surapati Kel. Padangkerta - Amlapura - Karang Asem (Kab.) - Bali                                    | 1.403.216.387  | APBD (DAK)  | 611/3300/V/2021 (19 mei 2021) | 19-Mei-21                 | 150 hari kalender        | 47,48%       | 74,03%          |                  |
| 27 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jembong   | PT General Technics Jl. Pantai Baru, Banjar Dinas Dharma Yasa, Tukadmungga, Buleleng - Buleleng (Kab.) - Bali                        | 969.756.732    | APBD (DAK)  | 611/3292/V/2021 (19 mei 2021) | 19-Mei-21                 | 150 hari kalender        | 30,65%       | 20,52%          |                  |
| 28 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kayu Putih  | CV. Perdana Niaga Jalan Pulau Irian Gg. Anggur No. 5 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali  | 802.742.408    | APBD (DAK)  | 611/3298/V/2021 (19 mei 2021) | 19-Mei-21                 | 150 hari kalender        | 14%          | 38,46%          |                  |
| 29 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lanyahan Petandakan   | CV. Perdana Niaga Jalan Pulau Irian Gg. Anggur No. 5 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali  | 1.338.437.987  | APBD (DAK)  | 611/3296/V/2021 (19 mei 2021) | 19-Mei-21                 | 150 hari kalender        | 35,46%       | 55,11%          |                  |
| 30 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Padang Keling   | CV. Sandi Yudha Jl. Yudistira No.10 kendran - Buleleng (Kab.) - Bali   | 1.564.907.124  | APBD (DAK)  | 611/3294/V/2021 (19 mei 2021) | 19-Mei-21                 | 150 hari kalender        | 42,30%       | 44,70%          |                  |
| 31 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Bebetin - Sekumpul   | CV. Lissjaya Utama Griya Panji Asri Blok P/5 Panji- Singaraja - Buleleng - Buleleng (Kab.) - Bali                                    | 457.103.036,95 | APBD        | 620/3306/V/2021               | 19-Mei-21                 | 120 hari kalender        | 36,78%       | 44,18%          |                  |
| 32 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Sekumpul – Lemukih   | cv.inersia BR. SEMANA, SINGAKERTA, UBUD, GIANYAR - Badung (Kab.) - Bali  | 246.465.334,12 | APBD        | 620/3310/V/2021               | 19-Mei-21                 | 120 hari kalender        | 36,87%       | 63,34%          |                  |
| 33 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Sp3. Munduk - Munduk - Dusun Tamblingan                      | CV. KRISNA PUTRA BALI Wisma Arya Lantai I Blok 2, Jalan Pulau Irian No.36 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali                         | 194.900.000,00 | APBD        | 620/3314/V/2021               | 19-Mei-21                 | 120 hari kalender        | 58,41%       | 93,85%          |                  |

| NO | NAMA SATKER                         | NAMA PAKET  | PENYEDIA/ALAMAT  | NILAI KONTRAK     | SUMBER DANA    | NO. KONTRAK                      | TANGGAL MULAI PELAKSANAAN | JANGKA WAKTU PELAKSANAAN | JULI         |                 |                |
|----|-------------------------------------|---|--|-------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|----------------|
|    |                                     |   |  |                   |                |                                  |                           |                          | Target Fisik | Realisasi FISIK | Realisasi KEU. |
| 1  | 2                                   | 3   | 4  | 5                 | 6              | 7                                | 8                         | 9                        | 10           | 11              | 12             |
| 34 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Rehabilitasi Gedung dan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Buleleng                     | PT. JAYA GRAHA UTAMA JL. Siulan No.237 Penatih Dangin Puri, Denpasar - Denpasar (Kota) - Bali                          | 1.002.259.525     | APBD           | 640/4154/VI/2021 (21 juni 2021)  | 21/06/2021                | 180 hari kalender        |              | 10%             | Rp 300.677.700 |
| 35 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Pembangunan Jembatan Tukad Daya Ruas Jalan SP3. JN. Tikungan Bungkulun - Jembatan | PT. TRI ASA CITRA ABADI JL. Raya Sading No. 25 A, Lingk. Karang Suwung, Sading, Mengwi - Badung - Badung (Kab.) - Bali | 2.362.287.065,85  | APBD (DAK)     | 620/4445/VI/2021 (30 juni 2021)  | 05-Jul-21                 | 150 hari kerja           | 4,48%        | 5,14%           |                |
| 36 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Pengawasan/Supervisi Pembangunan SPAM Air Sanih                                   | PT. KENCANA ADHI KARMA JL. BATUSARI NOMOR 15 DENPASAR - Denpasar (Kota) - Bali   | 173.723.000       | BKK Prov. Bali | 690/4572/VII/2021 (01 Juli 2021) | 01-Jul-21                 | 180 hari kalender        | 3,29%        | 4,05%           |                |
| 37 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Pembangunan SPAM Air Sanih  | PT.Karya Dewata Sarwa Indah Jalan Kargo Pasar No. 18 Denpasar - Denpasar (Kota) - Bali                                 | 10.312.086.773,91 | BKK Prov. Bali | 690/4569/VII/2021 (01 Juli 2021) | 01-Jul-21                 | 180 hari kalender        | 3,29%        | 4,05%           |                |
| 38 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sanda  | CV Graha Palimanan jln.Gunung Rinjani Blok IIA No. 4 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali                                | 587.119.367,18    | APBD           | 611/4744/VII/2021 (7 Juli 2021)  | 07-Jul-21                 | 150 hari kalender        | 2,032%       | 0,00086%        |                |
| 39 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Pengadaan Air Baku Desa Banyupoh  | CV. Lissjaya Utama Griya Panji Asri Blok P/5 Panji- Singaraja - Buleleng - Buleleng (Kab.) - Bali                      | 1.891.109.830,40  | APBD           | 611/4851/VII/2021 (12 Juli 2021) | 12-Jul-21                 | 151 hari kalender        | 0,868%       | 1,399%          |                |
| 40 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Survey Kondisi Jalan  | CV. Yogawidya Sarana Desain Jalan Nagasari No. 3x, Kel. Penatih Dangin Puri, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar        | 349.764.800,00    | APBD (DAK)     | 620/5035/VII/2021 (19 JULI 2021) | 19-Jul-21                 | 120 hari kalender        |              |                 |                |
| 41 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Penguatan Database dan Survey Kondisi Jembatan                                    | CV. Yogawidya Sarana Desain Jalan Nagasari No. 3x, Kel. Penatih Dangin Puri, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar        | 106.694.500,00    | APBD (DAK)     | 620/5032/VII/2021 (19 JULI 2021) | 19-Jul-21                 | 120 hari kalender        |              |                 |                |

| NO | NAMA SATKER                                      | NAMA PAKET   | PENYEDIA/ALAMAT   | NILAI KONTRAK    | SUMBER DANA | NO. KONTRAK   | TANGGAL MULAI PELAKSANAAN | JANGKA WAKTU PELAKSANAAN | JULI         |                 |                |
|----|--|--|---|------------------|-------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|----------------|
|    |  |  |   |                  |             |   |                           |                          | Target Fisik | Realisasi FISIK | Realisasi KEU. |
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5                | 6           | 7   | 8                         | 9                        | 10           | 11              | 12             |
| 42 | DINAS KESEHATAN                                  | Belanja modal alat kedokteran Lainnya  | PT CML METRO MEDIKA JL. Raya Dalung No. 39B. Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Badung - Bali - Badung (Kab.) - Bali | 1.448.480.000    | APBD (DAK)  | 027/0002/DINKES/VII/20121                             | 1 Juli 2021               | 120 hari kalender        |              |                 |                |
| 43 | DINAS KESEHATAN                                  | BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN ARSITEKTUR JASA DESAIN ARSITEKTURAL.  | PT MITRA TRI SAKTI JL. BUANA RAYA Gg. MEGA BUANA NO. 11 A PADANG SAMBIAN DENBAR - Badung (Kab.) - Bali                    | 378.763.000      | APBD        | 027/279/VI/2021                                       | 03-Mei-21                 | 60 hari kalender         |              |                 |                |
| 44 | DINAS KESEHATAN                                  | Belanja Modal alat kedokteran umum   | PT. BALI WAHYU ABADI Jl Gatot Subroto IID No 3 Denpasar - Denpasar (Kota) - Bali  | 438.900.000,00   | APBD (DAK)  | 027/60/VII/2021                                       | 7 Juli 2021               | 90 HARI KALENDER         |              | 0,00%           | Rp -           |
| 45 | DINAS KESEHATAN                                  | Belanja Modal Alat Kesehatan umum lainnya  | MUTIARA BERSAUDARA JL. RAYA DEKET WETAN NO. 246 DEKET - Lamongan (Kab.) - Jawa Timur                                      | 1.247.400.000,00 | APBD (DAK)  | 027/71/VII/2021                                       | 14 Juli 2021              | 90 HARI KALENDER         |              | 0,00%           | Rp -           |
| 46 | DINAS KESEHATAN                                  | (1.02.02.2.02.18) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus  | PT. Riasen Ary Wirawan Perum Dalung Permai Blok K3 No. 12 Dalung - Badung - Badung (Kab.) - Bali                          | 620.400.000,00   | APBD (DAK)  | 027/0005/II/DINKES/2021<br>02/13/RAW/VII/2021         | 13 Juli 2021              | 150 hari                 |              | 0,00%           | Rp -           |
| 47 | DINAS KESEHATAN                                  | BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REKAYASA JASA PENGAWAS PEKERJAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG.                               | PT. KENCANA ADHI KARMA JL. BATUSARI NOMOR 15 DENPASAR - Denpasar (Kota) - Bali  | 220.225.500,00   | APBD        | 027/279/VI/2021                                       | 03-Mei-21                 | 60 hari kalender         | 100%         | 100%            |                |
| 48 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | BELANJA /ALAT BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR ALAT TULIS KANTOR.   | CV. Delina JALAN BATANGHARI NO 9A DENPASAR - Denpasar (Kota) - Bali   | 442.786.234      | APBD        | 027/05/III/PPK-BPKPD/2021 027/06/III/PPK-BPKPD/2021   | 25/02/2021                | 300 hari                 | 45%          | 53%             | 137.914.211    |
| 49 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | PENGADAAN CETAK BLANGKO.   | CV. MAHA TIRTA JALAN GAJAH MADA NO. 79 - Buleleng (Kab.) - Bali   | 167.541.000      | APBD        | 027/10/IV/PPK-BKPD/2021                               | 20/04/2021                | 255 hari kalender        | 35%          | 17,85%          | 36.322.000     |
| 50 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | PENGADAAN CETAK BUKU DAN FOTO COPY.  | UD. SUDIRMAN GRAFIKA JL. SUDIRMAN GG.VI/ 5D, SINGARAJA, BULELENG, BALI - Buleleng (Kab.) - Bali                           | 538.119.540      | APBD        | 027/14/IV/PPK-BKPD/2021 027/16/IV/PPK-BPKPD/2021      | 20/04/2021                | 253 hari kalender        |              |                 |                |
| 51 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | PENGADAAN BAHAN KOMPUTER(TONER, TINTA, CATRIDGE)   | CV ANDAR JAVAS INTI Gondanglegi RT02/RW 22, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta - Sleman (Kab.) - DI Yogyakarta     | 379.335.000      | APBD        | 027/04/VIII/PPK-BPKPD/2021 027/05/VIII/PPK-BPKPD/2021 | 01/07/2021                | 175 HARI KALENDER        | 40%          | 69%             | -              |
| 52 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN             | Rehabilitasi Bangunan Panti Benih/ Bangsal Hatchery dan Rehabilitasi kolam atau bak pemijahan/induk/ calon induk/ larva/tandon | CV. UCINDO KARYA MANDIRI Perumahan Mustika Laksmi Gg 4 No. 6 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali                           | 232.869.921      | APBD (DAK)  | 027/1235/VI/PPK/DKPP/2021                             | 31/05/2021                | 90 HARI KALENDER         | 82, 095%     | 82, 576%        |                |

| NO | NAMA SATKER   | NAMA PAKET  | PENYEDIA/ALAMAT   | NILAI KONTRAK  | SUMBER DANA | NO. KONTRAK                             | TANGGAL MULAI PELAKSANAAN  | JANGKA WAKTU PELAKSANAAN                  | JULI         |                 |                |
|----|---|---|---|----------------|-------------|---|--|---|--------------|-----------------|----------------|
|    |   |   |   |                |             |   |  |   | Target Fisik | Realisasi FISIK | Realisasi KEU. |
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5              | 6           | 7                                       | 8  | 9   | 10           | 11              | 12             |
| 53 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                      | Belanja Akomodasi Pelatihan Dasar CPNS                              | PT MADE BALI (HOTEL MADE BALI), PT NUSA INDAH BALI (JL RAYA SEMPIDI NO 41 BADUNG 80351 BALI INDONESIA, JL WARIBANG NO 99 KESIMAN PETILAN DENPASAR TIMUR BALI) | 1.179.360.000  | APBD        | 027/31.2/V/PPK/BKPSDM/2021 (31/05/2021) | gelombang I : on campus 1 tanggal 16 juli 2021 s/d 6 agustus 2021 dan campus II dari tgl 22 september s/d 24 september 2021<br>Gelombang II : on campus tgl 2 agustus 2021 s/d 25 agustus 2021 dan on campus II dr tgl 4 oktober 2021 s/d 6 oktober 2021<br>Gelombang III: on campus I tgl 12 agustus 2021 s/d 4 september 2021 dan on campus II dr tgl 11 oktober s/d 13 oktober 2021 | 21 hari kerja/ on campus setiap gelombang | 0            |                 |                |
|    |   |   |   |                |             | 027/31.3/v/ppk/bkpsdm/2021 (31/05/2021) | gelombang IV : on campus I tgl 19 agustus 2021 s/d 10 september 2021 dan on campus II dr tgl 25 oktober s/d 27 oktober 2021  | 21 hari kerja/ on campus setiap gelombang | 0            |                 |                |
| 54 | DINAS PARIWISATA  | Pembuatan Tempat Parkir Barat Di DTW Pantai Lovina                  | CV ARYA DEWATA UTAMA Wisma Arya Lantai I Blok 1, Jalan Pulau Irian No. 36 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali  | 202.700.000    | APBD (DAK)  | 556/24/VI/2021 (11 juni 2021)           | 11/06/2021   | 90 HARI KALENDER                          | 39,31%       | 16,15%          |                |
| 55 | DINAS PARIWISATA  | Pembangunan Plaza/Pusat Jajanan Kuliner Di DTW Air Sanih Desa Bukti | CV. KRISNA PUTRA BALI Wisma Arya Lantai I Blok 2, Jalan Pulau Irian No.36 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali  | 228.002.337    | APBD (DAK)  | 556/53/VI/2021 ( 6 Juli 2021 )          | 6 Juli 2021  | 90 HARI KALENDER                          | 1,97%        | 10,58%          |                |
| 56 | DINAS PARIWISATA  | Pembuatan Tempat Parkir Barat Di DTW Eks. Pelabuhan Buleleng        | CV. Lissjaya Utama Griya Panji Asri Blok P/5 Panji- Singaraja - Buleleng - Buleleng (Kab.) - Bali   | 484.875.236,50 | APBD (DAK)  | 556/29/VI/2021 ( 28 Juni 2021 )         | 28 Juni 2021   | 90 HARI KALENDER                          | 11,98%       | 11,80%          |                |
| 57 | DINAS PARIWISATA  | Pembangunan Plaza/Pusat Jajanan Kuliner Di DTW Pantai Lovina        | CV. KRISNA PUTRA BALI Wisma Arya Lantai I Blok 2, Jalan Pulau Irian No.36 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali  | 227.969.557,66 | APBD (DAK)  | 556/53/VI 2021 ( 5 Juli 2021 )          | 5 Juli 021   | 90 HARI KALENDER                          | 2,29%        | 2,73%           |                |
| 58 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                 | CV. Serba Lancar Abadi Jl. WR. Supratman No. 412, Penarukan Buleleng, Bali - Buleleng (Kab.) - Bali   | 297.146.500,00 | APBD (DAK)  | 800/257/DPPKBPP-PA/2021                 | 01-Jul-21  | 30 hari kalender                          | 100%         | 100%            | 0,00           |

| NO | NAMA SATKER                           | NAMA PAKET   | PENYEDIA/ALAMAT   | NILAI KONTRAK    | SUMBER DANA | NO. KONTRAK                    | TANGGAL MULAI PELAKSANAAN | JANGKA WAKTU PELAKSANAAN | JULI         |                 |                |
|----|---------------------------------------|--|---|------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|----------------|
|    |                                       |  |   |                  |             |                                |                           |                          | Target Fisik | Realisasi FISIK | Realisasi KEU. |
| 1  | 2                                     | 3  | 4   | 5                | 6           | 7                              | 8                         | 9                        | 10           | 11              | 12             |
| 59 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH SDN 1 BANJAR TEGAL, PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH SDN 1 SUKASADA, PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH SDN 1 GALUNGAN, PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH SDN 2 GALUNGAN, PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH SDN 2 TEJAKULA, PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH SDN 4 BONDALEM   | CV. KARYA SENTOSA JALAN BILAWA NO 49 DESA PERANCAK, JEMBRANA - BALI. - Jembrana (Kab.) - Bali           | 1.040.263.000,00 | APBD (DAK)  | '0721/0489/PPK/Disdikpora/2021 | 21 Juli 2021              | 120 Hari Kalender        |              |                 |                |
| 60 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 1 Bongancina, SDN 4 Tista, SDN 3 Kedis, dan SDN 3 Busungbiu  | CV. KARYA SENTOSA JALAN BILAWA NO 49 DESA PERANCAK, JEMBRANA - BALI. - Jembrana (Kab.) - Bali           | 1.609.422.000,00 | APBD (DAK)  | '0721/0490/PPK/Disdikpora/2021 | 21 Juli 2021              | 120 Hari Kalender        |              |                 |                |
| 61 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN PEMBANGUNAN RUANG GURU SD N 4 GOBLEG DAN BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN PEMBANGUNAN RUANG GURU SD N 1 BEBETIN   | CV. SUWASTIKA JAYA Jalan Ratulangi Depan Terminal No.8 - Buleleng (Kab.) - Bali                         | 360.762.000,00   | APBD (DAK)  | '0721/0488/PPK/Disdikpora/2021 | 21 Juli 2021              | 120 Hari Kalender        |              |                 |                |
| 62 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG KELAS SMPN SATU ATAP 3 SUKASADA, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG GURU SMP NEGERI SATU ATAP 3 SUKASADA, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI PERPUSTAKAAN SEKOLAH SMPN SATU ATAP 3 SUKASADA, DAN BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI TOILET/JAMBAK SMPN SATU ATAP 3 SUKASADA | CV SARI KARYA Tanah Kapling Banyuning Tengah,Kelurahan Banyuning,Kab. Buleleng - Buleleng (Kab.) - Bali | 750.158.000,00   | APBD (DAK)  | '0721/0487/PPK/Disdikpora/2021 | 21 Juli 2021              | 120 Hari Kalender        |              |                 |                |
| 63 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | Belanja Modal Rehabilitasi ruang laboratorium IPA, Rehabilitasi ruang kelas,dan Rehabilitasi toilet (jamban) SMPN 1 Sukasada dan Rehabilitasi ruang kelas SMPN 3 Sukasada  | CV. ADI YASA JALAN PULAU IRIAN DSN. KAJANAN DESA PENGILATAN - BULELENG - Buleleng (Kab.) - Bali         | 767.154.000,00   | APBD (DAK)  | '0721/0486/PPK/Disdikpora/2021 | 21 Juli 2021              | 120 Hari Kalender        |              |                 |                |



| NO | NAMA SATKER                           | NAMA PAKET  | PENYEDIA/ALAMAT   | NILAI KONTRAK    | SUMBER DANA | NO. KONTRAK                    | TANGGAL MULAI PELAKSANAAN | JANGKA WAKTU PELAKSANAAN | JULI         |                 |                |
|----|---------------------------------------|---|---|------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|----------------|
|    |                                       |   |   |                  |             |                                |                           |                          | Target Fisik | Realisasi FISIK | Realisasi KEU. |
| 1  | 2                                     | 3   | 4   | 5                | 6           | 7                              | 8                         | 9                        | 10           | 11              | 12             |
| 64 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rehabilitasi ruang kelas, Rehabilitasi Ruang Guru dan Kepala Sekolah, Pembangunan area bermain TK Negeri Pembina Singaraja, dan Rehabilitasi ruang kelas TK N Pembina Kec. Sukasada | CV. Dewata Karya Br. Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali             | 492.614.500,00   | APBD (DAK)  | 0721/0471/PPK/Disdikpora/2021  | 21 Juli 2021              | 120 Hari Kalender        |              |                 |                |
| 65 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 4 Sumberkima, SDN 2 Penyabangan, SDN 1 Ringdikit dan SDN 1 Pengastulan  | CV. BUMI RAYA JALAN JALAK NO 12 SINGARAJA - Buleleng (Kab.) - Bali                                    | 1.542.010.000,00 | APBD (DAK)  | '0721/0485/PPK/Disdikpora/2021 | 21 Juli 2021              | 120 Hari Kalender        |              |                 |                |
| 66 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 4 Kubutambahan, SDN 1 Sangsit dan SDN 3 Suwug   | CV Dema Karya Mandiri Jalan Pulau Komodo Gg Kresna No 15 Kelurahan Banyuning - Buleleng (Kab.) - Bali | 1.478.712.000,00 | APBD (DAK)  | '0721/0484/PPK/Disdikpora/2021 | 21 Juli 2021              | 120 Hari Kalender        |              |                 |                |
| 67 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas dan Pembangunan perpustakaan SDN 3 Bondalem   | PT. Glebeg Bali Utama Jl. Kargo Indah II No 11 Denpasar - Denpasar (Kota) - Bali                      | 471.710.000,00   | APBD (DAK)  | '0721/0483/PPK/Disdikpora/2021 | 21 Juli 2021              | 120 Hari Kalender        |              |                 |                |
| 68 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 1 Paket Agung, SDN 2 Anturan, SDN 3 Pegayaman   | KRESNA DWIPA CV Br.Metra Kelod, Ds.Yangapi, Tembuku,Bangli - Bangli (Kab.) - Bali                     | 1.394.941.000,00 | APBD (DAK)  | '0721/0482/PPK/Disdikpora/2021 | 21 Juli 2021              | 120 Hari Kalender        |              |                 |                |
| 69 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN BELANJA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 CEMPAGA,DAN BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 PEDAWA                  | CV. PUTRA CATUR DEWATA JALAN ACHMAD YANI NO 135 A SINGARAJA - Buleleng (Kab.) - Bali                  | 1.007.896.000,00 | APBD (DAK)  | '0721/0481/PPK/Disdikpora/2021 | 21 Juli 2021              | 120 Hari Kalender        |              |                 |                |
| 70 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Belanja Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 3 Les, Belanja Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 3 Tembok, Belanja Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 5 Les        | CV. Adi Putra Jl. Gunung Batur Gang II No. 1 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali                       | 925.022.000,00   | APBD (DAK)  | '0721/0480/PPK/Disdikpora/2021 | 21 Juli 2021              | 120 Hari Kalender        |              |                 |                |

| NO | NAMA SATKER                           | NAMA PAKET  | PENYEDIA/ALAMAT   | NILAI KONTRAK    | SUMBER DANA | NO. KONTRAK                    | TANGGAL MULAI PELAKSANAAN | JANGKA WAKTU PELAKSANAAN | JULI         |                 |                |
|----|---------------------------------------|---|---|------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|----------------|
|    |                                       |   |   |                  |             |                                |                           |                          | Target Fisik | Realisasi FISIK | Realisasi KEU. |
| 1  | 2                                     | 3   | 4   | 5                | 6           | 7                              | 8                         | 9                        | 10           | 11              | 12             |
| 71 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG KELAS SMPN 5 SINGARAJA, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG GURU SMP NEGERI 5 SINGARAJA, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG KELAS SMPN 7 SINGARAJA, DAN BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI LABORATORIUM IPA SMPN 7 SINGARAJA  | CV. Lissjaya Utama Griya Panji Asri Blok P/5 Panji- Singaraja - Buleleng - Buleleng (Kab.) - Bali | 1.112.107.000,00 | APBD (DAK)  | '0721/0479/PPK/Disdikpora/2021 | 21 Juli 2021              | 120 Hari Kalender        |              |                 |                |
| 72 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | Belanja Modal Rehabilitasi ruang guru, Rehabilitasi ruang kelas dan Rehabilitasi ruang UKS SMPN 1 Banjar dan Rehabilitasi ruang laboratorium komputer SMPN 2 Busungbiu  | PT. Glebeg Bali Utama Jl. Kargo Indah II No 11 Denpasar - Denpasar (Kota) - Bali                  | 928.795.000,00   | APBD (DAK)  | '0721/0478/PPK/Disdikpora/2021 | 21 Juli 2021              | 120 Hari Kalender        |              |                 |                |
| 73 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rehabilitasi ruang kelas TK Negeri Desa Banjar dan Rehabilitasi ruang kelas, Rehabilitasi Ruang Guru dan Kepala Sekolah TK N Desa Pedawa dan Pembangunan area bermain TK N Pembina Kec. Banjar  | CV. SANTOSA Jalan Yudistira No. 37 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali                             | 6.046.086.000,00 | APBD (DAK)  | 0721/0472/PPK/Disdikpora/2021  | 21 Juli 2021              | 120 Hari Kalender        |              |                 |                |
| 74 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG KELAS TK NEGERI PEMBINA KEC. GEROKGAK, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG GURU DAN KEPALA SEKOLAH TK NEGERI PEMBINA KEC. GEROKGAK , BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN PEMBANGUNAN AREA BERMAIN TK N DESA PANGKUNGPAPUK, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG KELAS TK N DESA PANGKUNGPAPUK, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG KELAS TK NEGERI DESA MUNDUK BESTALA | CV. SARI MERTA BAWA BR. DINAS UMASARI KAUH, PERING SARI, SELAT - Karang Asem (Kab.) - Bali        | 815.357.500,00   | APBD (DAK)  | 0721/0473/PPK/Disdikpora/2021  | 21 Juli 2021              | 120 Hari Kalender        |              |                 |                |
| 75 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG KELAS TKN DESA BONTHING, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG KELAS TKN DESA TAMBAKAN, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI TOILET (JAMBAN) TKN DESA TAMBAKAN  | CV. SANTOSA Jalan Yudistira No. 37 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali                             | 403.701.100,00   | APBD (DAK)  | 0721/0474/PPK/Disdikpora/2021  | 21 Juli 2021              | 120 Hari Kalender        |              |                 |                |

| NO | NAMA SATKER                           | NAMA PAKET   | PENYEDIA/ALAMAT   | NILAI KONTRAK             | SUMBER DANA | NO. KONTRAK                             | TANGGAL MULAI PELAKSANAAN | JANGKA WAKTU PELAKSANAAN | JULI         |                 |                |
|----|---------------------------------------|--|---|---------------------------|-------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|----------------|
|    |                                       |  |   |                           |             |   |                           |                          | Target Fisik | Realisasi FISIK | Realisasi KEU. |
| 1  | 2                                     | 3  | 4   | 5                         | 6           | 7                                       | 8                         | 9                        | 10           | 11              | 12             |
| 76 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | Belanja Modal Rehabilitasi ruang kelas, Rehabilitasi toilet (jamban) SMPN 2 Singaraja dan Rehabilitasi ruang kelas SMPN 3 Singaraja dan Rehabilitasi ruang laboratorium komputer, Rehabilitasi ruang guru SMPN 6 Singaraja           | CV.KEMBAR SARI SEDANA Jl.P Menjangan Perum Banyuning Permai Blok A/10 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali                    | 1.597.638.000,00          | APBD (DAK)  | 0721/0477/PPK/Disdikpora/2021           | 21 Juli 2021              | 120 Hari Kalender        |              |                 |                |
| 77 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | Belanja Modal Rehabilitasi ruang kelas SMPN 1 Seririt dan Rehabilitasi ruang kelas, Rehabilitasi toilet (jamban) dan Rehabilitasi ruang laboratorium IPA serta Rehabilitasi ruang perpustakaan SMPN 4 Gerokgak                       | CV.KEMBAR SARI SEDANA Jl.P Menjangan Perum Banyuning Permai Blok A/10 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali                    | 1.628.737.000,00          | APBD (DAK)  | 0721/0476/PPK/Disdikpora/2021           | 21 Juli 2021              | 120 Hari Kalender        |              |                 |                |
| 78 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | Belanja Modal Rehabilitasi ruang kelas, Rehabilitasi toilet (jamban) SMPN 1 Kubutambahan dan Rehabilitasi ruang kelas, Rehabilitasi toilet (jamban), Rehabilitasi ruang UKS SMPN 1 Sawan serta Rehabilitasi ruang kelas SMPN 4 Sawan | CV. Lissjaya Utama Griya Panji Asri Blok P/5 Panji- Singaraja - Buleleng - Buleleng (Kab.) - Bali                           | 1.638.885.000,00          | APBD (DAK)  | 0721/0475/PPK/Disdikpora/2021           | 21 Juli 2021              | 120 Hari Kalender        |              |                 |                |
| 79 | DINAS PERTANIAN                       | Belanja Barang Untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID 19  | SUDARMA BALI UTAMA Jl. Diponegoro gg. Camar no 5 seririt - Buleleng (Kab.) - Bali   | 292.928.400               | APBN        | 027/1488/VII/DISTAN/2021 (14 JULI 2021) | 14-Jul-21                 | 45 HARI KALENDER         |              |                 |                |
| 80 | DINAS PERTANIAN                       | Belanja Modal Personal Computer - Komputer Personal  | cy alzika rakasa Jalan Otto Iskandardinata No. 277 RT 004/ RW 002 Kel. Balong Gede Kec. Regol - Bandung (Kota) - Jawa Barat | 200.631.200               | APBD (DAK)  | 875.1/1502/PENY/DISTAN/2021             | 19/07/2021                | 90 HARI KALENDER         |              |                 |                |
|    |                                       | <b>TOTAL</b>   |   | <b>112.099.574.494,81</b> |             |   |                           |                          |              |                 |                |

## Dokumentasi Kegiatan

1.



**Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Buleleng melakukan koordinasi dengan RSUD Kab. Buleleng terkait pengadaan barang/jasa Alat Kesehatan yang bersumber dari DAK TA. 2021 pada tanggal 1 Juli 2021**



2.



***Pelaksanaan kegiatan pembuktian kualifikasi terhadap paket Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rehabilitasi Ruang Kelas Tk Negeri Pembina Kec. Gerokgak, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rehabilitasi Ruang Guru Dan Kepala Sekolah Tk Negeri Pembina Kec. Gerokgak , Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Pembangunan Area Bermain Tk N Desa Pangkungparuk, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rehabilitasi Ruang Kelas Tk N Desa Pangkungparuk, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rehabilitasi Ruang Kelas Tk Negeri Desa Munduk Bestala bertempat diruang rapat Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada tanggal 1 Juli 2021***



3.



***Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan rapat dengan agenda membahas Evaluasi Tender DAK Fisik TA. 2021 dari Dinas Kesehatan yang mengalami kendala dalam proses pemilihan penyedia, turut hadir perwakilan Dinas Kesehatan, Inspektorat, Bappeda dan BPKPD bertempat di ruang rapat Unit IV Lantai 2 pada tanggal 5 Juli 2021***

4.



**Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang diwakili Ksb. Pengelolaan PBJ, Bapak Wayan Arif Saptariyadi, SH menghadiri undangan rapat reviu hasil pemilihan Penyedia terhadap paket Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi bertempat diruang rapat RSUD Kab. Buleleng pada tanggal 6 Juli 2021**



5.



**Kegiatan pembuktian kualifikasi paket Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rehabilitasi Ruang Kelas Smpn Satu Atap 3 Sukasada, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rehabilitasi Ruang Guru Smp Negeri Satu Atap 3 Sukasada, dst dan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rehabilitasi Laboratorium Ipa Smpn 1 Sukasada, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rehabilitasi Ruang Kelas Smp Negeri 1 Sukasada, dst pada tanggal 7 Juli 2021**

6.



***Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan rapat reviu persiapan dokumen pengadaan untuk paket Belanja Modal Alat Dapur yang dihadiri PPK RSUD serta Pokja Pemilihan bertempat diruang rapat Unit IV Lantai 2 pada tanggal 8 Juli 2021***




7.



***Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan rapat reviu persiapan dokumen pengadaan untuk paket Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor yang dihadiri PPK Dinas Kesehatan, Pokja Pemilihan serta undangan lainnya bertempat di ruang rapat Unit IV Lantai 2 pada tanggal 9 Juli 2021***

8.

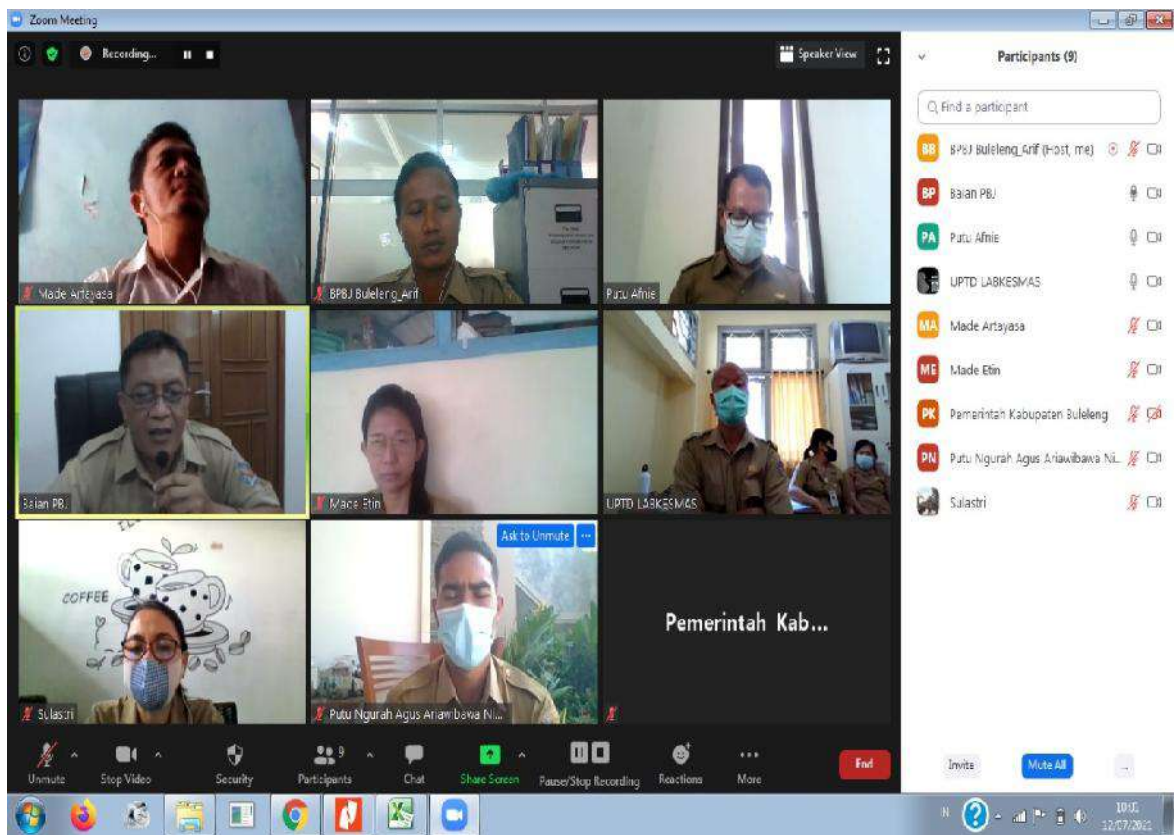

**Bagian Pengadaan Barang dan Jasa secara virtual melalui aplikasi zoom meeting menggelar rapat reviu persiapan dokumen pengadaan untuk paket Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya ( E-Purchasing ) yang diikuti perwakilan Dinas Kesehatan, Inspektorat dan anggota Pokja Pemilihan pada tanggal 12 Juli 2021**



9.



**Bagian Pengadaan Barang dan Jasa memberikan pendampingan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana Bantuan Tak Terduga (BTT) untuk penanggulangan covid-19 bertempat di Kantor BPBD Buleleng pada tanggal 14 Juli 2021**




10.



***Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, I Made Suwitra Yadnya, ST bersama Pimpinan SKPD terkait mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Pasien Covid-19 OTG/GR yang dipimpin langsung Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, ST serta dihadiri perwakilan PHRI Kab. Buleleng bertempat diruang rapat Lobby Kantor Bupati Buleleng, pada tanggal 14 Juli 2021***


**11.**



***Secara virtual Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mengikuti rapat persiapan penandatanganan kontrak terhadap 20 paket dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Buleleng yang bersumber dari dana DAK TA. 2021 dilaksanakan dari tanggal 15-16 Juli 2021***



12.



**Secara virtual Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mengikuti rapat persiapan penunjukan penyedia dan pra penandatanganan kontrak paket Survey Kondisi Jalan dan Penguatan Database dan Survey Jembatan pada tanggal 16 Juli 2021**

13.



***Secara virtual Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mengikuti undangan rapat Pre Construction Meeting terhadap paket Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sanda, turut mengikuti rapat perwakilan Inspektorat, Pokja serta penyedia pada tanggal 19 Juli 2021***



14.



*Kegiatan pembuktian kualifikasi paket Rehabilitasi Jalan Kayu Putih - Banyuatis dan Rehabilitasi Jalan Asah Munduk- Pura Gubug dengan mengundang peserta tender pada tanggal 26 Juli 2021*



15.



***Secara virtual Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menggelar rapat reviu persiapan pengadaan untuk paket Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman dari Dinas Pertanian Kab. Buleleng pada tanggal 28 Juli 2021, turut hadir PPK Dinas Pertanian, Pokja Pemilihan serta perwakilan Inspektorat dan Dinas Penanaman Modal PTSP***



16.

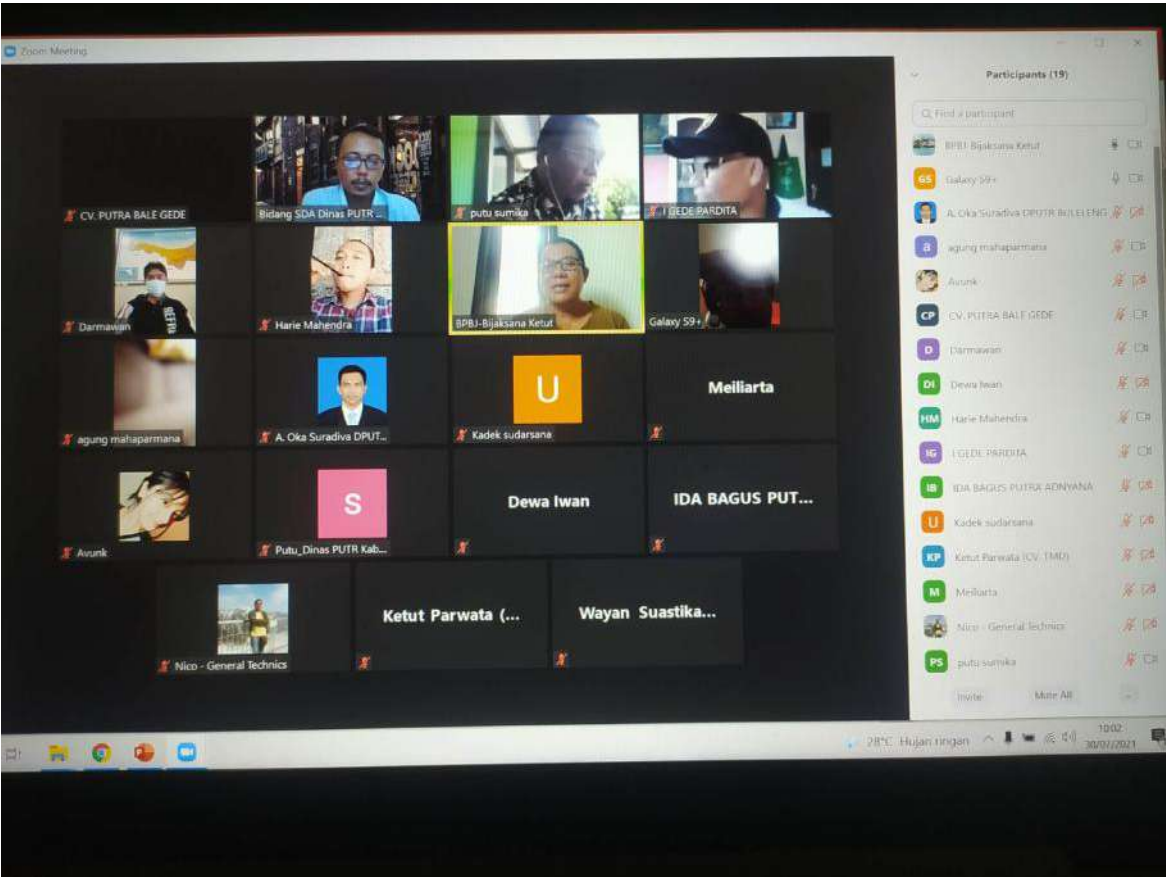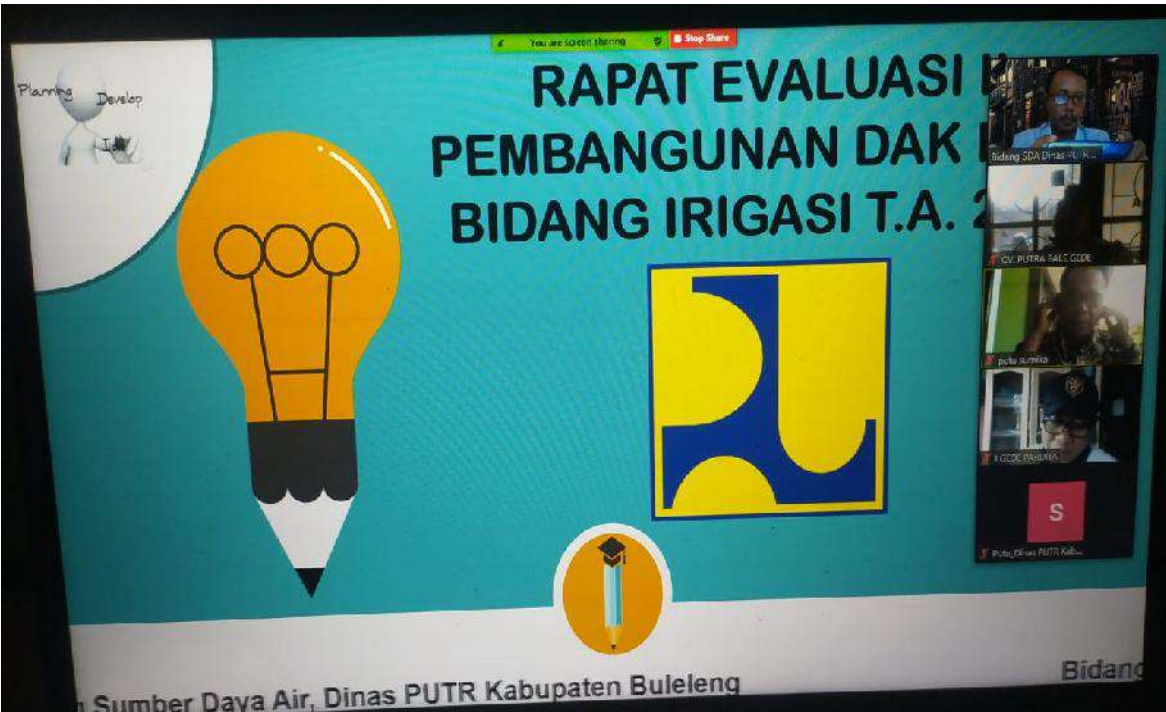

*Secara virtual/daring Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mengikuti undangan Rapat Evaluasi II Pelaksanaan Pekerjaan Fisik DAK IRIGASI TA. 2021 yang diselenggarakan Dinas PUTR Kab. Buleleng pada tanggal 30 Juli 2021. Rapat dibuka dan dipandu PPTK Irigasi Dinas PUTR Kab. Buleleng didampingi tim teknis lainnya serta turut dihadiri perwakilan Inspektorat Kab. Buleleng, Konsultan Pengawas dan Penyedia Barang/Jasa yang melaksanakan paket-paket Irigasi Dinas PUTR Kab. Buleleng*
