



LAPORAN PENGADAAN BARANG/JASA BULAN AGUSTUS 2021

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

2021



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja Telepon (0362) 21985
www.setda.bulelengkab.go.id email:setda@bulelengkab.go.id

Singaraja, 7 September 2021

Nomor : 027/92/BPBJ/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : **Laporan Pengadaan Barang/Jasa
Sampai Dengan Akhir Bulan
Agustus 2021**

K e p a d a
Yth. Bupati Buleleng
melalui Sekretaris
Daerah Kabupaten Buleleng
di -
Singaraja

Dengan hormat kami sampaikan laporan realisasi pengadaan barang/jasa sampai dengan akhir bulan **Agustus** Tahun Anggaran 2021, yang diproses melalui Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, dengan perincian sebagai berikut :

I. Data Paket Pengadaan yang diproses (PERENCANAAN) melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Buleleng berdasarkan RUP :

Terdapat perubahan rencana paket tender/Seleksi melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa akibat refocusing anggaran sebagai berikut :

No	Jenis Pengadaan	Rencana Umum Pengadaan TA 2021		Keterangan
		Paket	Pagu	
1	Barang	28	18.791.674.317	Tambahkan 2 Paket : 1 Paket RSUD awalnya rencana <i>e-purchasing</i> , dan 1 Paket Dinkes Konsultan Perencanaan
2	Konstruksi	62	235.248.478.885	
3	Konsultansi	18	7.240.899.393	
4	Jasa Lainnya	5	2.924.613.707	
Jumlah		113	264.205.666.302	

II. Data Paket Masuk Berdasarkan Jenis Pengadaan :

No	Jenis Pengadaan	Paket Masuk		Sedang Proses		Selesai		Gagal Tender/Tender Ulang		Di Batalkan		Sisa Paket	
		Jml.	Pagu Anggaran (Rp.)	Jml.	Pagu Anggaran (Rp.)	Jml.	Pagu Anggaran (Rp.)	Jml.	Pagu Anggaran (Rp.)	Jml.	Pagu Anggaran (Rp.)	Jml.	Pagu Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Barang	20	15.681.981.227	3	1.822.675.750	17	13.859.305.477	0	-	3	1.150.450.000	5	1.959.243.090
2	Konstruksi	54	132.444.315.885	0	-	53	129.158.020.150	1	3.286.295.735	0	-	8	102.804.163.000
3	Jasa Konsultansi	16	4.674.995.128	1	257.049.625	14	4.116.745.503	1	301.200.000	0	-	2	2.565.904.265
4	Jasa Lainnya	4	2.683.596.707	1	204.243.700	3	2.479.353.007	0	-	0	-	1	241.017.000
Jumlah		94	155.484.888.947	5	2.283.969.075	87	149.613.424.137	2	3.587.495.735	3	1.150.450.000	16	107.570.327.355

III. Efisiensi Terhadap Pagu Anggaran dan HPS :

Efisiensi Terhadap Pagu Anggaran

Paket Selesai		Nilai Kontrak (Rp.)	Nilai Kontrak (Rp.)	
Jumlah	Pagu Anggaran (Rp.)		Efisiensi	(%)
87	149.613.424.136,68	118.217.752.656,65	31.395.671.480,03	20,98


Efisiensi Terhadap HPS

Paket Selesai		Nilai Kontrak (Rp.)	Efisiensi	
Jumlah	HPS (Rp.)		Efisiensi	(%)
87	147.546.235.352,91	118.217.752.656,65	29.328.482.696,26	19,88

IV. DATA SEBARAN PEMENANG TENDER/SELEKSI/PEMILIHAN PENYEDIA



V. MONITORING PELAKSANAAN KONTRAK

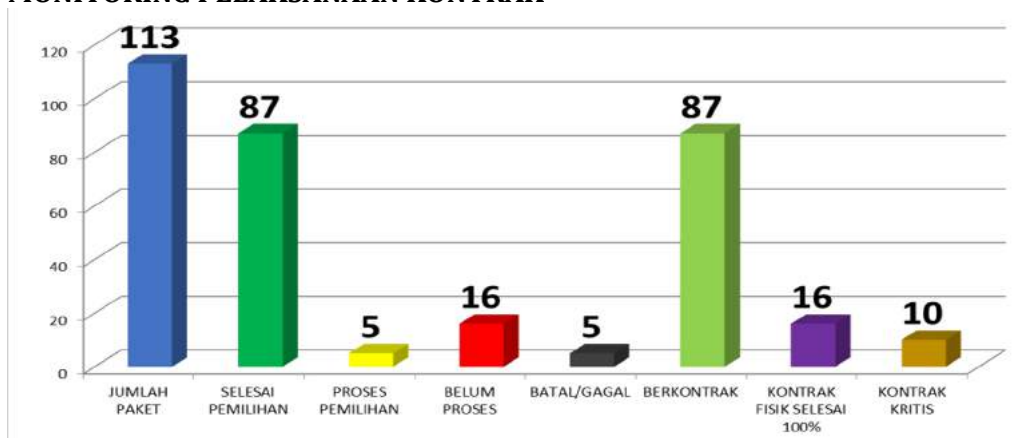

Catatan : Kontrak kritis yaitu kontrak yang pelaksanaannya mengalami deviasi minus di atas 10%.

VI. TRANSAKSI PENGADAAN LANGSUNG MELALUI BELA PENGADAAN

Instansi		Valuasi
9.	Pemerintah Kota Malang	62.255.923
10.	Pemerintah Provinsi Sum...	61.639.733
11.	Pemerintah Kabupaten Bul...	21.506.000
12.	Pemerintah Provinsi (Pemerintah Kabupaten Buleleng)	558
13.	Pemerintah Provinsi Yogya...	7.192.918
14.	Pemerintah Kota Jakarta S...	1.250.156
15.	Pemerintah Kota Surakarta	1.128.000
16.	Pemerintah Kabupaten Ku...	838.000
17.	Pemerintah Kota Bandung	655.000
18.	Pemerintah Kabupaten Ma...	639.600
19.	Pemerintah Provinsi Banten	637.900
20.	Pemerintah Provinsi Kalim	630.500

Jumlah tercatat Transaksi Bela Pengadaan Kabupaten Buleleng sebanyak **Rp. 21.506.000,-**
 Sumber data : <https://belapengadaan.lkpp.go.id/home/>

VII. DATA PERMASALAHAN

a. Sanggahan

No.	Nama Paket/OPD	Sumber Dana	Sanggahan	Pengaduan	Proses Peradilan	Ket.
1.	Belanja Modal Taman (Pembangunan RTH Taman Bung Karno Tahap IV)	APBD (BKK Provinsi Bali)	1	-	-	Tender Dilanjutkan
2.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lanyahan Petandakan	APBD	1	-	-	Tender Dilanjutkan
3.	Pemuktahiran Sistem Informasi/ Data Base Jaringan Irigasi di Kabupaten Buleleng	APBD	1	-	-	Tender Dilanjutkan
4.	Pengawasan/Supervisi Rehabilitasi Jaringan Irigasi	APBD	1	-	-	Tender Dilanjutkan
5.	Belanja natura dan Pakan - Natura	APBD	1	-	-	Tender Dilanjutkan
6.	Pembangunan Jembatan Pangkung Dalem Ruas Jalan SP3. Gitgit - Wanagiri	APBD	2	-	-	Tender Dilanjutkan
7.	Pembangunan SPAM Air Sanih	APBD (BKK Provinsi Bali)	1	-	-	Evaluasi Ulang
8.	Paket Pekerjaan Survei Kondisi Jalan	APBD (DAK)	1	-	-	Tender Dilanjutkan
9.	Penguatan Data base dan Survei Kondisi Jembatan	APBD (DAK)	1	-	-	Tender Dilanjutkan
TOTAL			10			

b. Penetapan Daftar Hitam

No.	Nama Penyedia	Alamat	Pekerjaan	No. Keputusan	Waktu Sanksi
1.	NIHIL	-	-	-	-

Dapat kami laporkan kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa saat ini pada lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng dan SDM Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa untuk Pokja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

A. *Existing* Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng

No.	Formasi	Kebutuhan	Terisi	Kurang	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	JF PPBJ Madya	2	1	1	
2	JF PPBJ Muda	11	1	10	
3	JF PPBJ Pertama	19	13	6	5 (lima) Orang masih CPNS
TOTAL		32	15	17	

Keterangan : Baru Terpenuhi 46,87% dari Kebutuhan

B. *Existing* Pokja Pemilihan Permanen pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng

No.	Formasi	Kebutuhan	Terisi	Kurang
1	2	3	4	5
1	Pokja Pemilihan Permanen	20	10	10

Keterangan : Baru Terpenuhi 50% dari Kebutuhan

Dari data dimaksud diatas dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Kesimpulan :

- a. Proses pengadaan barang/jasa sampai dengan bulan **Agustus** 2021 disimpulkan sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan barang/jasa yang diproses Pokja Pemilihan sampai dengan bulan Agustus 2021 sebanyak 97 paket (86%), dan **sudah selesai tender sebanyak 87 paket (76,99%)** dengan total nilai kontrak sebesar Rp. 118.217.752.656,65 (44,74%) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 264.205.666.301,68 yang sedang proses tender sebanyak 5 paket (4,42%), yang belum di proses sebesar 16 paket (14,16%) dan yang batal tender sebanyak 3 paket (2,65%) karena *refocusing* dan perubahan metode pemilihan menjadi *e-purchasing*.
 - 2) Terdapat juga 2 paket pengadaan gagal proses yang sumber anggaran dari DAK pada Dinas Kesehatan yaitu Paket Belanja Jasa Konsultan Perencana Arsitektur-Jasa Desain Arsitektur senilai Rp.301.200.000,- dan Paket Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium senilai Rp.3.286.295.735,- karena tidak cukup waktu akibat perencanaan dan pembangunan fisik dalam satu tahun anggaran dan adanya beberapa perubahan regulasi.
 - 3) Efisiensi anggaran sampai dengan Bulan Agustus 2021 dari 87 paket APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 yang sudah selesai proses tender sebesar **Rp. 29.328.482.696,26 (19,88%)** dari total HPS Rp. 147.546.235.352,91 dan sisa anggaran sebesar Rp. 31.395.671.480,03 (20,98%) dari total pagu anggaran Rp. 149.613.424.136,68.
 - 4) Rincian pelaksanaan pengadaan barang/jasa dijelaskan lebih rinci pada dokumen terlampir.
- b. SDM Jabfung PBJ
 - 1) Prosentase capaian pemenuhan Jabfung PBJ lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng yaitu **46,87%**, dimana kebutuhan Jabfung PBJ sebanyak 32 orang dan sudah terisi sebanyak 15 orang.
 - 2) Prosentase capaian pemenuhan Jabfung PBJ untuk Pokja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yaitu **50%**, dimana kebutuhan Jabfung PBJ sebanyak 20 orang dan sudah terisi sebanyak 10 orang.

2. Langkah-langkah yang telah dilakukan :

- a. Melakukan penguatan perencanaan dan pengumuman RUP lebih awal melalui kegiatan reviu penyusunan RUP dan monitoring terhadap RUP yang telah diumumkan melalui SiRUP.
- b. Percepatan pemilihan terutama pekerjaan fisik (konstruksi) agar tidak menumpuk di Triwulan III dan IV untuk menghindari keterlambatan penyelesaian fisik.
- c. Melakukan monitoring evaluasi kemajuan pelaksanaan fisik pekerjaan konstruksi ke OPD khusus paket – paket strategis, mengetahui permasalahan lebih awal untuk solusi penyelesaian.
- d. Pendampingan penyusunan rencana pengadaan dan pengendalian kontrak. Terutama kontrak kritis dimana Sesuai dengan Permen PU No. 07/PRT/M/2011 Buku PK 06A-BAB VII B6 Angka 39.2, kontrak dinyatakan kritis apabila:
 - ✓ Periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana.
 - ✓ Periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana.

- ✓ Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

Pada saat kontrak dinyatakan kritis, disarankan menerbitkan surat peringatan kepada Kontraktor/Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan *Show Cause Meeting* (SCM).

- e. Pembinaan dan penguatan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang Jasa dengan melaksanakan Bimtek kepada PPK dan Pokja Pemilihan terkait serta Pejabat Pengadaan.
- f. Pembentukan dan penetapan organisasi PBJ, khususnya PPK oleh PA tidak dibatasi/terikat Tahun Anggaran sehingga tidak menghambat proses pelaksanaan PBJ.
- g. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan OPD yang belum melaksanakan/mengalami keterlambatan pengadaan.
- h. Menyediakan layanan (Klinik) konsultasi pengadaan barang/jasa dan dibentuk Tim Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa.
- i. Melakukan koordinasi/konsultasi kepada LKPP melalui surat.

Demikian kami sampaikan untuk maklum dan mohon arahan lebih lanjut.
Terima kasih.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa,



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Wakil Bupati Buleleng sebagai laporan;
2. Yth. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng;
3. Yth. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng;
5. Yth. Kepala BPKPD Kabupaten Buleleng;
6. Yth. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng;
7. Arsip.

Laporan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng Melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Sampai dengan Bulan : **Agustus 2021**

A. PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

1. Data Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa TA 2021



Tangkapan Layar Monev Tepra

(<https://monev.lkpp.go.id/tepra/summary?instansi=D30&tahun=2021>)



Pagu Anggaran untuk belanja melalui pengadaan berubah menjadi **Rp 1.094.855.295.669,-**

2. Data Paket Pengadaan Yang Diproses Melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Berdasarkan RUP

No	Jenis Pengadaan	Rencana Umum Pengadaan TA 2021		Keterangan
		Paket	Pagu	
1	Barang	28	18.791.674.317	Tambahkan 2 Paket : 1 Paket RSUD awalnya rencana <i>e-purchasing</i> , dan 1 Paket Dinkes Konsultan Perencanaan
2	Konstruksi	62	235.248.478.885	
3	Konsultansi	18	7.240.899.393	
4	Jasa Lainnya	5	2.924.613.707	
Jumlah		113	264.205.666.302	


Sumber : <https://sirup.lkpp.go.id> per Agustus 2021

B. PROSES PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

1. Data Penyelesaian Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa

Jenis Pengadaan Barang/Jasa	Satuan	Total RUP TA 2021	Total Paket Dengan Nilai > 200 Juta (Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya) Dan Di Atas 50 Juta Untuk Jasa Konsultansi					Dalam Proses	Gagal/Tender Ulang	Ditunda/batal	Sisa Pekerjaan PBJ (3-(5+7+8+9))
			Paket Yang Masuk	Selesai		(% Jmlh Paket (7:4x100))	7				
1	2	3	4	Bulan Ini	S/d Bulan Ini			6	7	8	9
Barang	Paket	28	20	17	17	85,00	3	-	3	5	
	Pagu (Rp.)	18.791.674.317	15.681.981.227	13.859.305.477	13.859.305.477	88,38	1.822.675.750	-	1.150.450.000	1.959.243.090	
	HPS (Rp.)		13.854.515.105	12.777.816.105	12.777.816.105	92,23	1.076.699.000	-	-	-	
	Nilai Kontrak (Rp.)		11.247.324.325	11.247.324.325	11.247.324.325	100,00	-	-	-	-	
Konstruksi	Paket	62	54	53	53	98,15	-	1	-	8	
	Pagu (Rp.)	235.248.478.885	132.444.315.885	129.158.020.150	129.158.020.150	97,52	3.286.295.735	3.286.295.735	-	99.517.867.265	
	HPS (Rp.)		128.596.006.621	128.596.006.621	128.596.006.621	100,00	-	-	-	-	
	Nilai Kontrak (Rp.)		101.852.597.382	101.852.597.382	101.852.597.382	100,00	-	-	-	-	
Konsultansi	Paket	18	16	14	14	87,50	1	1	-	2	
	Pagu (Rp.)	7.240.899.393	4.674.995.128	4.116.745.503	4.116.745.503	88,06	558.249.625	301.200.000	-	2.264.704.265	
	HPS (Rp.)		3.924.408.839	3.924.408.839	3.924.408.839	100,00	-	-	-	-	
	Nilai Kontrak (Rp.)		3.232.810.410	3.232.810.410	3.232.810.410	100,00	-	-	-	-	
Jasa Lainnya	Paket	5	4	3	3	75,00	1	-	-	1	
	Pagu (Rp.)	2.924.613.707	2.683.596.707	2.479.353.007	2.479.353.007	92,39	204.243.700	-	-	241.017.000	
	HPS (Rp.)		2.447.682.489	2.248.003.789	2.248.003.789	91,84	199.678.700	-	-	-	
	Nilai Kontrak (Rp.)		1.885.020.540	1.885.020.540	1.885.020.540	100,00	-	-	-	-	
Jumlah Total	Paket	113	94	87	87	92,55	5	2	3	16	
	Pagu (Rp.)	264.205.666.302	155.484.888.947	149.613.424.137	149.613.424.137	96,22	5.871.464.810	3.587.495.735	1.150.450.000	103.982.831.620	
	HPS (Rp.)		148.822.613.053	147.546.235.353	147.546.235.353	99,14	1.276.377.700	-	-	-	
	Nilai Kontrak (Rp.)		118.217.752.657	118.217.752.657	118.217.752.657	100,00	-	-	-	-	

Dalam bentuk grafik

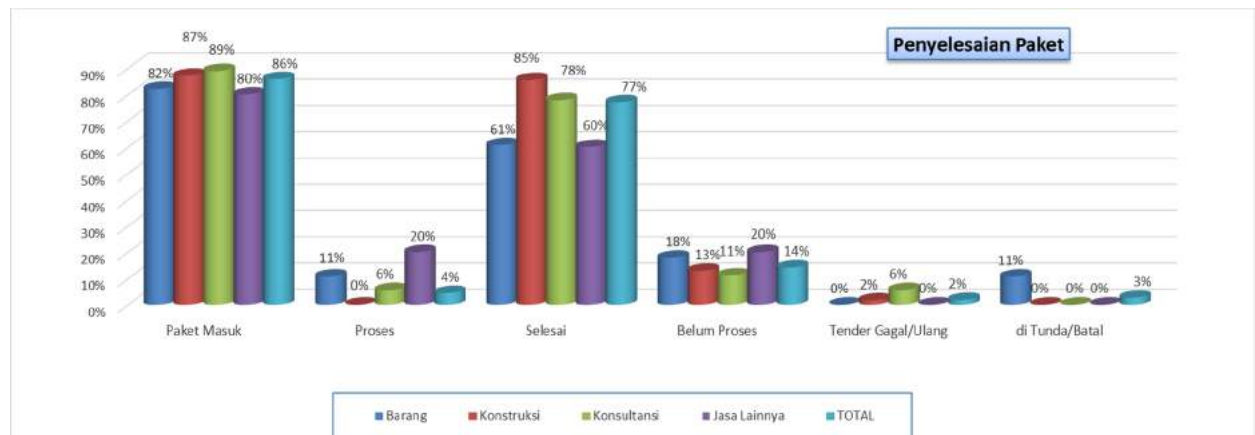


2. Ketepatan Waktu Penyelesaian Paket Sesuai Dengan RUP

Jenis Pengadaan Barang/Jasa	Target	Selesai		Deviasi (Target - Paket Selesai)	
		Paket	(%)	Paket (Target -Selesai)	(%)
1. Barang	28	17	60,71	11	39,29
2. Konstruksi	62	53	85,48	9	14,52
3. Konsultansi	18	14	77,78	4	22,22
4. Jasa Lainnya	5	3	60,00	2	40,00
Jumlah	113	87	76,99	26	23,01

Keterangan : Deviasi = Sisa Paket dibagi Target x 100 (dalam persen)

Dalam bentuk grafik

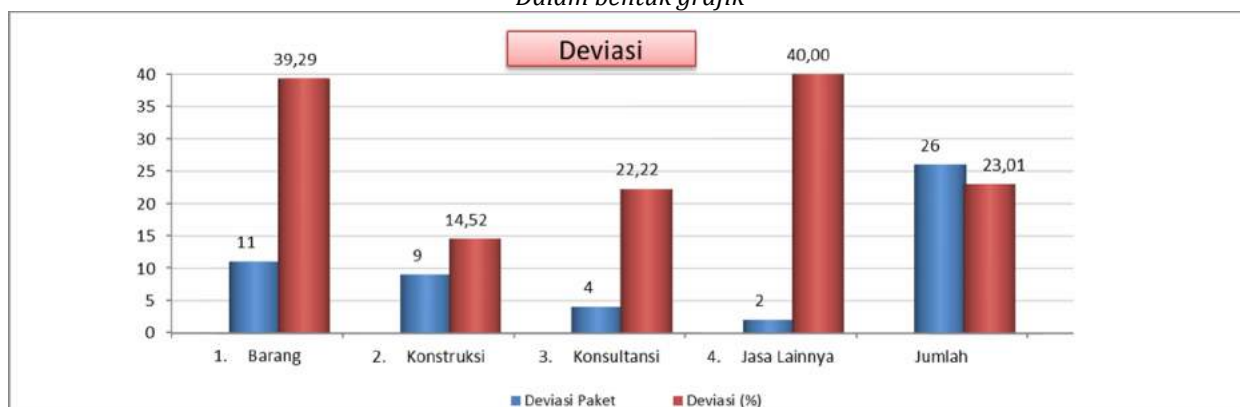

3. Daftar Proses Pengadaan Barang Jasa Berdasarkan Perangkat Daerah


No.	Nama Perangkat Daerah	Proses Pelaksanaan Tender					
		Jumlah	Dalam Proses	Sudah Selesai	Ditunda /Batal	Belum Proses	Gagal/Tender Ulang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	0	1	0	0	
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0	0	0	0	
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	0	0	0	0	
4	BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH	0	0	0	0	0	
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	4	0	4	0	0	
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	0	0	0	0	
7	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	0	0	0	0	0	
8	DINAS KEBUDAYAAN	0	0	0	0	0	
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	0	0	0	0	
10	DINAS KESEHATAN	20	0	9	0	9	2
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	1	0	1	0	0	
12	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK	0	0	0	0	0	
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2	0	2	0	0	
14	DINAS PARIWISATA	4	0	4	0	0	
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	38	0	36	0	2	
16	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	0	0	0	0	0	
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0	0	0	0	
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	0	0	0	0	
19	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	24	0	20	3	1	
20	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	0	1	0	0	
21	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	0	1	0	0	
22	DINAS PERHUBUNGAN	0	0	0	0	0	
23	DINAS PERTANIAN	3	0	2	0	1	
24	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0	0	0	0	0	
25	DINAS SOSIAL	0	0	0	0	0	
26	DINAS TENAGA KERJA	0	0	0	0	0	
27	INSPEKTORAT DAERAH	0	0	0	0	0	
28	KECAMATAN BANJAR	0	0	0	0	0	
29	KECAMATAN BULELENG	2	0	0	0	2	
30	KECAMATAN BUSUNGBIU	0	0	0	0	0	
31	KECAMATAN GEROKGAK	0	0	0	0	0	
32	KECAMATAN KUBUTAMBAHAN	0	0	0	0	0	
33	KECAMATAN SAWAN	0	0	0	0	0	
34	KECAMATAN SERIRIT	0	0	0	0	0	
35	KECAMATAN SUKASADA	0	0	0	0	0	

36	KECAMATAN TEJAKULA	0	0	0	0	0	
37	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	10	2	5	0	3	
38	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	0	0	0	0	
39	SEKRETARIAT DAERAH	1	0	1	0	0	
40	SEKRETARIAT DPRD	1	0	0	0	1	
	TOTAL	113	2	87	3	19	2

4. Data Efisiensi APBD Terhadap Pagu Anggaran dan HPS

Jenis Pengadaan Barang/Jasa	Paket	Pemilihan Selesai			Efisiensi			
		Pagu (Rp.)	HPS (Rp.)	Nilai Kontrak (Rp.)	Terhadap Pagu Anggaran (Rp.) (Pagu - Nilai Kontrak)		Terhadap HPS (Rp.) (HPS - Nilai Kontrak)	
					(Rp.)	%	(Rp.)	%
1. Barang	17	13.859.305.477,00	12.777.816.104,53	11.247.324.324,87	2.611.981.152,13	18,85	1.530.491.779,66	11,98
2. Konstruksi	53	129.158.020.149,68	128.596.006.620,81	101.852.597.381,58	27.305.422.768,10	21,14	26.743.409.239,23	20,80
3. Jasa Konsultansi	14	4.116.745.503,00	3.924.408.838,90	3.232.810.410,00	883.935.093,00	21,47	691.598.428,90	17,62
4. Jasa Lainnya	3	2.479.353.007,00	2.248.003.788,67	1.885.020.540,20	594.332.466,80	23,97	362.983.248,47	16,15
Jumlah	87	149.613.424.136,68	147.546.235.352,91	118.217.752.656,65	31.395.671.480,03	20,98	29.328.482.696,26	19,88


Dalam bentuk grafik

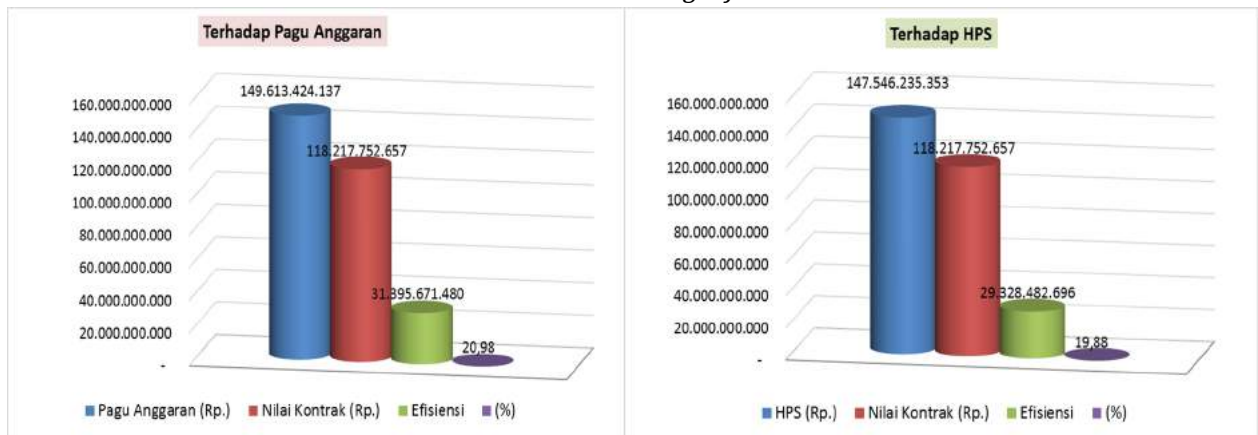

5. Tingkat Partisipasi Penyedia dan Kualitas Penawaran

No	Jenis Pengadaan Barang	Jumlah Paket	a. Partisipasi Penyedia		b. Kualitas penawaran		
			Jumlah Penawaran Yang Masuk	Rata-rata Partisipasi Penyedia/Paket (4:3)	Jumlah Penawaran Yang Di evaluasi	Penawaran Yang Memenuhi Syarat	(%) (7:6x100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Barang	28	84	3,00	76	54	71,05
2	Konstruksi	62	857	13,82	263	150	57,03
3	Konsultansi	18	96	5,33	86	49	56,98
4	Jasa Lainnya	5	19	3,80	15	5	33,33
	Jumlah	113	1.056	9,35	440	258	58,64

Dalam bentuk grafik

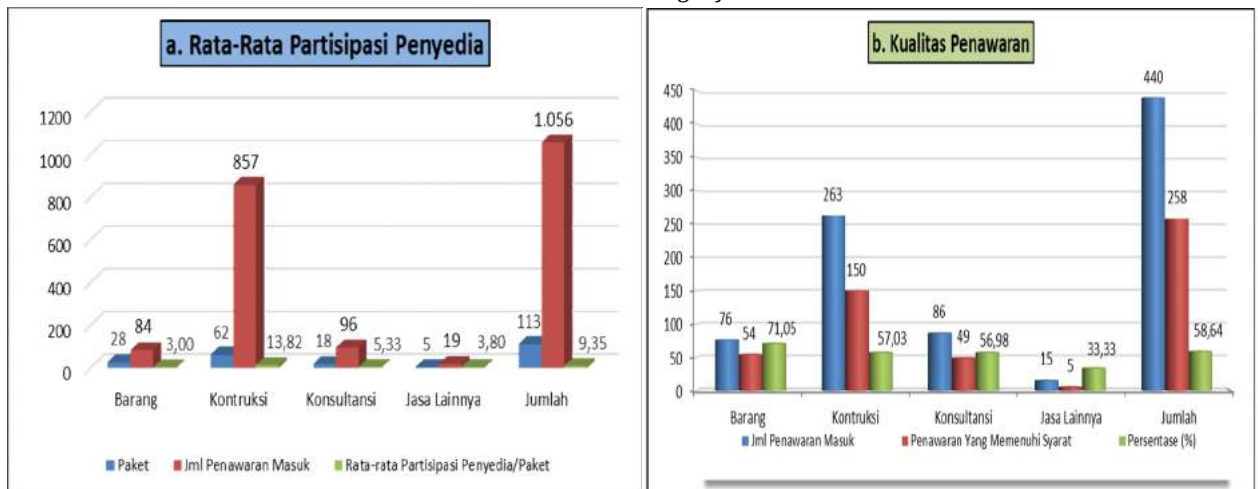

6. Sanggahan dari Penyedia

No.	Jenis Pengadaan Barang	Jumlah Paket Pemilihan Selesai Proses	Sanggahan		Tindak lanjut				Ket
			Jml	(%)	Sanggahan Penyedia Diterima		Jawaban Pokja		
					Evaluasi Ulang	Lelang Ulang	Diterima	Banding	
1	Barang	14	1	7,1%	-	-	1	-	-
2	Konstruksi	50	5	10%	1	-	4	-	-
3	Konsultansi	13	4	30,8%	-	-	4	-	-
4	Jasa Lainnya	3	0	0,0%	-	-	0	-	-
Jumlah		80	10	12,5%	1	-	9	-	-

7. Data Pengaduan

No	Asal Pengaduan/Hasil Pemeriksaan	Nama Kegiatan/ OPD	Jenis Pengadaan Barang/Jasa	Jml Pengaduan	Nilai Pekerjaan (Rp)	Jumlah Tindak Lanjut		Ket/ Penjelasan
						Selesai	Proses Lanjut	
1	APH							
2	Penyedia							
3	Masyarakat							
4	Media Masa							
Jumlah								


Nihil

8. DATA SEBARAN PEMENANG TENDER/SELEKSI/PEMILIHAN PENYEDIA



C. MONITORING PELAKSANAAN KONTRAK OPD

1. Data Paket Berkontrak OPD

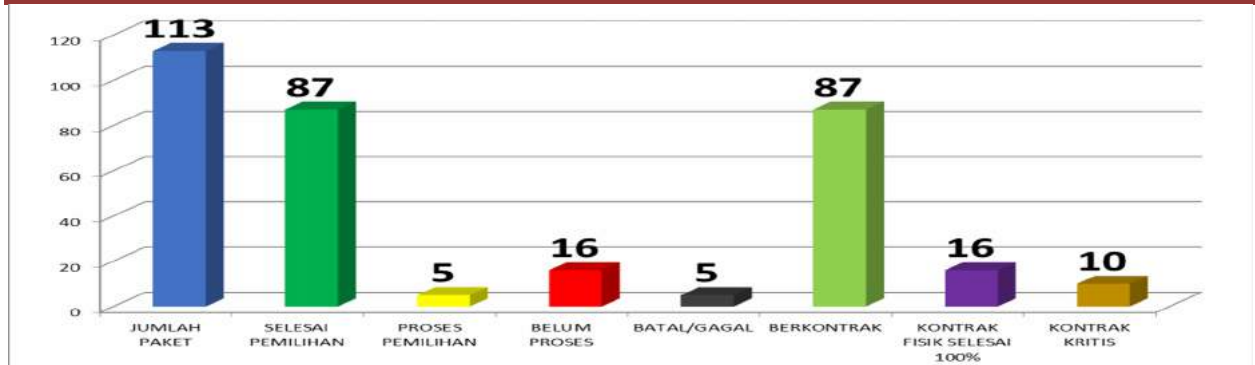

2. Data Kontrak Kritis dan Anprestasi

NO	NAMA SATKER	NAMA PAKET	NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	REALISASI FISIK	DEVIASI
1	2	3	5	6	7	8
1	DINAS PUTR	Supervisi Konstruksi Pembangunan Jembatan Pangkung Dalem Ruas Jalan SP3. Gitgit - Wanagiri	230.814.650	210 hari kalender	4,91 %	-21%
2	DINAS PUTR	Supervisi Konstruksi Penggantian Jembatan Tukad Buleleng Ruas Jalan Bakung - Sari Mekar - Padang Bulia	178.195.000	180 hari kalender	9,80 %	-27%
3	DINAS PUTR	Supervisi Konstruksi Peningkatan Jalan SP3. Tigawasa - Uma Sendi - Bingin Banjar	102.286.800	150 hari kalender	58,37 %	-41%
4	DINAS PUTR	Peningkatan SPAM Perdesaan Desa Tigawasa	1.206.549.631	150 hari kalender	84,20%	-11%
5	DINAS PUTR	Peningkatan Jalan SP3. Tigawasa - Uma Sendi - Bingin Banjar	6.835.332.555	150 hari kalender	58,37 %	-41%
6	DINAS PUTR	Pembangunan Jembatan Pangkung Dalem Ruas Jalan SP3. Gitgit - Wanagiri	6.810.504.951	210 hari kalender	4,91 %	-21%
7	DINAS PUTR	Penggantian Jembatan Tukad Buleleng Ruas Jalan Bakung - Sari Mekar - Padang Bulia	5.055.347.179	180 hari kalender	9,80 %	-27%
8	DISDIKPORA	Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 1 Paket Agung, SDN 2 Anturan, SDN 3 Pegayaman	1.394.941.000	120 Hari Kalender	11%	-14%
9	DISDIKPORA	BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG KELAS TK NEGERI PEMBINA KEC. GEROKGAK, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG GURU DAN KEPALA SEKOLAH TK NEGERI PEMBINA KEC. GEROKGAK , BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN PEMBANGUNAN AREA BERMAIN TK N DESA PANGKUNGPAPUK, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG KELAS TK N DESA PANGKUNGPAPUK, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG KELAS TK NEGERI DESA MUNDUK BESTALA	815.357.500,00	120 Hari Kalender	14,21%	-16%
10	DISDIKPORA	BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG KELAS TKN DESA BONTIHING, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG KELAS TKN DESA TAMBAKAN, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI TOILET (JAMBAN) TKN DESA TAMBAKAN	403.701.100,00	120 Hari Kalender	12,57%	-17%

D. Pengembangan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa

Pengembangan kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa sangatlah diperlukan dalam menunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa itu sendiri. Pengembangan SDM dalam hal ini dapat berupa pengembangan profesi maupun pengembangan keahlian. Bentuk-bentuk pengembangan SDM Pengadaan Barang/Jasa antara lain seperti : bimbingan teknis, sosialisasi, ujian kompetensi, dan lain sebagainya. Pada Tahun Anggaran 2021, Pengembangan SDM Pengadaan Barang/Jasa telah disiapkan anggaran sebesar Rp.429.480.600,- melalui Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (4.01.03.2.03.03).

E. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut diatas, proses pengadaan barang/jasa sampai dengan bulan **Agustus** 2021 disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Pengadaan barang/jasa yang diproses Pokja Pemilihan sampai dengan bulan Agustus 2021 sebanyak 97 paket (86%), dan **sudah selesai tender sebanyak 87 paket (76,99%)** dengan total nilai kontrak sebesar Rp. 118.217.752.656,65 (44,74%) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 264.205.666.301,68 yang sedang proses tender sebanyak 5 paket (4,42%), yang belum di proses sebesar 16 paket (14,16%) dan yang batal tender sebanyak 3 paket (2,65%) karena *refocusing* dan perubahan metode pemilihan menjadi *e-purchasing*.

- 2) Terdapat juga 2 paket pengadaan gagal proses yang sumber anggaran dari DAK pada Dinas Kesehatan yaitu Paket Belanja Jasa Konsultan Perencana Arsitektur-Jasa Desain Arsitektur senilai Rp.301.200.000,- dan Paket Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium senilai Rp.3.286.295.735,- karena tidak cukup waktu akibat perencanaan dan pembangunan fisik dalam satu tahun anggaran dan adanya beberapa perubahan regulasi.
- 3) Efisiensi anggaran sampai dengan Bulan Agustus 2021 dari 87 paket APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 yang sudah selesai proses tender sebesar **Rp. 29.328.482.696,26 (19,88%)** dari total HPS Rp. 147.546.235.352,91 dan sisa anggaran sebesar Rp. 31.395.671.480,03 (20,98%) dari total pagu anggaran Rp. 149.613.424.136,68.
- 4) Kendala/permasalahan dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana diuraikan diatas dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan adalah :
 - a. Masih terdapat perangkat daerah yang terlambat dalam mengajukan Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP) yang dikarenakan beberapa kendala antara lain :
 - ✓ Beberapa paket pengadaan masih dalam proses persiapan oleh PPK.
 - ✓ Beberapa paket konstruksi yang mengalami keterlambatan, masih berproses pada perencanaan, hal ini disebabkan karena perencanaan dan pelaksanaan pembangunan konstruksi dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama.
 - ✓ Terjadi kekeliruan dalam input waktu pelaksanaan pengadaan pada aplikasi SiRUP.
 - ✓ Kesalahan input rekening anggaran.
 - b. Terdapat beberapa perubahan regulasi pada pertengahan Tahun Anggaran yang memerlukan waktu tambahan untuk penyesuaian proses dan konsultasi/koordinasi dengan leading sector terkait.
 - c. Terdapat beberapa paket tambahan yang awalnya direncanakan Pemilihan Penyedia melalui e-purchasing namun dalam e-katalog tidak ditayangkan, sehingga perencanaan kurang matang dari sisi waktu proses Pemilihan Penyedia dan perencanaan pengadaan yang telah disusun di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
 - d. Dari monitoring pelaksanaan kontrak terdapat beberapa kontrak kritis
- 5) Dalam upaya peningkatan kinerja PBJ, dilakukan upaya sbb. :
 - a. Melakukan penguatan perencanaan dan pengumuman RUP lebih awal melalui kegiatan reviu penyusunan RUP dan monitoring terhadap RUP yang telah diumumkan melalui SiRUP.
 - b. Percepatan pemilihan terutama pekerjaan fisik (konstruksi) agar tidak menumpuk di Triwulan III dan IV untuk menghindari keterlambatan penyelesaian fisik.
 - c. Melakukan monitoring evaluasi kemajuan pelaksanaan fisik pekerjaan konstruksi ke OPD khusus paket – paket strategis, mengetahui permasalahan lebih awal untuk solusi penyelesaian.
 - d. Pendampingan penyusunan rencana pengadaan dan pengendalian kontrak. Terutama kontrak kritis dimana Sesuai dengan Permen PU No. 07/PRT/M/2011 Buku PK 06A-BAB VII B6 Angka 39.2, kontrak dinyatakan kritis apabila:
 - ✓ Periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana.
 - ✓ Periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana.
 - ✓ Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan. Pada saat kontrak dinyatakan kritis, disarankan menerbitkan surat peringatan kepada Kontraktor/Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan *Show Cause Meeting* (SCM).
 - e. Pembinaan dan penguatan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang Jasa dengan melaksanakan Bimtek kepada PPK dan Pokja Pemilihan terkait serta Pejabat Pengadaan.
 - f. Pembentukan dan penetapan organisasi PBJ, khususnya PPK oleh PA tidak dibatasi/terikat Tahun Anggaran sehingga tidak menghambat proses pelaksanaan PBJ.
 - g. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan OPD yang belum melaksanakan/mengalami keterlambatan pengadaan.
 - h. Menyediakan layanan (Klinik) konsultasi pengadaan barang/jasa dan dibentuk Tim Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa.

- i. Melakukan koordinasi/konsultasi kepada LKPP melalui surat.

Demikian laporan ini dibuat, untuk selanjutnya kami mohon arahan untuk perbaikan kinerja pengadaan berikutnya.

Singaraja, 7 September 2021
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa,



DATA TENDER/SELEKSI TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA SATKER	NAMA PAKET		PAGU	HPS	Nama Pemenang	Alamat	Nilai Hasil Tender(Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Efisiensi Rp.)	PROSES/BLELU M	SUMBER DANA	KET
1	2	3		8	9	15	16	18	19	20	21	23	24
01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	1	Rehabilitasi Bangunan Panti Benih/ Bangsal Hatchery dan Rehabilitasi kolam atau bak pemijahan/induk/ calon induk/ larva/ tandon	321.080.950	320.809.688	CV. UCINDO KARYA MANDIRI	Perumahan Mustika Laksmi Gg 4 No. 6 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali	232.869.921,04	88.211.029	87.939.767	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Buleleng
	JUMLAH 01	1		321.080.950	320.809.688			232.869.921,04	88.211.029	87.939.767			
2	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur- Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	349.437.000	349.294.000	CV. TRI MATRA DISAIN	Jalan Subur Gg. Mirah Cempaka II No. 17 Denpasar/Jln. Gatsu I/VII No. 3B Lt.I Denpasar - Denpasar (Kota) - Bali	345.745.400,00	3.691.600	3.548.600	Sudah Selesai	APBD	Denpasar
	JUMLAH 02	1		349.437.000	349.294.000			345.745.400	3.691.600	3.548.600			
3	SEKRETARIAT DAERAH	1	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermontor Perorangan	445.500.000	405.550.000	PT Agung Automall	JALAN CUT MUTIAH NO 14 MENTENG JAKARTA PUSAT 10330 - Jakarta Pusat (Kota) - DKI Jakarta	404.600.000	40.900.000	950.000	Sudah Selesai	APBD	Jakarta
	JUMLAH 03	1		445.500.000	405.550.000			404.600.000	40.900.000	950.000			
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Belanja jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawasan Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung	611.981.923	511.377.350	PT. KENCANA ADHI KARMA	JL. BATUSARI NOMOR 15 DENPASAR - Denpasar (Kota) - Bali	409.041.600	202.940.323	102.335.750	Sudah Selesai	APBD	Denpasar
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2	Belanja Modal Taman (Pembangunan RTH Taman Bung Karno Tahap IV	15.178.311.319	15.178.310.778	PT. SANUR JAYA UTAMA	Jalan Setia Budi, Kuta - Badung - Badung (Kab.) - Bali	15.027.351.458	150.959.861	150.959.320	Sudah Selesai	APBD	Badung
	JUMLAH 04	2		15.790.293.242	15.689.688.128	0	0	15.436.393.058	353.900.184	253.295.070			
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	1	BELANJA NATURA DAN PAKAN - NATURA.	682.586.825	657.633.400	CV KARYA SARI SEDANA	Banjar Dinas Sari Tapak Dara Kubutambahan, Buleleng - Buleleng (Kab.) - Bali	612.113.200	70.473.625	45.520.200	Sudah Selesai	APBD	Buleleng
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	2	BELANJA MODAL ALAT DAPUR.	678.300.000	673.164.000						Dalam Proses	APBD	
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	3	BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN.	452.500.000						0	Belum Proses	APBD	
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	4	BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG - BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA - BANGUNAN KESEHATAN.	500.000.000						0	Belum Proses	APBD	

NO	NAMA SATKER	NAMA PAKET		PAGU	HPS	Nama Pemenang	Alamat	Nilai Hasil Tender(Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Efisiensi Rp.)	PROSES/BLELU M	SUMBER DANA	KET
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	BELANJA MODAL ASET TETAP DALAM RENOVASI.	464.000.000	463.641.014,22	CV. Dewata Karya	Br. Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali	357.207.881,07	106.792.119	106.433.133	Sudah Selesai	APBD	Buleleng
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - ALAT TULIS KANTOR.	328.315.000	302.598.600	UD TRESNA JAYA	Jalan Ahmad Yani No.5 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali	236.935.530	91.379.470	65.663.070	Sudah Selesai	APBD	Buleleng
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7	BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA.	399.612.000	385.678.000	UD TRESNA JAYA	Jalan Ahmad Yani No.5 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali	265.402.609	134.209.391	120.275.391	Sudah Selesai	APBD	Buleleng
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	BELANJA LINEN.	417.543.025	415.207.500	cv.mulia abadi	jl. gajah mada no. 130 - Buleleng (Kab.) - Bali	406.494.000	11.049.025	8.713.500	Sudah Selesai	APBD	Buleleng
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	9	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - BAHAN CETAK.	204.243.700	199.678.700						Dalam Proses	APBD	
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	10	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	654.475.750							Dalam Proses		
	JUMLAH 05	10		4.781.576.300	3.097.601.214	0	0	1.878.153.220	413.903.630	346.605.294			
6	SEKRETARIAT DPRD	1	Rehabilitas/ Renovasi Ringan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana Lantai 1/ Pemasangan lantai Vynil dan dinding HPL	426.580.000							Belum Proses	APBD	
	JUMLAH 06	1		426.580.000	-	-	-	-	-	-			
7	DINAS PARIWISATA	1	Pembuatan Tempat Parkir Barat Di DTW Eks. Pelabuhan Buleleng	617.555.570	606.094.045,62	CV. Lissjaya Utama	Griya Panji Asri Blok P/5 Panji- Singaraja - Buleleng - Buleleng (Kab.) - Bali	484.875.236,50	132.680.334	121.218.809	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Buleleng
	DINAS PARIWISATA	2	Pembangunan Plaza/Pusat Jajanan Kuliner Di DTW Air Sanih Desa Bukti	285.000.000	284.999.121,18	CV. KRISNA PUTRA BAL	Wisma Arya Lantai I Blok 2, Jalan Pulau Irian No.36 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali	228.002.337,37	56.997.663	56.996.784	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Buleleng
	DINAS PARIWISATA	3	Pembangunan Plaza/Pusat Jajanan Kuliner Di DTW Pantai Lovina	285.000.000	284.961.920,55	CV. KRISNA PUTRA BALI	Wisma Arya Lantai I Blok 2, Jalan Pulau Irian No.36 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali	227.969.557,66	57.030.442	56.992.363	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Buleleng
	DINAS PARIWISATA	4	Pembuatan Tempat Parkir Barat Di DTW Pantai Lovina	257.480.400	257.466.895,40	CV ARYA DEWATA UTAMA	Wisma Arya Lanta I Blok 1, Jalan Pulau Irian No. 36 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali	202.700.000	54.780.400	54.766.895	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Buleleng
	JUMLAH 7	4		1.445.035.970	1.433.521.983	-	-	1.143.547.132	301.488.838	289.974.851			
8	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	1	Supervisi Konstruksi Pembangunan Jembatan Pangkung Dalem Ruas Jalan SP3. Gitgit - Wanagiri	259.000.000	258.443.900	PT. KENCANA ADHI KARMA	JL. BATUSARI NOMOR 15 DENPASAR - Denpasar (Kota) - Bali	230.814.650	28.185.350	27.629.250	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Denpasar
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	2	Supervisi Konstruksi Penggantian Jembatan Tukad Buleleng Ruas Jalan Bakung - Sari Mekar - Padang Bulia	222.000.000	221.998.150,00	PT. KENCANA ADHI KARMA	JL. BATUSARI NOMOR 15 DENPASAR - Denpasar (Kota) - Bali	178.195.000	43.805.000	43.803.150	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Denpasar

NO	NAMA SATKER	NAMA PAKET		PAGU	HPS	Nama Pemenang	Alamat	Nilai Hasil Tender(Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Efisiensi Rp.)	PROSES/BLELUM	SUMBER DANA	KET
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	3	Supervisi Konstruksi Peningkatan Jalan SP3. Tigawasa - Uma Sendi - Bingin Banjah	125.000.000	124.622.300	PT MITRA TRI SAKTI	JL. BUANA RAYA Gg. MEGA BUANA NO. 11 A PADANG SAMBIAN DENBAR - Badung (Kab.) - Bali	102.286.800	22.713.200	22.335.500	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Badung
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	4	Supervisi Konstruksi Pembangunan Jembatan Tukad Daya Ruas Jalan SP3. JN. Tikungan Bungkulun - Jembatan	185.000.000	184.999.100	PT MITRA TRI SAKTI	JL. BUANA RAYA Gg. MEGA BUANA NO. 11 A PADANG SAMBIAN DENBAR - Badung (Kab.) - Bali	148.365.800	36.634.200	36.633.300	Sudah Selesai	APBD	Badung
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	5	Penguatan Database dan Survey Kondisi Jembatan	150.000.000	146.022.800	CV. Yogawidya Sarana Desain	Jalan Nagasari No. 3x, Kel. Penatih Dangin Puri, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar - Tabanan (Kab.) - Bali	106.694.500	43.305.500	39.328.300	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Tabanan
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	6	Survey Kondisi Jalan	499.975.000	499.140.400	CV. Yogawidya Sarana Desain	Jalan Nagasari No. 3x, Kel. Penatih Dangin Puri, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar - Tabanan (Kab.) - Bali	349.764.800	150.210.200	149.375.600	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Tabanan
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	7	Peningkatan SPAM Perdesaan Desa Kayu Putih	896.140.000	896.139.263	CV. PUTRA BALI TIMUR	Jalan Sakura I Kelurahan Semarapura Klod Klungkung - Klungkung (Kab.) - Bali	658.100.000	238.040.000	238.039.263	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Klungkung
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	8	Peningkatan SPAM Perdesaan Desa Panji Anom	1.592.130.000	1.592.124.332	CV. ATMA KARYA	JALAN KARGO PASAR NO. 14 DENPASAR - Denpasar (Kota) - Bali	1.111.888.258	480.241.742	480.236.074	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Denpasar
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	9	Peningkatan SPAM Perdesaan Desa Tegallinggah	1.274.922.000	1.274.914.820	CV. PAYU JAYA SEJAHTERA	JALAN TUKAD BALIAN NO. 117 Z RENON, DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR, BALI - Denpasar (Kota) - Bali	889.845.700	385.076.300	385.069.120	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Denpasar
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	10	Peningkatan SPAM Perdesaan Desa Tigawasa	1.682.150.000	1.682.143.598	CV. ADI YASA	JALAN PULAU IRIAN DSN. KAJANAN DESA PENGLATAN - BULELENG - Buleleng (Kab.) - Bali	1.206.549.631,27	475.600.369	475.593.966	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Buleleng
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	11	Peningkatan SPAM Perdesaan Desa Wanagiri	1.251.171.000	1.251.162.094,74	CV. Kuarsa Teknik	Perum Nuansa Asri Pesona Blok A/10, Desa Bongan Tabanan - Tabanan (Kab.) - Bali	923.630.000	327.541.000	327.532.095	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Tabanan
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	12	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lanyahan Petandakan	1.896.059.117	1.896.059.117	CV. Perdana Niaga	Jalan Pulau Irian Gg. Anggur No. 5 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali	1.338.437.987,22	557.621.130	557.621.130	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Buleleng

NO	NAMA SATKER	NAMA PAKET		PAGU	HPS	Nama Pemenang	Alamat	Nilai Hasil Tender(Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Efisiensi Rp.)	PROSES/BLELU M	SUMBER DANA	KET
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	13	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tabang	1.815.402.936	1.815.402.936	CV. PUTRA BALE GEDE	Jalan Untung Surapati Kel. Padangkerta - Amlapura - Karang Asem (Kab.) - Bali	1.403.216.386,70	412.186.549	412.186.549	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Karangasem
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	14	Pengawasan/Supervisi Rehabilitasi Jaringan Irigasi	290.260.000	290.257.000	CV. TRI MATRA DISAIN	Jalan Subur Gg. Mirah Cempaka II No. 17 Denpasar/Jln. Gatsu I/VII No. 3B Lt.I Denpasar	225.060.000	65.200.000	65.197.000	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Denpasar
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	15	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jembong	1.278.218.032	1.278.211.111	PT General Technics	Jl. Pantai Baru, Banjar Dinas Dharma Yasa, Tukadmungga, Buleleng - Buleleng (Kab.) - Bali	969.756.731,69	308.461.300	308.454.379	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Buleleng
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kayu Putih	1.085.277.884	1.085.277.777	CV. Perdana Niaga	Jalan Pulau Irian Gg. Anggur No. 5 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali	802.742.408,12	282.535.476	282.535.369	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Buleleng
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	17	Pemuktahiran Sistem Informasi/ Data Base Jaringan Irigasi di Kabupaten Buleleng	130.000.000	129.932.440,00	CV. Yogawidya Sarana Desain	Jalan Nagasari No. 3x, Kel. Penatih Dangin Puri, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar	99.976.360	30.023.640	29.956.080	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Denpasar
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	18	Peningkatan Jalan Celukan Bawang - Pelabuhan	3.905.000.000	3.904.997.783,65	PT. BERAWANTANGI	JL. PADANG MEKAR NO. 3X - Denpasar (Kota) - Bali	3.008.864.744,74	896.135.255	896.133.039	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Denpasar
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	19	Peningkatan Jalan Lebah Siung Pancoran	4.725.000.000	4.724.994.442	PT.DHARMA BUANA KARYA	JALAN A.YANI AMLAPURA - Karang Asem (Kab.) - Bali	3.754.132.249,94	970.867.750	970.862.192	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Karangasem
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	20	Peningkatan Jalan Pulau Komodo	5.544.000.000	5.543.999.214,2	PT.DHARMA BUANA KARYA	JALAN A.YANI AMLAPURA - Karang Asem (Kab.) - Bali	4.280.895.938,62	1.263.104.061	1.263.103.276	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Karangasem
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	21	Peningkatan Jalan SP3. Tigawasa - Uma Sendi - Bingin Banjah	8.750.000.000	8.749.999.192,15	PT. DUARA BALI	Jl. Bung tomo A.3 Denpasar - Denpasar (Kota) - Bali	6.835.332.554,92	1.914.667.445	1.914.666.637	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Denpasar
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	22	Pembangunan Jembatan Pangkung Dalem Ruas Jalan SP3. Gitgit - Wanagiri	8.956.500.000	8.956.496.181,88	PT.ADI MURTI	Jalan Plawa No. 37 Denpasar Bali	6.810.504.951,37	2.145.995.049	2.145.991.231	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Denpasar
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	23	Penggantian Jembatan Tukad Buleleng Ruas Jalan Bakung - Sari Mekar - Padang Bulia	6.806.668.000	6.806.664.729,67	BIMA AGUNG	Jl. Bima I / 1B Semarang - Semarang (Kota) - Jawa Tengah	5.055.347.178,98	1.751.320.821	1.751.317.551	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Semarang
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	24	Pembangunan Jembatan Tukad Daya Ruas Jalan SP3. JN. Tikungan Bungkul - Jembatan	3.232.383.000	3.232.364.539,97	PT. TRI ASA CITRA ABADI	Jl. Raya Sading No. 25 A, Lingk. Karang Suwung, Sading, Mengwi - Badung - Badung (Kab.) - Bali	2.362.287.065,85	870.095.934	870.077.474	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Badung
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	25	Pengawasan/Supervisi Pembangunan SPAM Air Sanih	250.000.000	249.819.900	PT. KENCANA ADHI KARMA	JL. BATUSARI NOMOR 15 DENPASAR - Denpasar (Kota) - Bali	173.723.000	76.277.000	76.096.900	Sudah Selesai	APBD	Denpasar

NO	NAMA SATKER	NAMA PAKET		PAGU	HPS	Nama Pemenang	Alamat	Nilai Hasil Tender(Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Efisiensi Rp.)	PROSES/BLELU M	SUMBER DANA	KET
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	26	Pembangunan SPAM Air Sanih	14.720.372.100	14.748.108.893	PT.Karya Dewata Sarwa Indah	Jalan Kargo Pasar No. 18 Denpasar - Denpasar (Kota) - Bali	10.312.086.773,91	4.408.285.326	4.436.022.119	Sudah Selesai	APBD	Denpasar
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	27	Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Sanda	755.756.261	755.756.260,68	CV Graha Palimanan	Jln.Gunung Rinjani Blok IIA No. 4 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali	587.119.367,18	168.636.894	168.636.894	Sudah Selesai	APBD	Buleleng
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	28	Pengadaan Air Baku Desa Banyupoh	2.364.000.000	2.363.887.288,15	CV. Lissjaya Utama	Griya Panji Asri Blok P/5 Panji- Singaraja - Buleleng - Buleleng (Kab.) - Bali	1.891.109.830,40	472.890.170	472.777.458	Sudah Selesai	APBD	Buleleng
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	29	Pembangunan Gedung Rawat Jalan, Gedung Rawat Inap dan Bangunan Penunjang RSUD Kabupaten Buleleng	100.000.000.000							Belum Proses	APBD	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	30	Rehabilitasi Gedung dan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Buleleng	1.290.000.000	1.289.855.694	PT. JAYA GRAHA UTAMA	Jl. Siulan No.237 Penatih Dangin Puri, Denpasar - Denpasar (Kota) - Bali	1.002.259.525,45	287.740.475	287.596.169	Sudah Selesai	APBD	Denpasar
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	31	Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Bebetin - Sekumpul	655.704.000	655.683.249,53	CV. Lissjaya Utama	Griya Panji Asri Blok P/5 Panji- Singaraja - Buleleng - Buleleng (Kab.) - Bali	457.103.036,95	198.600.963	198.580.213	Sudah Selesai	APBD	Buleleng
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	32	Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Sekumpul – Lemukih	364.608.000	364.601.516,97	cv.inersia	BR. SEMANA, SINGAKERTA, UBUD, GIANYAR - Badung (Kab.) - Bali	246.465.334,12	118.142.666	118.136.183	Sudah Selesai	APBD	Badung
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	33	Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Sp3. Munduk - Munduk - Dusun Tamblingan	276.318.000	276.296.314,79	CV. KRISNA PUTRA BALI	Wisma Arya Lantai I Blok 2, Jalan Pulau Irian No.36 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali	194.900.000,00	81.418.000	81.396.315	Sudah Selesai	APBD	Buleleng
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	34	Rehabilitasi Jalan Asah Munduk- Pura Gubug	2.500.870.500	2.500.869.720,52	PT SARI SENTANA ARKA	Jalan Pasekan No. 4 Br. Kapal - Ds. Batubulan Kangan, Kec. Sukawati - Kab. Gianyar - Gianyar (Kab.) - Bali	2.339.373.646,57	161.496.853	161.496.074	Sudah Selesai	APBD	gianyar
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	35	Rehabilitasi Jalan Kayu Putih - Banyuatis	1.510.187.500	1.510.185.853,26	PT. BERAWANTANGI	JL. PADANG MEKAR NO. 3X - Denpasar (Kota) - Bali	1.425.215.059,38	84.972.441	84.970.794	Sudah Selesai	APBD	Denpasar
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	36	Pendampingan Pemenuhan Persyaratan dan Pembahasan untuk Persetujuan Substansi Perda RTRW Kabupaten	284.900.000	284.899.998,90	CV. TRI MATRA DISAIN	Jalan Subur Gg. Mirah Cempaka II No. 17 Denpasar/Jln. Gatsu I/VII No. 3B Lt.I Denpasar - Denpasar (Kota) - Bali	264.154.000	20.746.000	20.745.999	Sudah Selesai	APBD	Denpasar
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	37	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Padang Keling	1.999.892.031	1.999.892.031	CV. Sandi Yudha	Jl. Yudistira No.10 kendran - Buleleng (Kab.) - Bali	1.564.907.124,48	434.984.907	434.984.907	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Buleleng
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	38	Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Rawat Jalan, Gedung Rawat Inap dan Bangunan Penunjang RSUD Kabupaten Buleleng	2.500.000.000							Belum Proses	APBD	

NO	NAMA SATKER	NAMA PAKET		PAGU	HPS	Nama Pemenang	Alamat	Nilai Hasil Tender(Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Efisiensi Rp.)	PROSES/BLELU M	SUMBER DANA	KET
	JUMLAH 8	38		186.024.865.361	83.546.223.943			63.311.106.396	20.213.758.965	20.235.117.547			
9	KECAMATAN BULELENG	1	Belanja Natura dan Pakan-Natura	294.285.000							Belum Proses	APBD	
	KECAMATAN BULELENG	2	Belanja Natura dan Pakan-Natura	208.917.700							Belum Proses	APBD	
	JUMLAH 09	2		503.202.700	-			-	-	-			
10	DINAS KESEHATAN	1	BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG KANTOR.	4.567.500.000	4.567.499.000	CV. ARISTA CAHAYA BUANA	Br. Dinas Kelod Kangin Desa Bondalem - Buleleng (Kab.) - Bali	3.446.255.111,23	1.121.244.889	1.121.243.889	Sudah Selesai	APBD	Buleleng
	DINAS KESEHATAN	2	Belanja Modal alat kedokteran umum	449.000.400	442.161.667	PT. BALI WAHYU ABADI	Jl Gatot Subroto IID No 3 Denpasar - Denpasar (Kota) - Bali	438.900.000	10.100.400	3.261.667	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Denpasar
	DINAS KESEHATAN	3	Belanja Modal Alat Kesehatan umum lainnya	1.935.000.000	1.691.561.829	MUTIARA BERSAUDARA	JL. RAYA DEKET WETAN NO. 246 DEKET - Lamongan (Kab.) - Jawa Timur	1.247.400.000,00	687.600.000	444.161.829	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Jawa timur
	DINAS KESEHATAN	4	BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN	327.360.000							Belum Proses	APBD	
	DINAS KESEHATAN	5	Belanja Modal Alat Kesehatan umum lainnya	3.897.574.000	3.468.181.178,00	PT. Satria INFO SEJATI	Jl. Gunung Sari IV No. 37 Tegai Harum Denpasar - Barat -	3.266.596.770,80	630.977.229	201.584.407	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Denpasar
	DINAS KESEHATAN	6	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR.	519.590.390							Belum Proses	APBD	
	DINAS KESEHATAN	7	BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	536.998.000							Belum Proses	APBD	
	DINAS KESEHATAN	8	Belanja Jasa Kalibrasi	241.017.000							Belum Proses	APBD	
	DINAS KESEHATAN	9	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	3.286.295.735							Gagal Tender	APBD (DAK)	
	DINAS KESEHATAN	10	BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA.	261.525.000							Belum Proses	APBD	
	DINAS KESEHATAN	11	BELANJA PEMELIHARAAN INSTALASI-INSTALASI AIR KOTOR-INSTALASI AIR KOTOR LAINNYA.	299.200.000							Belum Proses	APBD	
	DINAS KESEHATAN	12	Belanja Jasa Konsultan Perencana Arsitektur-Jasa Desain Arsitektur	301.200.000							Gagal Tender	APBD (DAK)	
	DINAS KESEHATAN	13	Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	65.904.265							Belum Proses	APBD	
	DINAS KESEHATAN	14	BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN ARSITEKTUR JASA DESAIN ARSITEKTURAL.	465.519.600	421.520.000	PT MITRA TRI SAKTI	JL. BUANA RAYA Gg. MEGA BUANA NO. 11 A PADANG SAMBIAN DENBAR - Badung (Kab.) - Bali	378.763.000	86.756.600	42.757.000	Sudah Selesai	APBD	Badung
	DINAS KESEHATAN	15	BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REKAYASA JASA PENGAWAS PEKERJAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG.	293.671.980	252.081.500	PT. KENCANA ADHI KARMA	JL. BATUSARI NOMOR 15 DENPASAR - Denpasar (Kota) - Bali	220.225.500	73.446.480	31.856.000	Sudah Selesai	APBD	Denpasar
	DINAS KESEHATAN	16	(1.02.02.2.02.18) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	650.000.000	649.485.000	PT. Riasen Ary Wirawan	Perum Dalung Permai Blok K3 No. 12 Dalung - Badung - Badung (Kab.) - Bali	620.400.000	29.600.000	29.085.000	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Badung

NO	NAMA SATKER	NAMA PAKET		PAGU	HPS	Nama Pemenang	Alamat	Nilai Hasil Tender(Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Efisiensi Rp.)	PROSES/BLELU M	SUMBER DANA	KET
	DINAS KESEHATAN	17	Belanja modal alat kedokteran Lainnya	1.600.000.000	1.599.653.333,31	PT CML METRO MEDIKA	L. Raya Dalung No. 39B. Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Badung - Bali - Badung (Kab.) - Bali	1.448.480.000	151.520.000	151.173.333	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Badung
	DINAS KESEHATAN	18	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT.	236.300.000							Belum Proses	APBD	
	DINAS KESEHATAN	19	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	330.000.000	330.000.000	PT. BALI WAHYU ABADI	Jl Gatot Subroto IID No 3 Denpasar - Denpasar (Kota) - Bali	329.967.000	33.000	33.000	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Denpasar
		20	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan arsitektur- Jasa Desain Arsitektural, Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Bangunan Sederhana	257.049.625							Dalam Proses		
	JUMLAH 10	20		20.520.705.995	13.092.143.507	-	-	11.396.987.382	2.791.245.598	2.025.123.125			
11	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	1	BELANJA /ALAT BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR ALAT TULIS KANTOR.	760.407.487	640.690.875	CV. Delina	JALAN BATANGHARI NO 9A DENPASAR - Denpasar (Kota) - Bali	442.786.234	317.621.253	197.904.641	Sudah Selesai	APBD	Denpasar
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	2	PENGADAAN BAHAN KOMPUTER(TONER, TINTA, CATRIDGE)	628.266.740	458.972.008	CV ANDAR JAVAS INTI	Gondanglegi RT02/RW 22, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta - Sleman (Kab.) - DI Yogyakarta	379.335.000	248.931.740	79.637.008	Sudah Selesai	APBD	Yogyakarta
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	3	PENGADAAN CETAK BLANGKO.	265.041.330	219.012.757	CV. MAHA TIRTA	JALAN GAJAH MADA NO. 79 - Buleleng (Kab.) - Bali	167.541.000	97.500.330	51.471.757	Sudah Selesai	APBD	Buleleng
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	4	PENGADAAN CETAK BUKU DAN FOTO COPY.	944.231.677	758.911.032	UD. SUDIRMAN GRAFIKA	JL. SUDIRMAN GG.VI/ 5D, SINGARAJA, BULELENG, BALI - Buleleng (Kab.) - Bali	538.119.540,20	406.112.137	220.791.492	Sudah Selesai	APBD	Buleleng
	JUMLAH 11	4		2.597.947.234	2.077.586.672	0	0	1.527.781.774	1.070.165.460	549.804.897			
12	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	1	BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN BELANJA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 CEMPAGA, DAN BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 PEDAWA	1.236.661.200	1.234.077.349,93	CV. PUTRA CATUR DEWATA	JALAN ACHMAD YANI NO 135 A SINGARAJA - Buleleng (Kab.) - Bali	1.007.896.078,81	228.765.121	226.181.271	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Buleleng
	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	2	Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 1 Paket Agung, SDN 2 Anturan, SDN 3 Pegayaman	1.801.688.400	1.664.824.086,39	KRESNA DWIPA CV	Br.Metra Kelod, Ds.Yangapi, Tembuku, Bangli - Bangli (Kab.) - Bali	1.394.941.508,65	406.746.891	269.882.578	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Bangli

NO	NAMA SATKER	NAMA PAKET	PAGU	HPS	Nama Pemenang	Alamat	Nilai Hasil Tender(Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Efisiensi Rp.)	PROSES/BLELU M	SUMBER DANA	KET
	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	3 Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 1 Bongancina, SDN 4 Tista, SDN 3 Kedis, dan SDN 3 Busungbiu	2.046.702.000	2.011.759.607,41	CV. KARYA SENTOSA	JALAN BILAWA NO 49 DESA PERANCAK, JEMBRANA - BALI. - Jembrana (Kab.) - Bali	1.609.422.223,70	437.279.776	402.337.384	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Jembrana
	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	4 Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 4 Sumberkima, SDN 2 Penyabangan, SDN 1 Ringdikit dan SDN 1 Pengastulan	1.918.095.200	1.881.673.480,36	CV. BUMI RAYA	JALAN JALAK NO 12 SINGARAJA - Buleleng (Kab.) - Bali	1.542.010.045,12	376.085.155	339.663.435	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Buleleng
	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	5 Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 4 Kubutambahan, SDN 1 Sangsit dan SDN 3 Suwug	1.752.688.400	1.741.761.737,80	CV Dema Karya Mandiri	Jalan Pulau Komodo Gg Kresna No 15 Kelurahan Banyuning - Buleleng (Kab.) - Bali	1.478.712.411,43	273.975.989	263.049.326	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Buleleng
	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	6 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Belanja Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 3 Les, Belanja Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 3 Tembok, Belanja Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 5 Les	1.182.061.200	1.179.607.169,94	CV. Adi Putra	Jl. Gunung Batur Gang II No. 1 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali	925.022.928,54	257.038.271	254.584.241	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Buleleng
	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	7 Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas dan Pembangunan perpustakaan SDN 3 Bondalem	603.739.500	602.240.958,21	PT. Glebeg Bali Utama	Jl. Kargo Indah II No 11 Denpasar - Denpasar (Kota) - Bali	471.710.666,82	132.028.833	130.530.291	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Denpasar
	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	8 BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH SDN 1 BANJAR TEGAL, PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH SDN 1 SUKASADA, PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH SDN 1 GALUNGAN PEMBANGUNAN	1.300.314.600	1.300.298.293	CV. KARYA SENTOSA	JALAN BILAWA NO 49 DESA PERANCAK, JEMBRANA - BALI. - Jembrana (Kab.) - Bali	1.040.263.732,12	260.050.868	260.034.561	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Jembrana
	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	9 BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN PEMBANGUNAN RUANG GURU SD N 4 GOBLEG DAN BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN PEMBANGUNAN RUANG GURU SD N 1 BEBETIN	449.556.000	448.822.281,37	CV. SUWASTIKA JAYA	Jalan Ratulangi Depan Terminal No.8 - Buleleng (Kab.) - Bali	360.762.824,70	88.793.175	88.059.457	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Buleleng
	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	10 Belanja Modal Rehabilitasi ruang laboratorium IPA, Rehabilitasi ruang kelas, dan Rehabilitasi toilet (jamban) SMPN 1 Sukasada dan Rehabilitasi ruang kelas SMPN 3 Sukasada	1.024.502.000	1.010.209.082,78	CV. ADI YASA	JALAN PULAU IRIAN DSN. KAJANAN DESA PENGLATAN - BULELENG - Buleleng (Kab.) - Bali	767.154.259,64	257.347.740	243.054.823	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Buleleng

NO	NAMA SATKER	NAMA PAKET	PAGU	HPS	Nama Pemenang	Alamat	Nilai Hasil Tender(Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Efisiensi Rp.)	PROSES/BLELUM	SUMBER DANA	KET
	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	11 BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG KELAS SMPN SATU ATAP 3 SUKASADA, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG GURU SMP NEGERI SATU ATAP 3 SUKASADA, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI PERPUSTAKAAN SEKOLAH SMPN SATU ATAP 3 SUKASADA, DAN BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI TOILET/JAMBAN SMPN SATU ATAP 3 SUKASADA	1.001.000.000	981.693.193,45	CV SARI KARYA	Tanah Kapling Banyuning Tengah, Kelurahan Banyuning, Kab. Buleleng - Buleleng (Kab.) - Bali	750.158.938,78	250.841.061	231.534.255	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Buleleng
	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	12 Belanja Modal Rehabilitasi ruang guru, Rehabilitasi ruang kelas dan Rehabilitasi ruang UKS SMPN 1 Banjar dan Rehabilitasi ruang laboratorium komputer SMPN 2 Busungbiu	1.216.871.600	1.199.646.322,74	PT. Glebeg Bali Utama	Jl. Kargo Indah II No 11 Denpasar - Denpasar (Kota) - Bali	928.795.011,06	288.076.589	270.851.312	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Denpasar
	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	13 Belanja Modal Rehabilitasi ruang kelas, Rehabilitasi toilet (jamban) SMPN 1 Kubutambahan dan Rehabilitasi ruang kelas, Rehabilitasi toilet (jamban), Rehabilitasi ruang UKS SMPN 1 Sawan serta Rehabilitasi ruang kelas SMPN 4 Sawan	2.175.331.400	2.121.585.724,20	CV. Lissjaya Utama	Griya Panji Asri Blok P/5 Panji- Singaraja - Buleleng - Buleleng (Kab.) - Bali	1.638.885.855,80	536.445.544	482.699.868	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Buleleng
	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	14 Belanja Modal Rehabilitasi ruang kelas SMPN 1 Seririt dan Rehabilitasi ruang kelas, Rehabilitasi toilet (jamban) dan Rehabilitasi ruang laboratorium IPA serta Rehabilitasi ruang perpustakaan SMPN 4 Gerokgak	2.095.579.000	2.036.555.721,77	CV.KEMBAR SARI SEDANA	Jl.P Menjangan Perum Banyuning Permai Blok A/10 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali	1.628.737.434,10	466.841.565,90	407.818.288	sudah Selesai	APBD (DAK)	Buleleng
	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	15 Belanja Modal Rehabilitasi ruang kelas, Rehabilitasi toilet (jamban) SMPN 2 Singaraja dan Rehabilitasi ruang kelas SMPN 3 Singaraja dan Rehabilitasi ruang laboratorium komputer, Rehabilitasi ruang guru SMPN 6 Singaraja	2.088.711.000	2.016.372.567	CV.KEMBAR SARI SEDANA	Jl.P Menjangan Perum Banyuning Permai Blok A/10 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali	1.597.638.514,18	491.072.486	418.734.053	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Buleleng
	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	16 BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG KELAS SMPN 5 SINGARAJA, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG GURU SMP NEGERI 5 SINGARAJA, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG KELAS SMPN 7 SINGARAJA, DAN BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI LABORATORIUM IPA SMPN 7 SINGARAJA	1.552.819.000	1.516.178.980,42	CV. Lissjaya Utama	Griya Panji Asri Blok P/5 Panji- Singaraja - Buleleng - Buleleng (Kab.) - Bali	1.112.107.937,36	440.711.063	404.071.043	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Buleleng

NO	NAMA SATKER	NAMA PAKET	PAGU	HPS	Nama Pemenang	Alamat	Nilai Hasil Tender(Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Efisiensi Rp.)	PROSES/BLELU M	SUMBER DANA	KET
	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	17 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rehabilitasi ruang kelas, Rehabilitasi Ruang Guru dan Kepala Sekolah, Pembangunan area bermain TK Negeri Pembina Singaraja, dan Rehabilitasi ruang kelas TK N Pembina Kec. Sukasada	649.162.000	625.548.857,88	CV. Dewata Karya	Br. Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali	492.614.579,82	156.547.420	132.934.278	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Buleleng
	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	18 BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG KELAS TK NEGERI PEMBINA KEC. GEROKGAK, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG GURU DAN KEPALA SEKOLAH TK NEGERI PEMBINA KEC. GEROKGAK, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN PEMBANGUNAN AREA BERMAIN TK N DESA PANGKUNGPARUK, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG KELAS TK N DESA PANGKUNGPARUK, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG KELAS TK NEGERI DESA MUNDUK BESTALA	1.032.371.750	1.019.196.998,34	CV. SARI MERTA BAWA	BR. DINAS UMASARI KAUH, PERING SARI, SELAT - Karang Asem (Kab.) - Bali	815.357.598,83	217.014.151	203.839.400	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Karangasem
	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	19 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rehabilitasi ruang kelas TK Negeri Desa Banjar dan Rehabilitasi ruang kelas, Rehabilitasi Ruang Guru dan Kepala Sekolah TK N Desa Pedawa dan Pembangunan area bermain TK N Pembina Kec. Banjar	813.941.000	801.509.564,09	CV. SANTOSA	Jalan Yudistira No. 37 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali	604.608.605	209.332.395	196.900.959	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Buleleng
	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	20 BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG KELAS TKN DESA BONTIHING, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG KELAS TKN DESA TAMBAKAN, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI TOILET (JAMBAN) TKN DESA TAMBAKAN	575.566.300	546.215.240,47	CV. SANTOSA	Jalan Yudistira No. 37 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali	403.701.119,67	171.865.180	142.514.121	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Buleleng
	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	21 Pengadaan Media Pendidikan SMP	393.600.000							Batal	APBD (DAK)	
	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	22 Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi (TIK) SMP	240.250.000							Batal	APBD (DAK)	
	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	23 Pengadaan Media Pendidikan SD	516.600.000							Batal	APBD (DAK)	
	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	24 Kain Seragam Merah Putih dan Kain Seragam	700.150.000							Belum Proses	APBD	
	JUMLAH 12	24	28.367.961.550	25.939.777.218	-	-	20.570.502.274	5.946.859.276	5.369.274.944			
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.000.000	299.761.200	CV. Serba Lancar Abadi	Jl. WR. Supratman No. 412, Penarukan Buleleng, Bali - Buleleng (Kab.) - Bali	297.146.500	2.853.500	2.614.700	Sudah Selesai	APBD (DAK)	Buleleng
	JUMLAH 13	1	300.000.000	299.761.200	-	-	297.146.500	2.853.500	2.614.700			

MONITORING PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG / JASA TAHUN 2021

NO	NAMA SATKER	NAMA PAKET	PENYEDIA/ALAMAT	NILAI KONTRAK	SUMBER DANA	NO. KONTRAK	TANGGAL MULAI PELAKSANAAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	AGUSTUS		
									Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi KEU.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SEKRETARIAT DAERAH	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermontor Perorangan	PT Agung Automall JALAN CUT MUTIAH NO 14 MENTENG JAKARTA PUSAT 10330 - Jakarta Pusat (Kota) - DKI Jakarta	404.600.000	APBD	027/24/III/PPK/2021 (30 MARET 2021)	27-Apr-21	30 hari	100%	100%	Rp 404.600.000
2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Belanja jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawasan Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung	PT. KENCANA ADHI KARMA JL. BATUSARI NOMOR 15 DENPASAR - Denpasar (Kota) - Bali	409.041.600	APBD	600/05/PA-DLH/2021	11-Mei-21	210 hari kalender	32%	42%	Rp. 40.399.810,00
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Belanja Modal Taman (Pembangunan RTH Taman Bung Karno Tahap IV	PT. SANUR JAYA UTAMA Jalan Setia Budi, Kuta - Badung - Badung (Kab.) - Bali	15.027.351.458	APBD	600/07/PA-DLH/2021	11-Mei-21	210 hari kalender	32%	42%	Rp. 1.577.871.903,00
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - ALAT TULIS KANTOR.	UD TRESNA JAYA Jalan Ahmad Yani No.5 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali	236.935.530	APBD	027/738.11/2021 (18 maret 2021)	18-Mar-21	275 hari kalender	65%	84,97 %	Rp. 167.881.970
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA.	UD TRESNA JAYA Jalan Ahmad Yani No.5 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali	265.402.609	APBD	027/1074.3/2021 (28 april 2021)	28-Apr-21	243 hari kalender	57%	60%	Rp. 40.428.000
6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	BELANJA NATURA DAN PAKAN - NATURA.	CV KARYA SARI SEDANA Banjar Dinas Sari Tapak Dara Kubutambahan, Buleleng - Buleleng (Kab.) - Bali	612.113.200	APBD	027/1833.3.2021 (30 juni 2021)	30-Jun-21	184 hari kalender	35%	48,86 %	Rp -
7	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	BELANJA MODAL ASET TETAP DALAM RENOVASI.	CV. Dewata Karya Br. Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali	357.207.881,07	APBD	027/1947/2021 (12 Juli 2021)	14-Jul-21	60 hari kalender	75%	75%	Rp. 107.162.364,32
8	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	BELANJA LINEN.	cv.mulia abadi jl. gajah mada no. 130 - Buleleng (Kab.) - Bali	406.494.000,00	APBD	"027/1920.9/2021 (9 Juli 2021)"	09/07/2021	165 Hari Kalender	20%	60%	Rp -
9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Supervisi Konstruksi Pembangunan Jembatan Pangkung Dalem Ruas Jalan SP3. Gitgit - Wanagiri	PT. KENCANA ADHI KARMA JL. BATUSARI NOMOR 15 DENPASAR - Denpasar (Kota) - Bali	230.814.650	APBD (DAK)	620/2507.12/IV/2021 (19 april 2021)	18-Mei-21	210 hari kalender	25,89 %	4,91 %	Rp -
10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Supervisi Konstruksi Penggantian Jembatan Tukad Buleleng Ruas Jalan Bakung - Sari Mekar - Padang Bulia	PT. KENCANA ADHI KARMA JL. BATUSARI NOMOR 15 DENPASAR - Denpasar (Kota) - Bali	178.195.000	APBD (DAK)	620/2502/IV/2021 (19-04-2021)	19-Mei-21	180 hari kalender	36,48 %	9,80 %	Rp -

NO	NAMA SATKER	NAMA PAKET	PENYEDIA/ALAMAT	NILAI KONTRAK	SUMBER DANA	NO. KONTRAK	TANGGAL MULAI PELAKSANAAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	AGUSTUS		
									Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi KEU.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Supervisi Konstruksi Peningkatan Jalan SP3. Tigawasa - Uma Sendi - Bingin Banjar	PT MITRA TRI SAKTI JL. BUANA RAYA Gg. MEGA BUANA NO. 11 A PADANG SAMBIAN DENBAR - Badung (Kab.) - Bali	102.286.800	APBD (DAK)	620/1891/III/2021 (24 maret 2021)	30-Mar-21	150 hari kalender	99,57 %	58,37 %	Rp. 20.457.200
12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Supervisi Konstruksi Pembangunan Jembatan Tukad Daya Ruas Jalan SP3. JN. Tikungan Bungkulan - Jembatan	PT MITRA TRI SAKTI JL. BUANA RAYA Gg. MEGA BUANA NO. 11 A PADANG SAMBIAN DENBAR - Badung (Kab.) - Bali	148.365.800	APBD	620/2504/IV/2021 (19 april 2021)	19/04/2021	150 hari kalender	19,88 %	17,45 %	Rp -
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Peningkatan SPAM Perdesaan Desa Kayu Putih	CV. PUTRA BALI TIMUR Jalan Sakura I Kelurahan Semarapura Klod Klungkung - Klungkung (Kab.) - Bali	658.100.000	APBD (DAK)	690/2649/IV/2021	27/04/2021	150 hari kalender	96,52%	95,31%	Rp. 197.430.000
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Peningkatan SPAM Perdesaan Desa Panji Anom	CV. ATMA KARYA JALAN KARGO PASAR NO. 14 DENPASAR - Denpasar (Kota) - Bali	1.111.888.258	APBD (DAK)	690/2512/IV/2021	20/04/2021	150 hari kalender	95,99%	96,15%	Rp. 333.566.477
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Peningkatan SPAM Perdesaan Desa Tegallinggah	CV. PAYU JAYA SEJAHTERA JALAN TUKAD BALIAN NO. 117 Z RENON, DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR, BALI - Denpasar (Kota) - Bali	889.845.700	APBD (DAK)	690/2684/IV/2021	28/04/2021	150 hari kalender	90,39%	93,05%	Rp. 266.953.710
16	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Peningkatan SPAM Perdesaan Desa Tigawasa	CV. ADI YASA JALAN PULAU IRIAN DSN. KAJANAN DESA PENGLATAN - BULELENG - Buleleng (Kab.) - Bali	1.206.549.631	APBD (DAK)	690/2618/IV/2021	26/04/2021	150 hari kalender	94,71%	84,20%	Rp. 361.964.889
17	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Peningkatan SPAM Perdesaan Desa Wanagiri	CV. Kuarsa Teknik Perum Nuansa Asri Pesona Blok A/10, Desa Bongan Tabanan - Tabanan (Kab.) - Bali	923.630.000	APBD (DAK)	690/2615/IV/2021	26/04/2021	150 hari kalender	87,54%	87,99%	Rp. 277.089.000
18	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Pengawasan/Supervisi Rehabilitasi Jaringan Irigasi	CV. TRI MATRA DISAIN Jalan Subur Gg. Mirah Cempaka II No. 17 Denpasar/Jln. Gatsu I/VI No. 3B Lt.I Denpasar	225.060.000	APBD (DAK)	611/3302/IV/2021 (19 mei 2021)	19-Mei-21	150 hari kalender	69,33 %	69,33 %	Rp -

NO	NAMA SATKER	NAMA PAKET	PENYEDIA/ALAMAT	NILAI KONTRAK	SUMBER DANA	NO. KONTRAK	TANGGAL MULAI PELAKSANAAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	AGUSTUS		
									Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi KEU.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Pemuktahiran Sistem Informasi/ Data Base Jaringan Irigasi di Kabupaten Buleleng	CV. Yogawidya Sarana Desain Jalan Nagasari No. 3x, Kel. Penatih Dangin Puri, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar	99.976.360	APBD	611/3263/V/2021 (18 mei 2021)	18-Mei-21	60 hari kalender	100%	100%	Rp. 1.362.100.800
20	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Peningkatan Jalan Celukan Bawang - Pelabuhan	PT. BERAWANTANGI JL. PADANG MEKAR NO. 3X - Denpasar (Kota) - Bali	3.008.864.745	APBD (DAK)	620/1840/III/2021 (18 maret 2021)	30-Mar-21	120 hari kalender	100%	100%	Rp 1.564.609.280
21	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Peningkatan Jalan Lebah Siung Pancoran	PT.DHARMA BUANA KARYA JALAN A.YANI AMLAPURA - Karang Asem (Kab.) - Bali	3.754.132.250	APBD (DAK)	620/1843/III/2021 (18 maret 2021)	30-Mar-21	120 hari kalender	100%	100%	Rp. 2.853.140.320
22	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Peningkatan Jalan Pulau Komodo	PT.DHARMA BUANA KARYA JALAN A.YANI AMLAPURA - Karang Asem (Kab.) - Bali	4.280.895.939	APBD (DAK)	620/1842/III/2021 (18 maret 2021)	30-Mar-21	120 hari kalender	100%	100%	Rp. 2.226.065.400
23	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Peningkatan Jalan SP3. Tigawasa - Uma Sendi - Bingin Banjar	PT. DUARA BALI Jl. Bung tomo A.3 Denpasar - Denpasar (Kota) - Bali	6.835.332.555	APBD (DAK)	620/1841/III/2021 (18 maret 2021)	30-Mar-21	150 hari kalender	99,57 %	58,37 %	Rp. 1.367.066.400
24	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Pembangunan Jembatan Pangkung Dalem Ruas Jalan SP3. Gitgit - Wanagiri	PT.ADI MURTI Jalan Plawa No. 37 Denpasar Bali	6.810.504.951	APBD (DAK)	620/3252/V/2021 (18 mei 2021)	18-Mei-21	210 hari kalender	25,89 %	4,91 %	Rp. 1.362.100.800
25	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Penggantian Jembatan Tukad Buleleng Ruas Jalan Bakung - Sari Mekar - Padang Bulia	BIMA AGUNG Jl. Bima I / 1B Semarang - Semarang (Kota) - Jawa Tengah	5.055.347.179	APBD (DAK)	620/3253/V/2021 (18 mei 2021)	19-Mei-21	180 hari kalender	36,48 %	9,80 %	Rp. 1.011.069.400
26	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Pendampingan Pemenuhan Persyaratan dan Pembahasan untuk Persetujuan Substansi Perda RTRW Kabupaten	CV. TRI MATRA DISAIN Jalan Subur Gg. Mirah Cempaka II No. 17 Denpasar/Jln. Gatsu I/VII No. 3B Lt.I Denpasar - Denpasar (Kota) - Bali	264.154.000	APBD	640/3070/V/2021 (6 MEI 2021)	06-Mei-21	120 hari kalender	98%	100%	Rp -
27	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tabang	CV. PUTRA BALE GEDE Jalan Untung Surapati Kel. Padangkerta - Amlapura - Karang Asem (Kab.) - Bali	1.403.216.387	APBD (DAK)	611/3300/V/2021 (19 mei 2021)	19-Mei-21	150 hari kalender	82,71 %	100%	Rp. 1.059.428.371
28	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jembong	PT General Technics Jl. Pantai Baru, Banjar Dinas Dharma Yasa, Tukadmungga, Buleleng - Buleleng (Kab.) - Bali	969.756.732	APBD (DAK)	611/3292/V/2021 (19 mei 2021)	19-Mei-21	150 hari kalender	70,71 %	74,62 %	Rp. 290.927.019
29	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kayu Putih	CV. Perdana Niaga Jalan Pulau Irian Gg. Anggur No. 5 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali	802.742.408	APBD (DAK)	611/3298/V/2021 (19 mei 2021)	19-Mei-21	150 hari kalender	68%	74,87 %	Rp. 802.742.408

NO	NAMA SATKER	NAMA PAKET	PENYEDIA/ALAMAT	NILAI KONTRAK	SUMBER DANA	NO. KONTRAK	TANGGAL MULAI PELAKSANAAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	AGUSTUS		
									Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi KEU.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lanyahan Petandakan	CV. Perdana Niaga Jalan Pulau Irian Gg. Anggur No. 5 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali	1.338.437.987	APBD (DAK)	611/3296/V/2021 (19 mei 2021)	19-Mei-21	150 hari kalender	69,37 %	89,4 %	Rp. 869.984.691
31	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Padang Keling	CV. Sandi Yudha Jl. Yudistira No.10 kendran - Buleleng (Kab.) - Bali	1.564.907.124	APBD (DAK)	611/3294/V/2021 (19 mei 2021)	19-Mei-21	150 hari kalender	80,66 %	83,87 %	Rp. 469.472.137
32	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Bebetin - Sekumpul	CV. Lissjaya Utama Griya Panji Asri Blok P/5 Panji-Singaraja - Buleleng - Buleleng (Kab.) - Bali	457.103.036,95	APBD	620/3306/V/2021	19-Mei-21	120 hari kalender	80,27 %	90,42 %	Rp. 137.130.900
33	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Sekumpul – Lemukih	cv.inersia BR. SEMANA, SINGAKERTA, UBUD, GIANYAR - Badung (Kab.) - Bali	246.465.334,12	APBD	620/3310/V/2021	19-Mei-21	120 hari kalender	81,37 %	94,33 %	Rp. 73.939.500
34	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Sp3. Munduk - Munduk - Dusun Tamblingan	CV. KRISNA PUTRA BALI Wisma Arya Lantai I Blok 2, Jalan Pulau Irian No.36 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali	194.900.000,00	APBD	620/3314/V/2021	19-Mei-21	120 hari kalender	100%	100%	Rp -
35	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Rehabilitasi Gedung dan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Buleleng	PT. JAYA GRAHA UTAMA Jl. Siulan No.237 Penatih Dangin Puri, Denpasar - Denpasar (Kota) - Bali	1.002.259.525	APBD	640/4154/VI/2021 (21 juni 2021)	21/06/2021	180 hari kalender	19,058%	34%	Rp 300.677.700
36	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Pembangunan Jembatan Tukad Daya Ruas Jalan SP3. JN. Tikungan Bungulan - Jembatan	PT. TRI ASA CITRA ABADI Jl. Raya Sading No. 25 A, Lingk. Karang Suwung, Sading, Mengwi - Badung - Badung (Kab.) - Bali	2.362.287.065,85	APBD (DAK)	620/4445/VI/2021 (30 juni 2021)	05-Jul-21	150 hari kerja	19,88%	17,45%	Rp. 416.621.525
37	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Pengawasan/Supervisi Pembangunan SPAM Air Sanih	PT. KENCANA ADHI KARMA JL. BATUSARI NOMOR 15 DENPASAR - Denpasar (Kota) - Bali	173.723.000	BKK Prov. Bali	690/4572/VIII/2021 (01 Juli 2021)	01-Jul-21	180 hari kalender	20%	22%	Rp -
38	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Pembangunan SPAM Air Sanih	PT.Karya Dewata Sarwa Indah Jalan Kargo Pasar No. 18 Denpasar - Denpasar (Kota) - Bali	10.312.086.773,91	BKK Prov. Bali	690/4569/VIII/2021 (01 Juli 2021)	01-Jul-21	180 hari kalender	20%	22%	Rp -
39	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sanda	CV Graha Palimanan jln.Gunung Rinjani Blok IIA No. 4 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali	587.119.367,18	APBD	611/4744/VII/2021 (7 Juli 2021)	07-Jul-21	150 hari kalender	13,35 %	20,13 %	Rp -
40	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Pengadaan Air Baku Desa Banyupoh	CV. Lissjaya Utama Griya Panji Asri Blok P/5 Panji-Singaraja - Buleleng - Buleleng (Kab.) - Bali	1.891.109.830,40	APBD	611/4851/VIII/2021 (12 Juli 2021)	12-Jul-21	151 hari kalender	5,59 %	5,3 %	Rp -

NO	NAMA SATKER	NAMA PAKET	PENYEDIA/ALAMAT	NILAI KONTRAK	SUMBER DANA	NO. KONTRAK	TANGGAL MULAI PELAKSANAAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	AGUSTUS		
									Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi KEU.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Survey Kondisi Jalan	CV. Yogawidya Sarana Desain Jalan Nagasari No. 3x, Kel. Penatih Dangin Puri, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar	349.764.800,00	APBD (DAK)	620/5032/VII/2021 (19 Juli 2021)	19-Jul-21	150	12%	22%	Rp
42	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Penguatan Database dan Survey Kondisi Jembatan	CV. Yogawidya Sarana Desain Jalan Nagasari No. 3x, Kel. Penatih Dangin Puri, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar	106.694.500,00	APBD (DAK)	620/5035/VII/2021 (19 Juli 2021)	19-Jul-21	120	20%	34%	Rp
43	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Rehabilitasi Jalan Asah Munduk- Pura Gubug	PT SARI SENTANA ARKA Jalan Pasekan No. 4 Br. Kapal - Ds. Batubulan Kangin, Kec. Sukawati - Kab. Gianyar - Gianyar (Kab.) - Bali	2.339.373.646,57	APBD	620/5683/VII/2021	16-Agust-21	120	1,42 %	0,47 %	Rp
44	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Rehabilitasi Jalan Kayu Putih - Banyuatis	PT. BERAWANTANGI JL. PADANG MEKAR NO. 3X - Denpasar (Kota) - Bali	1.425.215.059,38	APBD	620/5681/VIII/2021(16 Agustus 2021)	18-Agust-21	120	0%	0%	Rp
45	DINAS KESEHATAN	Belanja modal alat kedokteran Lainnya	PT CML METRO MEDIKA JL. Raya Dalung No. 39B. Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Badung - Bali - Badung (Kab.) - Bali	1.448.480.000	APBD (DAK)	027/0002/DINKES/VII/20121	1 Juli 2021	120 hari kalender	100%	100%	Rp
46	DINAS KESEHATAN	BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN ARSITEKTUR JASA DESAIN ARSITEKTURAL.	PT MITRA TRI SAKTI JL. BUANA RAYA Gg. MEGA BUANA NO. 11 A PADANG SAMBIAN DENBAR - Badung (Kab.) - Bali	378.763.000	APBD	027/279/V/2021	03-Mei-21	60 hari kalender	100%	100%	Rp
47	DINAS KESEHATAN	Belanja Modal alat kedokteran umum	PT. BALI WAHYU ABADI Jl Gatot Subroto IID No 3 Denpasar - Denpasar (Kota) - Bali	438.900.000,00	APBD (DAK)	027/60/VII/2021 (7 Juli 2021)	7 Juli 2021	90 HARI KALENDER	100%	0%	Rp
48	DINAS KESEHATAN	Belanja Modal Alat Kesehatan umum lainnya	MUTIARA BERSAUDARA JL. RAYA DEKET WETAN NO. 246 DEKET - Lamongan (Kab.) - Jawa Timur	1.247.400.000,00	APBD (DAK)	027/71/VII/2021	14 Juli 2021	90 HARI KALENDER	100%	0%	Rp
49	DINAS KESEHATAN	(1.02.02.2.02.18) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	PT. Riasen Ary Wirawan Perum Dalung Permai Blok K3 No. 12 Dalung - Badung - Badung (Kab.) - Bali	620.400.000,00	APBD (DAK)	027/0005/DINKES/2021 02/13/RAW/VII/2021 (13 Juli 2021)	13 Juli 2021	150 hari	100%	0%	Rp

NO	NAMA SATKER	NAMA PAKET	PENYEDIA/ALAMAT	NILAI KONTRAK	SUMBER DANA	NO. KONTRAK	TANGGAL MULAI PELAKSANAAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	AGUSTUS		
									Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi KEU.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	DINAS KESEHATAN	BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REKAYASA JASA PENGAWAS PEKERJAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG.	PT. KENCANA ADHI KARMA JL. BATUSARI NOMOR 15 DENPASAR - Denpasar (Kota) - Bali	220.225.500,00	APBD	027/542/VIII/2021 (3 Agustus 2021)	16-Agust-21	120 hari kalender	100,00%	100%	Rp -
51	DINAS KESEHATAN	BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG KANTOR.	CV. ARISTA CAHAYA BUANA Br. Dinas Kelod Kangin Desa Bondalem - Buleleng (Kab.) - Bali	3.446.255.111,23	APBD	027/564/VIII/2021 (16 Agustus 2021)	16-Agust-21	120 hari kalender	0,29%	0,42%	Rp -
52	DINAS KESEHATAN	Belanja Modal Alat Kesehatan umum lainnya	PT. SATRIA INFO SEJATI Jl. Gunung Sari IV No. 37 Tegal Harum Denpasar - Barat - Denpasar (Kota) - Bali	3.266.596.770,80	APBD (DAK)	027/0008/VIII/2021	23-Agust-21	90 hari kalender	100%	0%	Rp -
53	DINAS KESEHATAN	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	PT. BALI WAHYU ABADI Jl Gatot Subroto IID No 3 Denpasar - Denpasar (Kota) - Bali	329.967.000,00	APBD	027/92/VIII/2021	23- Agustustus-2021	60 hari kalender	100%	0%	Rp -
54	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	BELANJA /ALAT BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR ALAT TULIS KANTOR.	CV. Delina JALAN BATANGHARI NO 9A DENPASAR - Denpasar (Kota) - Bali	442.786.234	APBD	027/05/II/PPK-BPKPD/2021 027/06/II/PPK-BPKPD/2021	25/02/021	300 hari	60%	65,92%	Rp. 279.844.534,00
55	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	PENGADAAN CETAK BLANGKO.	CV. MAHA TIRTA JALAN GAJAH MADA NO. 79 - Buleleng (Kab.) - Bali	167.541.000	APBD	027/10/IV/PPK-BKPD/2021	20/04/2021	255 hari kalender	40%	32,86%	Rp. 38.951.000
56	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	PENGADAAN CETAK BUKU DAN FOTO COPY.	UD. SUDIRMAN GRAFIKA JL. SUDIRMAN GG.VI/ 5D, SINGARAJA, BULELENG, BALI - Buleleng (Kab.) - Bali	538.119.540	APBD	027/14/IV/PPK-BKPD/2021 027/16/IV/PPK-BKPD/2021	20/04/2021	253 hari kalender	11,62 %	34,09%	Rp. 6.796.993
57	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	PENGADAAN BAHAN KOMPUTER(TONER, TINTA, CATRIDGE)	CV ANDAR JAVAS INTI Gondanglegi RT02/RW 22, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta - Sleman (Kab.) - DI Yogyakarta	379.335.000	APBD	027/04/VII/PPK-BPKPD/2021 027/05/VII/PPK-BPKPD/2021	1 Juli 2021	175 HARI KALENDER	70%	70,50 %	Rp. 157.409.500,00
58	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	Rehabilitasi Bangunan Panti Benih/ Bangsal Hatchery dan Rehabilitasi kolam atau bak pemijahan/induk/ calon induk/ larva/tandon	CV. UCINDO KARYA MANDIRI Perumahan Mustika Laksmi Gg 4 No. 6 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali	232.869.921	APBD (DAK)	027/1235/VI/PPK/DKPP/2021 (31 Mei 2021)	31 mei 2021	90 HARI KALENDER	100%	100%	Rp -

NO	NAMA SATKER	NAMA PAKET	PENYEDIA/ALAMAT	NILAI KONTRAK	SUMBER DANA	NO. KONTRAK	TANGGAL MULAI PELAKSANAAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	AGUSTUS		
									Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi KEU.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Belanja Akomodasi Pelatihan Dasar CPNS	PT. Nusa Indah Bali (Hotel Puri Nusa Indah) / Jalan Waribang No. 99 Denpasar	741.195.000,00	APBD	027/ 26.5 /II/PPK /BKPSDM /2021 Tanggal 26 Juli 2021	gelombang I : on campus 1 tanggal 26 juli 2021 s/d 18 agustus 2021 dan campus II dari tgl 4 Oktober s/d 6 Oktober 2021 Gelombang II : on campus tgl 11 agustus 2021 s/d 4 September 2021 dan on campus II dr tgl 16 oktober 2021 s/d 19 oktober 2021 Gelombang III: on campus I tgl 23 agustus 2021 s/d 15 september 2021 dan on campus II dr tgl 1 Nopember s/d 3 Nopember 2021	21 hari kerja/ on campus setiap gelombang	60,32 %	60,32 %	Rp
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Belanja Akomodasi Pelatihan Dasar CPNS	Puri Saron Hotel Denpasar / Jalan Gatot Subroto Barat No. 459 C Denpasar	471.870.000	APBD	027/ 16.1 /III /PPK /BKPSDM /2021 Tanggal 16 Agustus 2021	- Gelombang IV : on campus I tanggal 8 September 2021 s/d 28 September 2021 dan on campus II dari tanggal 16 Nopember s/d 18 Nopember 2021	21 hari kerja/on campus setiap gelombang	0%	0%	Rp
60	DINAS PARIWISATA	Pembuatan Tempat Parkir Barat Di DTW Pantai Lovina	CV ARYA DEWATA UTAMA Wisma Arya Lanta I Blok 1, Jalan Pulau Irian No. 36 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali	202.700.000	APBD (DAK)	556/24/VI/2021 (11 juni 2021)	11/06/2021	90 HARI KALENDER	76,50 %	100%	Rp. 60.810.000
61	DINAS PARIWISATA	Pembangunan Plaza/Pusat Jajanan Kuliner Di DTW Air Sanih Desa Bukti	CV. KRISNA PUTRA BALI Wisma Arya Lantai I Blok 2, Jalan Pulau Irian No.36 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali	228.002.337	APBD (DAK)	556/53/VI/2021 (6 Juli 2021)	6 Juli 2021	90 HARI KALENDER	48,03 %	49,03 %	Rp

NO	NAMA SATKER	NAMA PAKET	PENYEDIA/ALAMAT	NILAI KONTRAK	SUMBER DANA	NO. KONTRAK	TANGGAL MULAI PELAKSANAAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	AGUSTUS		
									Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi KEU.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	DINAS PARIWISATA	Pembuatan Tempat Parkir Barat Di DTW Eks. Pelabuhan Buleleng	CV. Lissjaya Utama Griya Panji Asri Blok P/5 Panji-Singaraja - Buleleng - Buleleng (Kab.) - Bali	484.875.236,50	APBD (DAK)	556/29/VI/2021 (28 Juni 2021)	28 Juni 2021	90 HARI KALENDER	54,39 %	55,65 %	145.462.500
63	DINAS PARIWISATA	Pembangunan Plaza/Pusat Jajanan Kuliner Di DTW Pantai Lovina	CV. KRISNA PUTRA BALI Wisma Arya Lantai I Blok 2, Jalan Pulau Irian No.36 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali	227.969.557,66	APBD (DAK)	556/53/VI 2021 (5 Juli 2021)	5 Juli 021	90 HARI KALENDER	47,91 %	47,93 %	Rp -
64	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	CV. Serba Lancar Abadi Jl. WR. Supratman No. 412, Penarukan Buleleng, Bali - Buleleng (Kab.) - Bali	297.146.500,00	APBD (DAK)	800/257/DPPKBPP-PA/2021	01-Jul-21	30 hari kalender	100%	100%	Rp -
65	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH SDN 1 BANJAR TEGAL, PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH SDN 1 SUKASADA, PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH SDN 1 GALUNGAN, PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH SDN 2 GALUNGAN, PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH SDN 2 TEJAKULA, PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH SDN 4 BONDALEM	CV. KARYA SENTOSA JALAN BILAWA NO 49 DESA PERANCAK, JEMBRANA - BALI. - Jembrana (Kab.) - Bali	1.040.263.000,00	APBD (DAK)	'0721/0489/PPK/Disdikpora/2 021	21 Juli 2021	120 Hari Kalender	25%	25,67%	Rp -
66	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 1 Bongancina, SDN 4 Tista, SDN 3 Kedis, dan SDN 3 Busungbiu	CV. KARYA SENTOSA JALAN BILAWA NO 49 DESA PERANCAK, JEMBRANA - BALI. - Jembrana (Kab.) - Bali	1.609.422.000,00	APBD (DAK)	'0721/0490/PPK/Disdikpora/2 021	21 Juli 2021	120 Hari Kalender	25%	27%	Rp -
67	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN PEMBANGUNAN RUANG GURU SD N 4 GOBLEG DAN BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN PEMBANGUNAN RUANG GURU SD N 1 BEBETIN	CV. SUWASTIKA JAYA Jalan Ratulangi Depan Terminal No.8 - Buleleng (Kab.) - Bali	360.762.000,00	APBD (DAK)	'0721/0488/PPK/Disdikpora/2 021	21 Juli 2021	120 Hari Kalender	25%	25%	Rp -

NO	NAMA SATKER	NAMA PAKET	PENYEDIA/ALAMAT	NILAI KONTRAK	SUMBER DANA	NO. KONTRAK	TANGGAL MULAI PELAKSANAAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	AGUSTUS		
									Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi KEU.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG KELAS SMPN SATU ATAP 3 SUKASADA, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG GURU SMP NEGERI SATU ATAP 3 SUKASADA, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI PERPUSTAKAAN SEKOLAH SMPN SATU ATAP 3 SUKASADA, DAN BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI TOILET/JAMBAAN SMPN SATU ATAP 3 SUKASADA	CV SARI KARYA Tanah Kapling Banyuning Tengah, Kelurahan Banyuning, Kab. Buleleng - Buleleng (Kab.) - Bali	750.158.000,00	APBD (DAK)	'0721/0487/PPK/Disdikpora/2021	21 Juli 2021	120 Hari Kalender	15%	15%	Rp
69	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	Belanja Modal Rehabilitasi ruang laboratorium IPA, Rehabilitasi ruang kelas, dan Rehabilitasi toilet (jamban) SMPN 1 Sukasada dan Rehabilitasi ruang kelas SMPN 3 Sukasada	CV. ADI YASA JALAN PULAU IRIAN DSN. KAJANAN DESA PENGLATAN - BULELENG - Buleleng (Kab.) - Bali	767.154.000,00	APBD (DAK)	'0721/0486/PPK/Disdikpora/2021	21 Juli 2021	120 Hari Kalender	15%	20%	Rp
70	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rehabilitasi ruang kelas, Rehabilitasi Ruang Guru dan Kepala Sekolah, Pembangunan area bermain TK Negeri Pembina Singaraja, dan Rehabilitasi ruang kelas TK N Pembina Kec. Sukasada	CV. Dewata Karya Br. Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali	492.614.500,00	APBD (DAK)	0721/0471/PPK/Disdikpora/2021	21 Juli 2021	120 Hari Kalender	30%	45%	Rp. 123.153.625
71	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 4 Sumberkima, SDN 2 Penyabangan, SDN 1 Ringdikit dan SDN 1 Pengastulan	CV. BUMI RAYA JALAN JALAK NO 12 SINGARAJA - Buleleng (Kab.) - Bali	1.542.010.000,00	APBD (DAK)	'0721/0485/PPK/Disdikpora/2021	21 Juli 2021	120 Hari Kalender	25%	27%	Rp
72	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 4 Kubutambahan, SDN 1 Sangsit dan SDN 3 Suwug	CV Dema Karya Mandiri Jalan Pulau Komodo Gg Kresna No 15 Kelurahan Banyuning - Buleleng (Kab.) - Bali	1.478.712.000,00	APBD (DAK)	'0721/0484/PPK/Disdikpora/2021	21 Juli 2021	120 Hari Kalender	25%	25,67%	Rp
73	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas dan Pembangunan perpustakaan SDN 3 Bondalem	PT. Glebeg Bali Utama Jl. Kargo Indah II No 11 Denpasar - Denpasar (Kota) - Bali	471.710.000,00	APBD (DAK)	'0721/0483/PPK/Disdikpora/2021	21 Juli 2021	120 Hari Kalender	25%	27,50%	Rp
74	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 1 Paket Agung, SDN 2 Anturan, SDN 3 Pegayaman	KRESNA DWIPA CV Br.Metra Kelod, Ds.Yangapi, Tembuku, Bangli - Bangli (Kab.) - Bali	1.394.941.000,00	APBD (DAK)	'0721/0482/PPK/Disdikpora/2021	21 Juli 2021	120 Hari Kalender	25%	11%	Rp

NO	NAMA SATKER	NAMA PAKET	PENYEDIA/ALAMAT	NILAI KONTRAK	SUMBER DANA	NO. KONTRAK	TANGGAL MULAI PELAKSANAAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	AGUSTUS		
									Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi KEU.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN BELANJA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 CEMPAGA, DAN BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 PEDAWA	CV. PUTRA CATUR DEWATA JALAN ACHMAD YANI NO 135 A SINGARAJA - Buleleng (Kab.) - Bali	1.007.896.000,00	APBD (DAK)	'0721/0481/PPK/Disdikpora/2021	21 Juli 2021	120 Hari Kalender	25%	27,50%	Rp -
76	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Belanja Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 3 Les, Belanja Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 3 Tembok, Belanja Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 5 Les	CV. Adi Putra Jl. Gunung Batur Gang II No. 1 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali	925.022.000,00	APBD (DAK)	'0721/0480/PPK/Disdikpora/2021	21 Juli 2021	120 Hari Kalender	25%	32,67%	Rp -
77	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG KELAS SMPN 5 SINGARAJA, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG GURU SMP NEGERI 5 SINGARAJA, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG KELAS SMPN 7 SINGARAJA, DAN BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI LABORATORIUM IPA SMPN 7 SINGARAJA	CV. Lissjaya Utama Griya Panji Asri Blok P/5 Panji-Singaraja - Buleleng - Buleleng (Kab.) - Bali	1.112.107.000,00	APBD (DAK)	'0721/0479/PPK/Disdikpora/2021	21 Juli 2021	120 Hari Kalender	15%	30%	Rp -
78	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	Belanja Modal Rehabilitasi ruang guru, Rehabilitasi ruang kelas dan Rehabilitasi ruang UKS SMPN 1 Banjar dan Rehabilitasi ruang laboratorium komputer SMPN 2 Busungbiu	PT. Glebeg Bali Utama Jl. Kargo Indah II No 11 Denpasar - Denpasar (Kota) - Bali	928.795.000,00	APBD (DAK)	'0721/0478/PPK/Disdikpora/2021	21 Juli 2021	120 Hari Kalender	13%	20%	Rp -
79	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rehabilitasi ruang kelas TK Negeri Desa Banjar dan Rehabilitasi ruang kelas, Rehabilitasi Ruang Guru dan Kepala Sekolah TK N Desa Pedawa dan Pembangunan area bermain TK N Pembina Kec. Banjar	CV. SANTOSA Jalan Yudistira No. 37 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali	6.046.086.000,00	APBD (DAK)	0721/0472/PPK/Disdikpora/2021	21 Juli 2021	120 Hari Kalender	30%	25%	Rp -

NO	NAMA SATKER	NAMA PAKET	PENYEDIA/ALAMAT	NILAI KONTRAK	SUMBER DANA	NO. KONTRAK	TANGGAL MULAI PELAKSANAAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	AGUSTUS		
									Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi KEU.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG KELAS TK NEGERI PEMBINA KEC. GEROKGAK, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG GURU DAN KEPALA SEKOLAH TK NEGERI PEMBINA KEC. GEROKGAK , BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN PEMBANGUNAN AREA BERMAIN TK N DESA PANGKUNGPARUK, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG KELAS TK N DESA PANGKUNGPARUK, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG KELAS TK NEGERI DESA MUNDUK BESTALA	CV. SARI MERTA BAWA BR. DINAS UMASARI KAUH, PERING SARI, SELAT - Karang Asem (Kab.) - Bali	815.357.500,00	APBD (DAK)	0721/0473/PPK/Disdikpora/2021	21 Juli 2021	120 Hari Kalender	30%	14,21%	Rp -
81	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG KELAS TKN DESA BONTIHING, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI RUANG KELAS TKN DESA TAMBAKAN, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN REHABILITASI TOILET (JAMBAN) TKN DESA TAMBAKAN	CV. SANTOSA Jalan Yudistira No. 37 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali	403.701.100,00	APBD (DAK)	0721/0474/PPK/Disdikpora/2021	21 Juli 2021	120 Hari Kalender	30%	12,57%	Rp -
82	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	Belanja Modal Rehabilitasi ruang kelas, Rehabilitasi toilet (jamban) SMPN 2 Singaraja dan Rehabilitasi ruang kelas SMPN 3 Singaraja dan Rehabilitasi ruang laboratorium komputer, Rehabilitasi ruang guru SMPN 6 Singaraja	CV.KEMBAR SARI SEDANA Jl.P Menjangan Perum Banyuning Permai Blok A/10 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali	1.597.638.000,00	APBD (DAK)	0721/0477/PPK/Disdikpora/2021	21 Juli 2021	120 Hari Kalender	15%	25%	Rp. 399.409.500
83	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	Belanja Modal Rehabilitasi ruang kelas SMPN 1 Seririt dan Rehabilitasi ruang kelas, Rehabilitasi toilet (jamban) dan Rehabilitasi ruang laboratorium IPA serta Rehabilitasi ruang perpustakaan SMPN 4 Gerokgak	CV.KEMBAR SARI SEDANA Jl.P Menjangan Perum Banyuning Permai Blok A/10 Singaraja - Buleleng (Kab.) - Bali	1.628.737.000,00	APBD (DAK)	0721/0476/PPK/Disdikpora/2021	21 Juli 2021	120 Hari Kalender	15%	25%	Rp. 407.184.250

NO	NAMA SATKER	NAMA PAKET	PENYEDIA/ALAMAT	NILAI KONTRAK	SUMBER DANA	NO. KONTRAK	TANGGAL MULAI PELAKSANAAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	AGUSTUS		
									Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi KEU.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	Belanja Modal Rehabilitasi ruang kelas, Rehabilitasi toilet (jamban) SMPN 1 Kubutambahan dan Rehabilitasi ruang kelas, Rehabilitasi toilet (jamban), Rehabilitasi ruang UKS SMPN 1 Sawan serta Rehabilitasi ruang kelas SMPN 4 Sawan	CV. Lissjaya Utama Griya Panji Asri Blok P/5 Panji-Singaraja - Buleleng - Buleleng (Kab.) - Bali	1.638.885.000,00	APBD (DAK)	0721/0475/PPK/Disdikpora/2021	21 Juli 2021	120 Hari Kalender	15%	20%	Rp -
85	DINAS PERTANIAN	Belanja Barang Untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID 19	SUDARMA BALI UTAMA Jl. Diponegoro gg. Camar no 5 seririt - Buleleng (Kab.) - Bali	292.928.400	APBN	027/1488/VII/DISTAN/2021 (14 JULI 2021)	14-Jul-21	45 HARI KALENDER	100%	100%	Rp. 87.878.520
86	DINAS PERTANIAN	Belanja Modal Personal Computer - Komputer Personal	cv alzika rakasa Jalan Otto Iskandardinata No. 277 RT 004/ RW 002 Kel. Balong Gede Kec. Regol - Bandung (Kota) - Jawa Barat	200.631.200	APBD (DAK)	875.1/1502/PENY/DISTAN/2021	19/07/2021	90 HARI KALENDER	100%	100%	Rp -
87	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	CV. TRI MATRA DISAIN Jalan Subur Gg. Mirah Cempaka II No. 17 Denpasar/Jln. Gatsu I/VII No. 3B Lt.I Denpasar - Denpasar (Kota) - Bali	345.745.400	APBD	027/08.16.004/2021 (16 Agustus 2021)	16/08/2021	120 Hari Kalender	0%	0%	Rp -
		TOTAL		122.951.731.481,62							

Dokumentasi Kegiatan

1.




Mengundang BKPSDM Kab. Buleleng untuk membahas tindaklanjut Belanja Akomodasi Pelatihan Dasar CPNS Untuk Diklat Pra Jabatan Gelombang IV bertempat diruang rapat unit IV pada tanggal 3 Agustus 2021

2.



Pokja Pemilihan melaksanakan kegiatan survey harga pasar terhadap paket pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Induk Distribusi Ø 3", 4", 6" di Jalan Ularan Desa Lokapaksa dan paket Pengembangan Jaringan Distribusi Pembagi SPAM Sanih Di Desa Bulian pada tanggal 4 Agustus 2021

3.

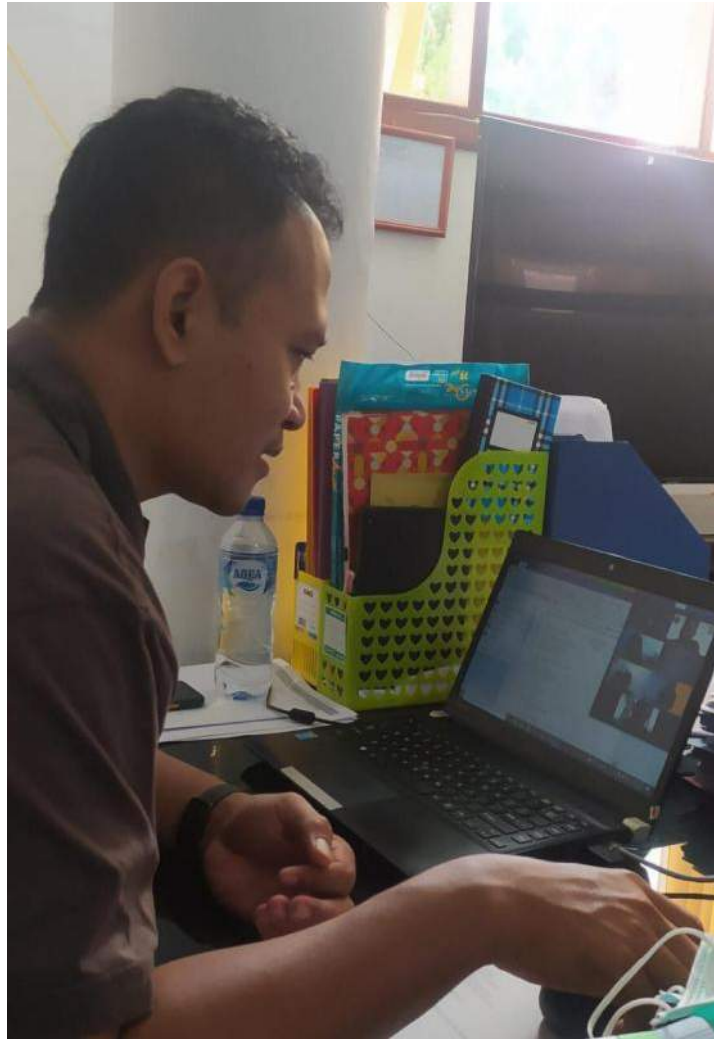


The screenshot shows a Microsoft Word document with a checklist of requirements for a tender. The document is titled "A. Aaf Bab I AaBcCt 2B2 Aaf AaBcCt AaBcCt". The checklist is as follows:

No	Aspek	Ya	Tidak
2	Sertifikat Badan Usaha (SBU)	Ya	
3	Kemampuan Dasar (KD)	-	
4	Aktif Perizinan Perusahaan dan/ atau Perusahaan	Ya	
5	Program Perizinan		
	Kartu Tanda Penduduk (KTP)		
	a. Komisaris		
	b. Direktur Utama		
	c. Direktur	Ya	
6	Data Keuangan		
	a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Ya	
	b. Buku Tabung KIRP	Ya	
7	Pengalaman Perusahaan		
	a. Minimal 2x pelaksanaan di era	Ya	
	b. Berita Acara Serah Terima (BAS) dan PKB	Ya	
8	Pekerjaan Yang sedang berjalan	-	

On the right side of the screenshot, there is a video conference window showing four participants: a man at the top, a woman in the middle, and two men at the bottom.

Secara daring Pokja Pemilihan mengundang peserta tender untuk mengikuti pembuktian kualifikasi untuk paket Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor pada tanggal 5 Agustus 2021

4.

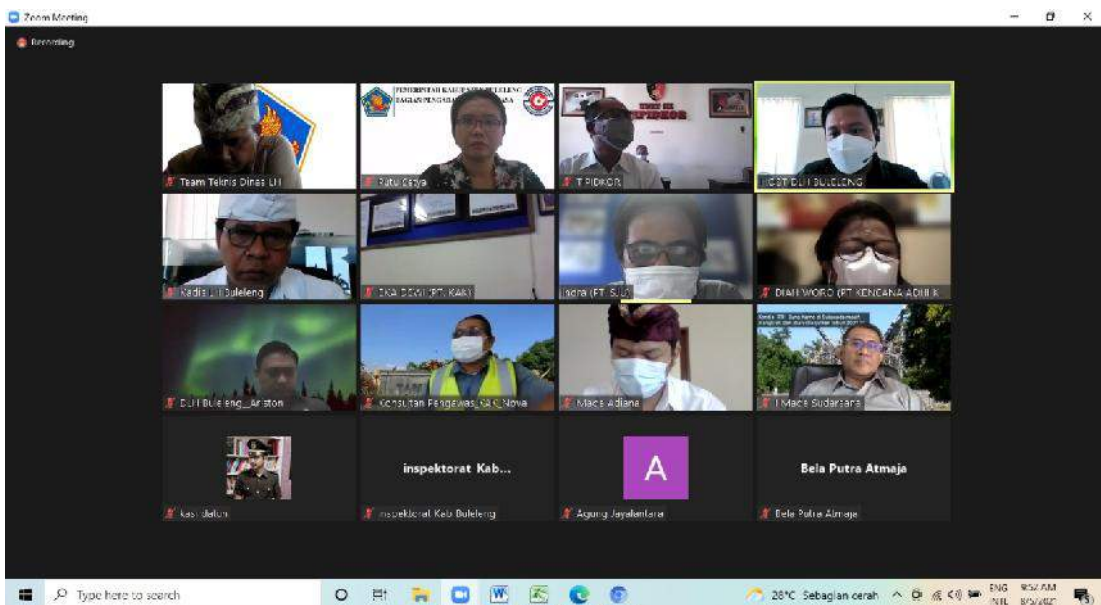

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mengikuti secara virtual/daring rapat evaluasi bulanan (minggu ke-12) terhadap progres fisik pembangunan RTH Taman Bung Karno Tahap IV, pada tanggal 5 Agustus 2021

5.



Secara hybrid baik tatap muka atau melalui virtual Pokja Pemilihan melaksanakan kegiatan Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Biaya paket pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung pada tanggal 10 Agustus 2021

6.



Bertempat diruang Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Buleleng, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, I Made Suwitra Yadnya, ST bersama Pokja Pemilihan menghadiri rapat Show Cause Meeting (SCM)/Pembuktian Keterlambatan terhadap paket Pekerjaan Pembuatan Tempat Parkir di DTW Pantai Lovina pada tanggal 12 Agustus 2021

7.



Menghadiri rapat reviu terhadap laporan hasil pemilihan penyedia untuk 2 paket pekerjaan masing-masing paket pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung serta paket Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor pada tanggal 13 Agustus 2021

8.



Menghadiri undangan rapat Pra Kontrak dan Penandatanganan Kontrak terhadap paket Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor pada RSUD Tangguwisia pada tanggal 16 Agustus 2021

9.



Melakukan koordinasi dengan Dinas Dagperinkopukm terhadap persiapan perencanaan pembangunan gedung PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) UMKM Kab. Buleleng yang bersumber dari sharing dana APBD dan DAK tahun 2022 pada tanggal 23 Agustus 2021

10.



Melaksanakan rapat dengan agenda membahas persiapan pelaksanaan Monitoring Kontrak PBJ TA. 2021 yang proses pemilihannya dilaksanakan melalui proses tender/seleksi bertempat diruang rapat Unit IV pada tanggal 24 Agustus 2021

11.



RPP Paket Pembangunan Reservoir SPAM Pangkung Dalem di Desa Padang Bulia, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural, Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung Bangunan Sederhana dan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) bertempat diruang rapat Unit IV lantai 2 pada tanggal 31 Agustus 2021
